

KATOWICE

dla odmiany

Sprawozdanie z realizacji w latach
2016-2017
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice
na lata 2016-2022

Spis treści

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2016-2017 w miejskich podobszarach rewitalizacji.....	4
1.1 Podobszar Śródmieście.....	4
1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	4
1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	5
1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	13
1.2 Podobszar Zawodzie	16
1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	16
1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	17
1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	19
1.3 Podobszar Załęże	21
1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	21
1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	22
1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	25
1.4 Podobszar Bogucice	26
1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	26
1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	27
1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	29
1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec.....	31
1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	31
1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	32
1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	37
1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec	38
1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji	38
1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze.....	39
1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze	41
2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych	42
2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa	42
2.2 Podobszar Dąb – Baildona	43
2.3 Podobszar Kolonia Alfred	45
2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska	47
2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka	50
3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic	51
4. Szczegółowa informacja sprawozdawcza dot. realizacji miejskich projektów podstawowych w okresie 2016-2017	63
5. Podsumowanie	116

Wstęp

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” przyjęto po raz pierwszy uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Zgodnie z zapisami Programu, który przewiduje coroczną aktualizację dokumentu, LPR zaktualizowano dnia 27.07.2017 r. (uchwała nr XLV/856/17).

Kompleksowe przekształcanie obszarów zdegradowanych jest procesem wielopłaszczyznowym, angażującym różnych interesariuszy, różne źródła finansowania i ukierunkowanym na różnych odbiorców. Część bezpośrednich i pośrednich rezultatów interwencji realizacyjnych jest widoczna z pewnym opóźnieniem. Niezbędnym elementem prawidłowej realizacji Programu są działania związane z monitoringiem i ewaluacją. Sprawozdanie z realizacji Programu jest narzędziem bieżącego monitoringu, służącego kontroli postępu prac w ramach realizacji poszczególnych projektów (podstawowych i pozostałych), identyfikacji ewentualnych zagrożeń realizacji Programu, powzięciu decyzji o ewentualnej aktualizacji zapisów uchwały czy też podjęciu decyzji o koniecznych działaniach zaradczych. Informacje zgromadzone w ramach poszczególnych raportów sprawozdawczych będą również wykorzystane do opracowania raportu ewaluacyjnego.

W ramach dwuletniego cyklu monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji LPR, zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o stopniu realizacji działań i projektów podejmowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji **w latach: 2016-2017** przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu czy organizacje pozarządowe).

Informacja sprawozdawcza obejmuje zarówno **projekty podstawowe** tj. ujęte w Załączniku nr 1 do LPR, jak i **pozostałe przedsięwzięcia** podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczenie negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji w obszarze.

Dla celów sprawozdawczości rzeczowej i finansowej w odniesieniu do projektów podstawowych realizowanych przez Miasto, za punkt odniesienia przyjęto stan na dzień 31.12.2017 roku oraz stan zgodny z uchwałą dnia 27.07.2017 r. (uchwała nr XLV/856/17).

Informację w zakresie realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na podstawie wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, rozesłanych uprzednio do projektodawców. Informacja zwrotna stanowi jednocześnie podstawę kolejnej aktualizacji LPR.

Materiał sprawozdawczy przedstawiono w podziale na poszczególne podobszary rewitalizacji: **podobszary miejskie** oraz **podobszary występowania problemów przestrzennych**. Informacja o danym podobszarze zawiera: zestawienie projektów podstawowych wraz z wykonanym zakresem rzeczowym w okresie sprawozdawczym, skorelowaną z nim mapę z zaznaczonymi lokalizacjami projektów, a także opis pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanowiąc w sumie kompleksowy pakiet wiedzy o działaniach miasta i podmiotów zewnętrznych w nim podejmowanych.

Szczegółowe dane finansowe i opis wykonanego zakresu rzeczowego dla poszczególnych projektów miejskich realizowanych w okresie sprawozdawczym, prezentują **fiszki projektowe**, w rozdziale 4.

1. Informacja sprawozdawcza z realizacji Programu w latach 2016-2017 w miejskich podobszarach rewitalizacji

1.1 Podobszar Śródmieście

1.1.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Cel rewitalizacji	Kierunki działań
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja – starzenie się – bezrobocie – ubóstwo i wykluczenie społeczne – przestępczość – zły stan środowiska – zły stan techniczny budynków 	<p>Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej obejmujące poprawę warunków zamieszkania, odnowę przestrzeni publicznych oraz podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców wyłączonej z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic.</p>	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną miasta, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

1.1.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście

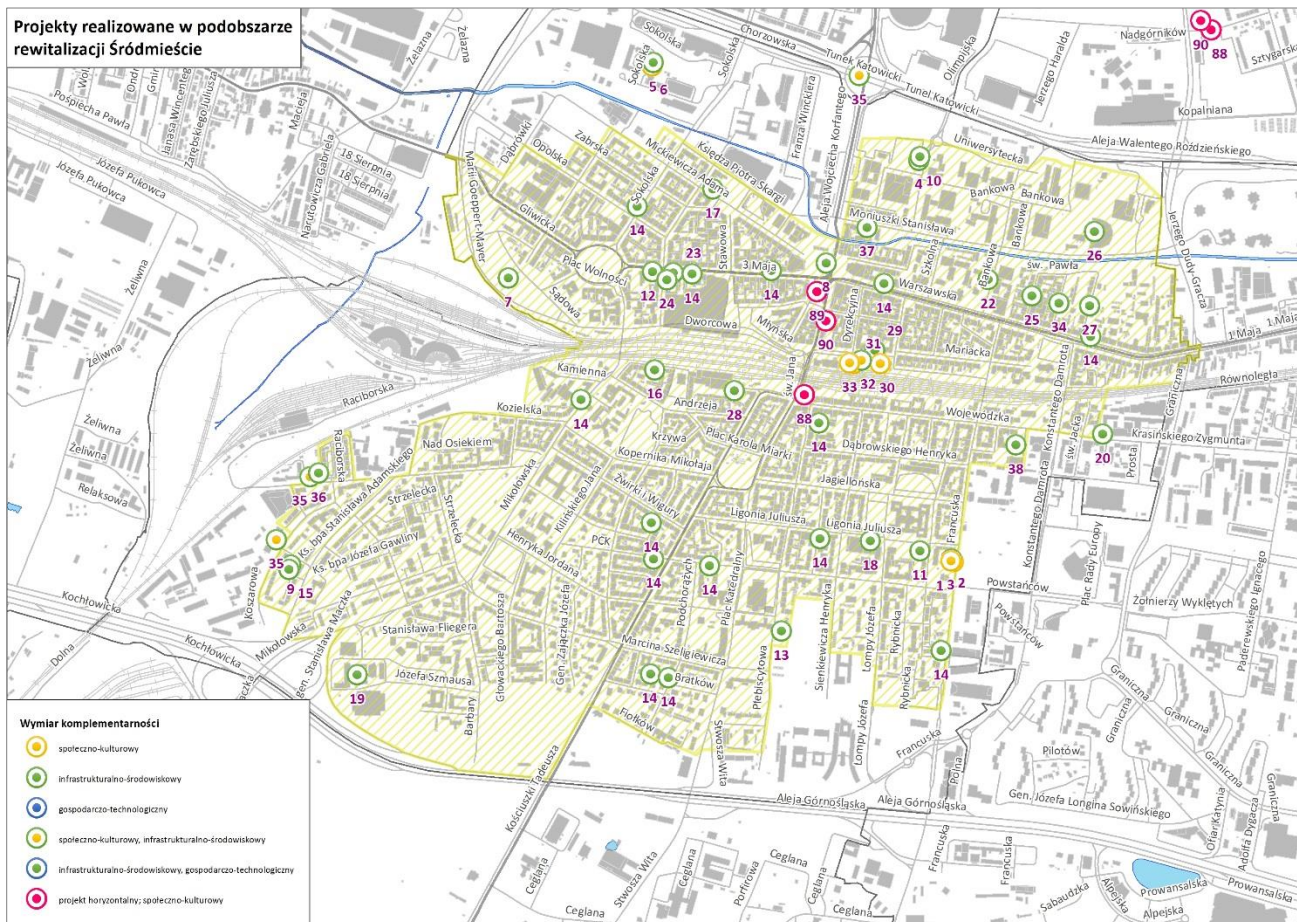


Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
1	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – I etap	2018-2020	2 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – II etap	2021-2023	1 832 660 zł	Projekt planowany do realizacji	P
2	Miasto Katowice Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Francuskiej 43	2015-2018	6 639 522 zł	Jest to projekt o charakterze inwestycyjnym, realizowany w ramach poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Projekt jest komplementarny z projektem nr 1. W 2016 roku wykonano część robót budowlanych, dokonano płatności za dokumentację oraz nadzór branżowy. W 2017 roku trwały roboty budowlane, zgodnie z zawartą umową oraz realizacja usług nadzoru autorskiego i branżowego w specjalności teletechnicznej. Trwały rozliczenia i procedura odbiorowa.	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
3	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych – I etap	2018-2019	3 409 106 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych – II etap	2020-2021	4 449 429 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych – III etap	2022-2023	4 449 429 zł	Projekt planowany do realizacji	P
4 ¹	Miasto Katowice Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękki)	2015-2017	2 751 138 zł	W roku 2016 poniesiono wydatki na utrzymanie budynków, bieżące funkcjonowanie w związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów i grup żłobkowych w których opieką objęto 129 dzieci oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. W roku 2017 poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.	Z
	Miasto Katowice Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy)	2015-2017	2 836 084 zł	W roku 2016 wykonano adaptację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i 19 na pomieszczenia żłobka oraz dostarczone i zamontowano niezbędne wyposażenia. Opracowano instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Żłobków wraz z wyposażeniem oraz program funkcjonalno-użytkowy Żłobków. Ponadto zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu. W roku 2017 na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, plac gospodarczy, ciąg pieszo - jezdny, wiatę śmietnikową, nasadzono krzewy; na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, plac zabaw, nasadzono krzewy.	Z
5	Miasto Katowice Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	2015-2018	3 753 211 zł	W roku 2016 rozliczono umowę na wykonanie projektu budowlanego po wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej, zakupiono frezarki CNC oraz dwie tokarki numeryczne, dostosowano budynek do przepisów p.poż. oraz osób niepełnosprawnych. W roku 2017 wykonano remont dachu oraz sal, w tym m.in.: wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową i okienną, wykonano tynki, instalacje elektryczne. Zamówiono obrabiarki CNC.	R
6	Miasto Katowice (ŚTZN) SOS Szkolenia otwartych szans	2017-2018	410 859 zł	W roku 2017 zrealizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 60 uczniów; zakończono szkolenie pierwszej grupy uczniów (11 osób) AutoCAD - podstawa; zakupiono 17 zestawów komputerowych, projektor i ekran projekcyjny do przeprowadzenia szkolenia AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor; zrealizowano szkolenia z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli i 36 uczniów; zakupiono meble do pracowni AutoCAD; wybrano wykonawcę na wykonanie instalacji stanowiskowej elektrycznej i teleinformatycznej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.	R

¹ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
7	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”	2013, 2015-2020	59 588 700 zł	W roku 2016 opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Opracowano model ruchu komunikacyjnego na potrzeby projektów infrastrukturalnych oraz wykonano analizę otrzymanych wyników i na ich podstawie dokonano analizy kosztów i korzyści. W roku 2017 przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane; trwały prace komisji przetargowej.	R
8	Miasto Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice.	2005-2018	274 057 944 zł	W roku 2016 w ramach Etapu II (Strefa Rondo-Rynek) trwały postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Wydział Gospodarki Mieniem, zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach Etapu IV (budynek C4) trwała realizacja robót z terminem wykonania: 28.02.2017r. Ponadto trwała realizacja działania dot. „Zaprojektowania i wykonania toalety publicznej na parterze budynku C4 – część wschodnia na Rynku w Katowicach” z terminem wykonania: 28.02.2017r. Zrealizowano umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego bliźniaczego zadania po stronie zewnętrznej wiat przystankowych T1 i T2 - Katowice ul. Korfantego i ul. Warszawska”. W ramach Etapu V przeprowadzono warsztaty studialno-projektowe, w wyniku których wybrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach i urządzenia ul. Tylnej Mariackiej. W roku 2017 zadanie w zakresie Budynku C4 i toalety publicznej na parterze budynku C4 zakończono i odebrano. Podpisano umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej zadania „Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek” w zakresie oddziaływania akustycznego zmodernizowanych odcinków dróg i torowisk w Strefie Rondo-Rynek na tereny podlegające ochronie akustycznej. Umowę zrealizowano. Opracowano dokumentację w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części placu centralnego stanowiącego połączenie formalne płaszczyzny placu z budynkiem C4 i częścią rekreacyjną. Wybrano wykonawcę zadania - adaptacja istniejącego projektu budowlano-wykonawczego budowy dwóch wiat w ramach dokumentacji projektowej pn. Projekt zagospodarowania terenu w rejonie północnej części placu centralnego stanowiącego połączenie formalne płaszczyzny placu z budynkiem C4 i częścią rekreacyjną – umowę zrealizowano.	R
9	Miasto Katowice (KZGM) Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową	2015-2016	702 000 zł	Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 08.12.2016 r. Wykonano kanalizację deszczową, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację teletechniczną, wymieniono nawierzchnię drogi dojazdowej wraz z chodnikami.	Z
10	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIId (Żłobek Miejskie przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach)	2016-2018	1 637 024 zł	W roku 2016 wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną, trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu. W roku 2017 realizowano roboty budowlane; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu; w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowę na roboty budowlane i zrealizowano ok. 21% wartości jej zakresu.	R
11	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności	2016-2018	1 472 922 zł	W roku 2016 trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. W roku 2017 unieważniono przetarg nieograniczony w części dot. przedmiotowego obiektu ze względu na brak ofert i	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	publicznej w mieście Katowice etap III (Żłobek Miejski przy ul. Ligonia 43 w Katowicach)			ogłoszono kolejny przetarg - prace komisji przetargowej zakończono w dn. 28.12.2017 r.	
12	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII (Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach)	2016-2019	2 597 800 zł	W roku 2016 wykonano dokumentację dotyczącą inwentaryzacji architektoniczno - budowlano - instalacyjnej oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu. W roku 2017 w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto jej realizację.	R
13	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (Dom Dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46 w Katowicach)	2015-2019	1 845 446 zł	W roku 2016 trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego. W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosku o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu.	R
14 ²	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	18 909 169 zł	ul. 3 Maja 36: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Plebiscytowa 4, 4a: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Mikołowska 11, 13: realizacja zakończona w 2016 r. ul. Szeligiewicza 3c: w trakcie realizacji ul. Powstańców 7 i 9: faza przygotowawcza do realizacji ul. PCK 1: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Drzymały 13: realizacja zakończona w 2017 r. ul. 3 Maja 7: odstąpiono od realizacji ul. Warszawska 6 / Teatralna 9: faza przygot. do realizacji ul. Warszawska 42: faza przygotowawcza do realizacji ul. Królowej Jadwigi 6: w trakcie realizacji ul. Astrów 3/Różana: realizacja zakończona w 2017 r. ul. Francuska 59, 59a, 59b: planowany do realizacji ul. Opolska 9b, 9c: faza przygotowawcza do realizacji	R
15	Miasto Katowice (KZGM) Budowa placu zabaw ze strefą fitness	2015-2016	745 098 zł	Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r.	Z
16 ³	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4)	2009-2017	3 949 547	ul. Kordeckiego 3, 4 – trwały roboty budowlane. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy w dniu 25.07.2016 r. zaszła konieczność zlecenia dokończenia budowy. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 29.11.2016 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót z terminem zakończenia do 09.04.2017 r. W roku 2017 zakończono budowę 22 mieszkań. W dniu 11.05.2017r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	Z
17	Miasto Katowice Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach	2016-2022	7 600 000 zł	W roku 2016 trwało opracowanie wytycznych do projektowania. W roku 2017 w wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie ekspertyzy wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę.	R
18	Miasto Katowice Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	2016-2019	4 000 000 zł	W roku 2016 trwało opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy i koncepcji programowo-przestrzennej dla przedmiotowego zadania. W roku 2017 opracowano inwentaryzację, ekspertyzę i koncepcję programowo-przestrzenną dla przedmiotowego zadania. Wykonano specyfikację techniczną oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.	R

² Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice - Burowiec

³ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec. Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
19	Miasto Katowice Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	2011-2018	15 450 000 zł	W roku 2016 przeprowadzono termomodernizację sali sportowej przy ul. Mikołowskiej oraz modernizację budynku B (sale dydaktyczne, sale biurowe, korytarz). W roku 2017 trwała realizacja kolejnego etapu rozbudowy i modernizacji obiektów AWF (hala sportowa, Okrągłak, budynek B).	R
20	Miasto Katowice Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	2016-2017	996 370 zł	W roku 2016 trwała przebudowa sieci komputerowej. W roku 2017 zakończono przebudowę sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8.	Z
22	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej WSZOP	2016-2020	200 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
23	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 40 w Katowicach Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 40 w Katowicach	2015-2016	506 147 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
24	Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 22 Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 22	2015-2016	748 089 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
25	Uniwersytet Śląski Budowa nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	2018-2022	118 400 000 zł	W roku 2016 dopracowywano koncepcję projektu, w tym opracowano koncept wpisania inwestycji w szerszy obszar projektu dzielnicy akademickiej. Uczelnia starała się pozyskać środki zewnętrzne na budowę obiektu, uwzględniając różne możliwości finansowania. Ostatecznie odstąpiono od realizacji projektu.	P
26	Uniwersytet Śląski Zagospodarowanie skweru w Katowicach, będącego integralną częścią budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11B	2018-2019	300 000 zł	W roku 2016 dopracowywano koncepcję projektu, w tym opracowano koncept wpisania inwestycji w szerszy obszar projektu dzielnicy akademickiej. W latach 2016-2017 Uczelnia starała się pozyskać środki zewnętrzne na budowę obiektu, uwzględniając różne możliwości finansowania. Po znalezieniu źródła finansowania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami.	P
27	Uniwersytet Śląski Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego	2018-2022	20 000 000 zł	W roku 2016 dopracowywano koncepcję projektu, w tym opracowano koncept wpisania inwestycji w szerszy obszar projektu dzielnicy akademickiej. Uczelnia starała się pozyskać środki zewnętrzne na budowę obiektu, uwzględniając różne możliwości finansowania. W 2017 roku został opracowany projekt koncepcyjny „Budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowej”. Ponadto projekt zgłoszono jako zadanie inwestycyjne do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” Ministerstwa Sportu i Turystyki – Plan Wieloletni. Projekt został zgłoszony przez Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Polskim Związkiem Badmintona, Polskim Związkiem Koszykówki, Polskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz Akademickim Związkiem Sportowym UŚ.	P
28	BMP Invest Sp. z o.o., Sp. k. Rewitalizacja zdewastowanej substancji mieszkaniowej (lokali mieszkalnych) z przeznaczeniem na najem, najem okazjonalny czy inne	2014-2016	3 690 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	formy zakwaterowania wraz z częścią usługową				
29	Epione sp. z o.o. Rewitalizacja zespołu kamienic z częściową nadbudową w kwartale ulic: Dworcowa, Dyrekcyjna, Mielęckiego	2016-2019	75 000 000 zł	W grudniu 2017 r. złożono wnioski w sprawie wydania pozwolenia na budowę, który został opracowany w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy wydaną w IV kwartale 2016r.	R
30	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Spotkań Wielopokoleniowych na Starym Dworcu w Katowicach	2019-2020	700 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
31	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Centrum Animacji - Strefa Inkubacji "STARTNOW new life" na Starym Dworcu w Katowicach ⁴	2019-2021	3 000 000 zł	W latach 2016-2017 opracowano założenia i zakres projektu; dokonano ponownej analizy diagnozy problemów społecznych Śródmieścia; dokonano uzgodnień z partnerem społecznym projektu oraz przeprowadzono konsultacje z innymi potencjalnymi wnioskodawcami projektów społecznych w Śródmieściu; dokonano analizy planowanych projektów społecznych dla Śródmieścia; wystąpiono o rekomendacje dla projektu infrastrukturalnego do Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego; określono grupę docelową. Powyższe zadania zrealizowano w ramach środków własnych Inwestora.	P
32	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 8) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap II. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 2-4) Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap III i kolejne. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 6,10) ⁵	2019-2020	36 000 000 zł	W roku 2016 przeprowadzono ocenę stanu technicznego i wizję w terenie, uzyskano uzgodnienia i stosowne decyzje związane z realizacją inwestycji, opracowano program postępowania konserwatorskiego (z uwagi na zabytkowy charakter obiektu) oraz dokumentację projektową z uwzględnieniem etapowania i określenia kosztów realizacji. W roku 2017 projekt: „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic (ul. Dworcowa 8)” został zgłoszony w konkursach w ramach działania 10.3.1. RPO WSL 2014-2020, nie został rozpoczęty. W ramach etapu II i III rozpoczęto remont i konserwację elewacji, wymianę stolarki okiennej, prace remontowe lub wymianę stropów i pokrycia dachowego oraz prace zabezpieczające obiekt. W części obiektów realizowana jest instalacja wodno-kanalizacyjna i ciepła. Wnioskodawca oczekuje na uruchomienie działania 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego. Realizacja projektu (etap I) i kontynuacja pozostałych we wskazanym terminie uzależniona jest od wyniku konkursu w ramach działania 10.3.1. RPO WSL 2014-2020.	R
33	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Utworzenie Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Starym Dworcu w Katowicach (projekt społeczny dla grupy wiekowej 10-14 lat oraz projekt społeczny dla grupy wiekowej 15-19 lat) ⁶	2019-2020	1 400 000 zł	W latach 2016-2017 opracowano założenia i zakres projektu; dokonano ponownej analizy diagnozy problemów społecznych Śródmieścia; dokonano uzgodnień z partnerem społecznym projektu oraz przeprowadzono konsultacje z innymi potencjalnymi wnioskodawcami projektów społecznych w Śródmieściu; dokonano analizy planowanych projektów społecznych dla Śródmieścia; wystąpiono o rekomendacje dla projektu infrastrukturalnego do Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego; określono grupę docelową. Powyższe zadania zrealizowano w ramach środków własnych Inwestora.	P

⁴ Pierwotna nazwa projektu: „Strefa STARTNOW w rewitalizowanym Starym Dworcu na cele rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości”.

⁵ Pierwotna nazwa projektu: "Stary Rynek" w Katowicach - rewitalizacja Starego Dworca.

⁶ Pierwotna nazwa projektu: „Dworzec Kultura - rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach na cele rozwoju kultury w Śródmieściu”.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
34	Uniwersytet Śląski Budowa Strefy Akademickiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w formie partnerstwa publiczno-prywatnego ⁷	2017-2021	98 000 000 zł	W roku 2016 podjęto prace zmierzające do zrealizowania projektu/inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, powołano zespół projektowy, opracowano koncepcje. Postępowanie na wybór doradcy ekonomiczno-finansowego (kompleksowe doradztwo ekonomiczno-finansowe w formie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań wraz z cyklicznymi, specjalistycznymi konsultacjami doradczymi oraz udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych w związku z planowanym projektem inwestycyjnym pn. Budowa Strefy Akademickiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w formie partnerstwa publiczno-prywatnego) nie zostało rozstrzygnięte. Umowy nie podpisano ze względu na brak kompetencji potencjalnych wykonawców.	P
35	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach	2017-2019	4 198 837 zł	W roku 2017 projekt nie był realizowany, ponieważ nie uzyskał dofinansowania ze środków EFRR, jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Akademia podjęła jednak działania zmierzające do stopniowego zakupu sprzętu i pozyskania dofinansowania z innych źródeł. W roku 2017 dzięki dotacji celowej MKiDN w wysokości 1 000 000 zł zrealizowano zadanie „Zakup wyposażenia służącego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach do prowadzenia działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej”.	P
36	Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy efektywności energetycznej	2017-2019	2 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
37	Śląskie Kamienice S. A. Konservacja i przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowej elewacji	2017	420 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
38	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zacisze 2 w Katowicach Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zacisze 2. Kompleksowy remont zabytkowej frontowej elewacji budynku oraz dachu. Likwidacja barier architektonicznych	2017-2020	920 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
11	Miasto Katowice Przebudowa obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9		Odstąpiono od realizacji projektu w podanej lokalizacji.		O
23	Uniwersytet Śląski w Katowicach Laboratorium Inicjatyw Społecznych		Inwestor odstąpił od realizacji projektu.		O

⁷ Pierwotna nazwa projektu: „Zintegrowane Centrum Studenta”.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	i Integracji Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (EFRR)				
24	Uniwersytet Śląski w Katowicach Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (EFS)			Inwestor odstąpił od realizacji projektu.	0
28	Uniwersytet Śląski w Katowicach Kreatywne Miasto - kreatywny Region: Uniwersytet Śląski w Katowicach , ul. Bankowa 14, adaptacja na cele gospodarcze, edukacyjne, rekreacyjne społeczne i kulturalne			Inwestor odstąpił od realizacji projektu.	0
29	Uniwersytet Śląski w Katowicach Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności			Inwestor odstąpił od realizacji projektu.	0

*numer projektu odpowiada numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XXVII-559-16 z 29.06.2016)

W granicach podobszaru Śródmieście przewidziano do realizacji **37 projektów: 20 miejskich** (w tym 1 obejmujący modernizację 14-stu budynków komunalnych) i **17 pozamiejskich**.

W zakresie projektów miejskich **zrealizowano 5 projektów**, a poszczególne zadania w ramach modernizacji budynków komunalnych znajdują się na różnym etapie realizacji. W trakcie realizacji znajduje się **13 projektów**, a **2 projekty są planowane do realizacji**.

W zakresie projektów instytucji zewnętrznych, **2 projekty znajdują się w trakcie realizacji**, a **9 projektów inwestorzy planują realizować w latach kolejnych**. Brak informacji sprawozdawczej w zakresie 6 projektów. Dodatkowo, w trakcie okresu sprawozdawczego wnioskodawcy **odstąpili od realizacji 5 zgłoszonych wcześniej przedsięwzięć**.

1.1.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru rewitalizacji Śródmieście, w 2016 i 2017 r. zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** funkcjonowanie automatycznych miejskich stacji wypożyczania rowerów: "Katowice Rynek", „Murapol Mariacka", "Plac Sejmu Śląskiego". Stacja „Katowice Rynek" była najpopularniejszą stacją wypożyczeń i zwrotów zarówno w 2016, jak i w 2017 roku.
- **działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego** w ramach *Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2016 i 2017 m.in.* poprzez zwiększenie liczby umundurowanych patroli Policji na ulicach (finansowanie dodatkowych służb patrolowych; w 2016 roku służby ponadnormatywne pełniło 919 policjantów, a w 2017 roku - 1081 policjantów), w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych:**
 - przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów:** przebudowę dróg gminnych: północna pierzeja Pl. Miarki (2016) oraz ul. Gen. Zajączka (2016 i 2017),
 - przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**
 - w 2016 roku:** wykonano schody wejściowe do lokalu użytkowego: ul. Kościuszki 42a; rekonstrukcję klatki schodowej: ul. Sienkiewicza 22/ Jagiellońska 19; zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową: ul. Plebiscytowa 37, opracowano dokumentację techniczną i wykonano przebudowę instalacji gazu: ul. Skłodowskiej 42, pomalowano klatki schodowe: ul. Warszawska 53, 53a, ul. Plebiscytowa 37, wymieniono stropy: ul. Raciborska 13a, Stalmacha 26 oraz bramę wjazdową: ul. Młyńska 7),
 - w 2017 roku:** wykonano instalacje etażowe c.o. w 6 mieszkaniach przy ulicach: Różanej, Moniuszki, Wita Stwosza, Kozielskiej; przebudowano nawierzchnię placu przy ul. Plebiscytowej 37 i chodniki przy ul. Koszarowej 8; wykonano remonty kapitalne dachów budynków: Głowackiego 23, Powstańców 3, Jagiellońska 19, Sobieskiego 25; wykonano remont i malowanie klatek schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych przy ul. 3 Maja 36
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Zielony wypoczynek - rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2016),
 2. Zakup nowości książkowych i audiobooków dla filii Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej: nr 35 przy ul. Słowackiego 20, nr 4 przy ul. Poniatowskiego 14, nr 1 przy ul. Ligonii 7 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2016),
 3. Biblioteka, książka, informacja - czas na zmiany (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2016),
 4. Zadania z zakresu edukacji kulturalnej i regionalnej, lato w mieście, festynów środowiskowych, promocji kulturalnej miasta i inicjatyw kulturalnych tj. Fundacja Arka Noego: Koncert ARKI NOEGO na pikniku rodzinnym; Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach: Kulturowe równanie szans – spędź z nami wolny czas – Festyn miejski dla mieszkańców Katowic; Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach: XXI Festiwal "Muzyka Organowa w Katedrze" – Recitale na organach Georga Hradetzky'ego;

- Stowarzyszenia Krajowe Studium Polski Podziemnej: Niepokonani; Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych "Marchoń": Święto Purim w Katowicach; Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego: V Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, X Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów; Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży: Gala Finałowa II Katowickiego Festiwalu Tańca 2016; Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów: Sztuka komputerem grana; Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT: Blues na Mariackiej; Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego: Mural na budynku Uniwersytetu Śląskiego, Dyplomy UŚ: projektowanie graficzne; Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego: Śląski Turniej Debat Oksfordzkich; Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: Konkurs Plastyczny dla dzieci przedszkolnych "Bądźcie miłośnikami..." (Małe Granty, Wydział Kultury, 2016),
5. Inicjatywy kulturalne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach: Wspieranie amatorskiego ruchu śpiewaczego – warsztaty "Wspólny śpiew", Warsztaty artystyczne w słonecznej krainie, Nasza tożsamość – Katowice w obiektywie historii (dotacje w ramach Otwartego konkursu ofert, Wydział Kultury, 2016),
 6. Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów w celu poprawy estetyki Śródmieścia (Budżet Obywatelski: projekt lokalny - ul. Kozielska 4, 8, ul. Mikołowska 11, 13, 44, ul. Słowackiego 11, 33/3, 3 Maja 33, ul. Św. Jana 14, ul. Mariacka 22, 25 - ściana szczytowa, ul. Barbary 1, ul. Kordeckiego 2, 5, ul. Dąbrowskiego 9, ul. Ligonja 31, Pl. Miarki 1, ul. Gliwicka 13, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 2016),
 7. Przebudowa fragmentu górnego zieleńca w rejonie budynków przy ul. Jordana 13 – 13d, ul. Skłodowskiej 39 – 49, ul. Poniatowskiego 24 – 28 (Budżet Obywatelski, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 2016),
 8. Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (Budżet Obywatelski, ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 15, 2016),
 9. Renowacje wokół osi Plac Hlonda - ul. Barbary (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2016),
 10. Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2016),
 11. Przebudowa podwórka przy ul. Jordana - Curie Skłodowskiej – Poniatowskiego (Budżet Obywatelski, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 2016).
 12. Realizacja programu „Lokal na kulturę” (Wydział Budynków i Dróg), w ramach którego zawarto umowy najmu na lokale użytkowe:
 - w 2016 roku: przy ul. Kordeckiego 2 z Fundacją Kultura Obrazu (fotograficzne archiwum społeczne katowiczian, warsztaty terapeutyczne i galeria), przy ul. Kilińskiego 22 z March'o Studio Joanna Jochymczyk (organizacja wystaw, warsztatów twórczych, eventów społecznych, sprzedaż produktów związanych z upcyklingiem i ecodesignem oraz "klinika" starych mebli),
 - w 2017 roku: przy ul. Chopina 8, w którym Stowarzyszenie Artystów Tułacze prowadzi teatr kameralny i centrum kulturowe tzw. Teatr Młody; przy ul. Kościuszki 39, w którym Fundacja Imago Silesia prowadzi „Alternatywny Dom Kultury”; przy ul. Sienkiewicza 21, w którym firma Dagmara Cieślik BRIFT organizować będzie warsztaty rękodzieła, spotkania artystów, znawców historii sztuki (planowane rozpoczęcie działalności na koniec 2018 r.); przy ul. Warszawskiej 25A z firmą Centrum Kultury Hip Hop „hip hop spot” Alex Kwoka; przy ul. Warszawskiej 67 z firmą Łukasz Dębski Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna.
 13. Rewitalizacja terenu zielonego na podwórku przy ul. Kościuszki/Szeligiewicza/Narcyzów/Różana (Inicjatywa Lokalna, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 2017)
 14. Czytam. Wypożyczam w Filii nr 1 MBP w Katowicach - zakup książek, audiobooków, sztalug, antyram i tablic korkowych (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017)
 15. Zakup książek i audiobooków oraz sprzętu komputerowego dla Filii nr 13 MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017)

16. Zakup nowych książek dla Filii nr 4 MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017)
17. Trawniki bez samochodów – przywracanie zieleni w miejscach zniszczonych przez nielegalnie parkujące pojazdy: ul. Stalmacha + ul. Sądowa (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2017)
18. Budowa miejsc parkingowych wraz z restrukturyzacją trawnika przy Placu Rostka (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2017)
19. Zielone okolice ul. Mikołowskiej (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2017)
20. Katowicki Senior Bezpieczny – spektakl teatralny dedykowany seniorom, mający zwiększyć ich świadomość w zakresie zagrożeń występujących w życiu codziennym (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017)
21. Dzielnicowe spotkania z historią i architekturą – wykłady na temat historii architektury Katowic połączone ze zwiedzaniem obiektów (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017).

Dodatkowo:

- Podjęto uchwałę nr XXVIII/583/16 z dnia 27.07.2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (zmieniono granice obszaru objętego przystąpieniem),
- Podjęto uchwałę nr XXXVII/720/17 z dnia 2.03.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach.

1.2 Podobszar Zawodzie

1.2.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– ubóstwo i wykluczenie społeczne,– zły stan środowiska,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.	<p style="text-align: center;">Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące poprawę warunków zamieszkania i usług wraz z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców na rzecz minimalizacji zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy w rozwoju społeczno-gospodarczym Katowic.</p>

1.2.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie

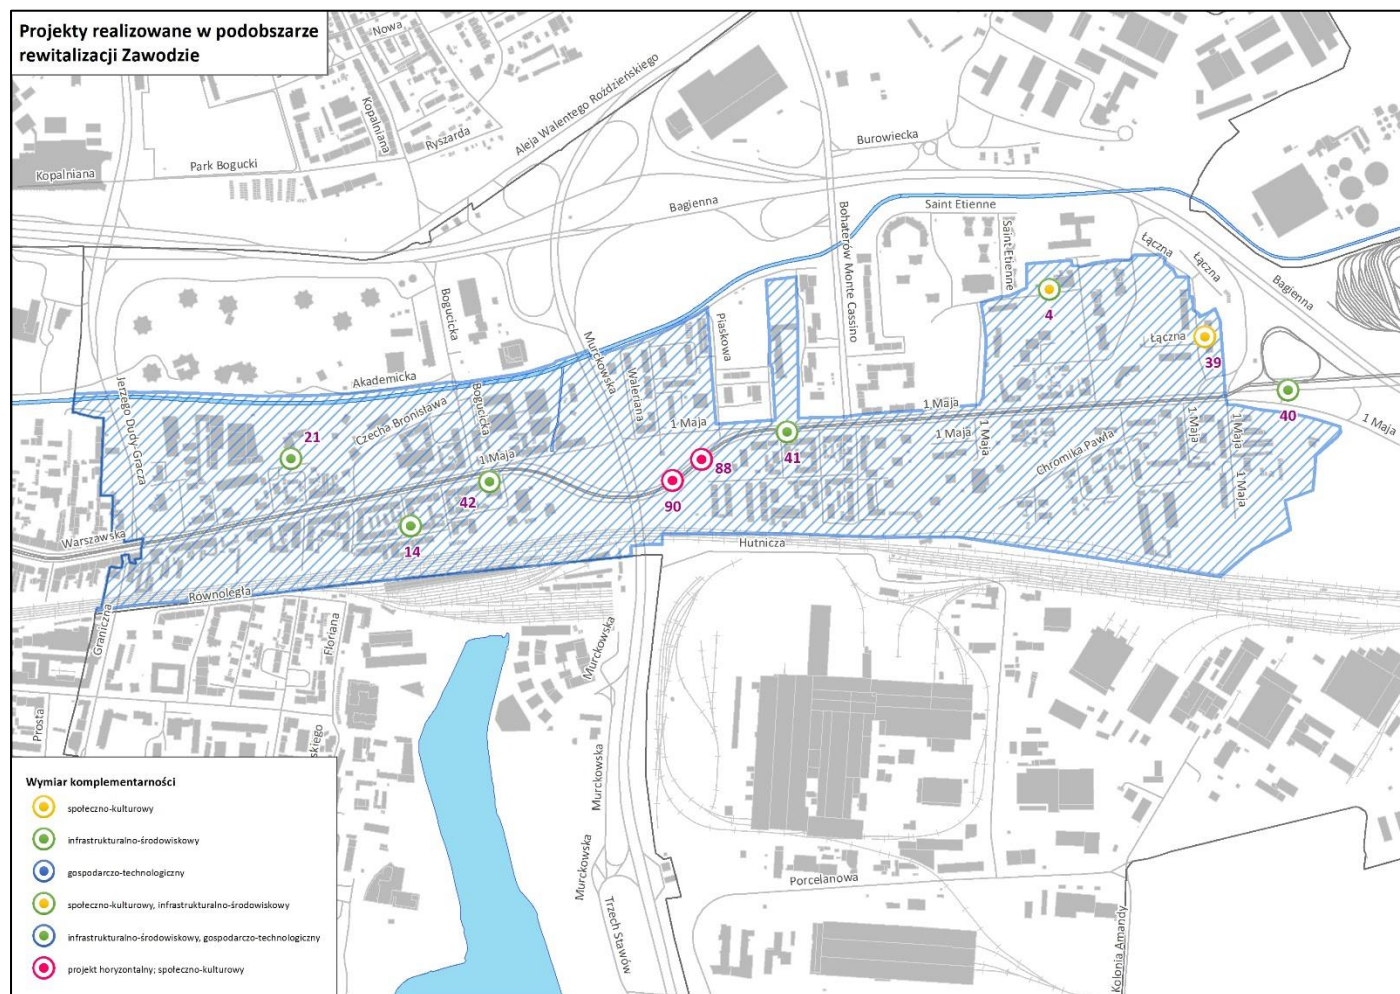


Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 2 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
4 ⁸	Miasto Katowice Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent miękkiej)	2015-2017	2 751 138 zł	W roku 2016 poniesiono wydatki na utrzymanie budynków, bieżące funkcjonowanie w związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów i grup żłobkowych w których opieką objęto 129 dzieci oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. W roku 2017 poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.	Z
	Miasto Katowice Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność	2015-2017	2 836 084 zł	W roku 2016 wykonano adaptację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i 19 na pomieszczenia żłobka oraz dostarczone i zamontowano niezbędne wyposażenia. Opracowano instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Żłobków	Z

⁸ Projekt realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar – Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar – Zawodzie). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	zawodową rodziców (komponent twardy)			wraz z wyposażeniem oraz program funkcjonalno-użytkowy Żłobków. Ponadto zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu. W roku 2017 na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, plac gospodarczy, ciąg pieszo - jezdny, wiatę śmietnikową, nasadzono krzewy; na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, plac zabaw, nasadzono krzewy.	
14 ⁹	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	4 400 540 zł	Ul. Karola 3 - faza przygotowawcza do realizacji.	R przyg
21	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII (X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach)	2017-2019	1 140 000 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
39	Miasto Katowice (MOPS), NGO Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	470 304 zł	Od marca 2016 Program jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. W 2016 roku w Programie wzięło udział 52 osoby, a w 2017 roku 77 osób.	Z
40	Miasto Katowice Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	2015-2020	82 628 477 zł	W roku 2016 okresie opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. W roku 2017 uregulowano należność za wykonanie wycinki drzew oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej; podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych; nabyto od Spółki Tramwaje Śląskie S.A prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. 1 Maja.	R
41	Miasto Katowice Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	2010-2012 2014-2016	11 512 729 zł	W latach 2014/2015 zadanie zakończone i odebrano. Trwa postępowanie w sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji. W roku 2016 środki zaplanowano na wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z obniżeniem wartości gruntu, jednak wycofano się z zawarcia umowy dotyczącej stanu prawnego z uwagi na brak stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii wysokości kosztów.	Z
42	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 dawnego Ratusza gminy miejskiej Zawodzie	2009-2018	19 450 200 zł	W 2016 roku w ramach realizacji IV etapu prac wykonano renowację patio, zadaszenie dziedzińca wewnętrznego poprzez utworzenie atrium, oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego. W roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, roboty budowlane (adaptacja wnętrza, w tym części pomieszczeń piwnicznych na cele archiwum, roboty wykończeniowe), roboty w zakresie renowacji i prac konserwatorskich (odrestaurowanie Sali Senatu – wcześniejszej Sali Rady Gminnej Bogucice – Zawodzie, oraz historycznych detali architektonicznych wnętrza budynku), roboty instalacyjne (wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i źródła ciepła, wodnej, sanitarnej oraz wentylacji, montaż instalacji niskoprądowych:	R

⁹ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice oraz Szopienice - Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017
				instalacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalacja telewizji przemysłowej CCTV, instalacja sieci strukturalnej, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacja kontroli dostępu, instalacja audiowizualna, instalacja BMS), zakupy w zakresie pierwszego wyposażenia, m.in. zakup sprzętu audiowizualnego. Na realizację projektu do dnia 31.12.2017 r. poniesiono łącznie 15 740 854 zł brutto (dotacja Miasta Katowice: 8 192 982 zł, dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4 162 314 zł, środki własne UE Katowice: 3 385 559 zł.

W granicach podobszaru Zawodzie przewidziano do realizacji **7 projektów: 6 miejskich** – w tym modernizację budynku komunalnego przy ul. Karola 3 i **1 pozamiejski**). Spośród ww. przedsięwzięć: **3 zakończono, 2 znajdowały się w trakcie realizacji** (w tym projekt zgłoszony przez Uniwersytet Ekonomiczny), **1 w fazie przygotowawczej do realizacji i 1 planowany do realizacji**.

Warto nadmienić, że jednym z efektów pracy lokalnych animatorów w ramach **Programu Aktywności Lokalnej w Zawodziu** było utworzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie. Wśród 15 radnych dzielnicy, aż 8 z nich to uczestnicy Programu.

1.2.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Zawodzie, w 2016 r. zrealizowano w ramach:

- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2016 roku:** remont kapitalny dachu budynku przy ul. 1 Maja 24, remont instalacji wod.-kan. przy ul. Cynkowej 12a i 18b oraz prace modernizacyjne w budynku przy ul. Karola 3 (2016 i 2017), a w **2017 roku:** rekonstrukcję klatek schodowych przy ul. Cynkowej 16 c, 18 c.

- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. "Razem dla Rawy - promocja postaw ekoodpowiedzialnych połączona ze sprzątnięciem Bulwarów Rawy, warsztatami edukacyjnymi, spektaklem teatralnym i wspólnym piknikiem integracyjnym" na realizowana na wniosek grupy mieszkańców dzielnicy Zawodzie (Inicjatywa lokalna, Wydział Promocji, 2016),
2. Historyczny pejzaż Śląska: plener i wystawa malarstwa dziedzictwa Ziemi Tarnogórskiej (warsztaty malarskie w MDK „Bogucice-Zawodzie”, jesienny plener malarski oraz wystawa prac uczestników, której wernisaż odbył się w Galerii na Piętrze) [Inicjatywa lokalna, Wydział Kultury, 2016],
3. Zawodziański Dzień Bajtla: dzielnicowa impreza realizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka integrująca dzieci i młodzież z dzielnicy (gry, zabawy, konkursy i animacje podczas festynu rodzinnego) [Inicjatywa lokalna, Wydział Kultury, 2016],
4. Zakup nowości książkowych dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 13 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2016),
5. Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki, ul. Czecha 2 (Budżet Obywatelski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projekt ogólnomiejski, 2016),

6. Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta, ul. 1 Maja 40 (Budżet Obywatelski, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, projekt ogólnomiejski, 2016),
7. Cyfrowa Eksplozja Wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie” wraz z jej wyposażeniem (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017),
8. Zakup nowości książkowych dla MBP, Filia nr 31 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017),
9. „Aktywne Zawodzie! Żyj zdrowo i sportowo!” – remont i wyposażenie małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. J. Ziętka (Budżet Obywatelski, 2017),
10. Światowy Miesiąc Seniora - cykl integracyjnych spotkań i warsztatów dla Seniorów z Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej w ramach Światowego Dnia Praw Osób Starszych (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
11. Światowy Tydzień Seniora - cykl integracyjnych spotkań i warsztatów dla Seniorów z Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
12. II Zawodziański dzień Bajtla - impreza z okazji Dnia Dziecka (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
13. Historyczny pejzaż Śląska. Plener i wystawa malarstwa dziedzictwa Ziemi Cieszyńskiej - warsztaty plastyczne, plener, wystawa (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
14. Zawodziańskie Kino Nieme - projekt mający za zadanie dostarczenie wiedzy filmoznawczej i zintegrować działania mieszkańców Zawodzia z przedstawicielami środowisk zaangażowanych w edukację filmową, organizacja prelekcji (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
15. III Dni Zawodzia - organizacja 3-dniowego święta dzielnicy, wernisaż wystawy sekcji plastycznej, koncert, impreza plenerowa (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
16. Dzielnicowe Kawiarenki Sąsiedzkie. "Poznaj sąsiada, niech poopowiada" - organizacja sąsiedzkich spotkań mieszkańców w dzielnicy (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),

Dodatkowo:

Podjęto uchwałę nr XXVIII/583/16 z dnia 27.07.2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (zmieniono granice obszaru objętego przystąpieniem).

1.3 Podobszar Załęże

1.3.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków 	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej 	<p>Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego wraz z poprawą warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców</p>

1.3.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże

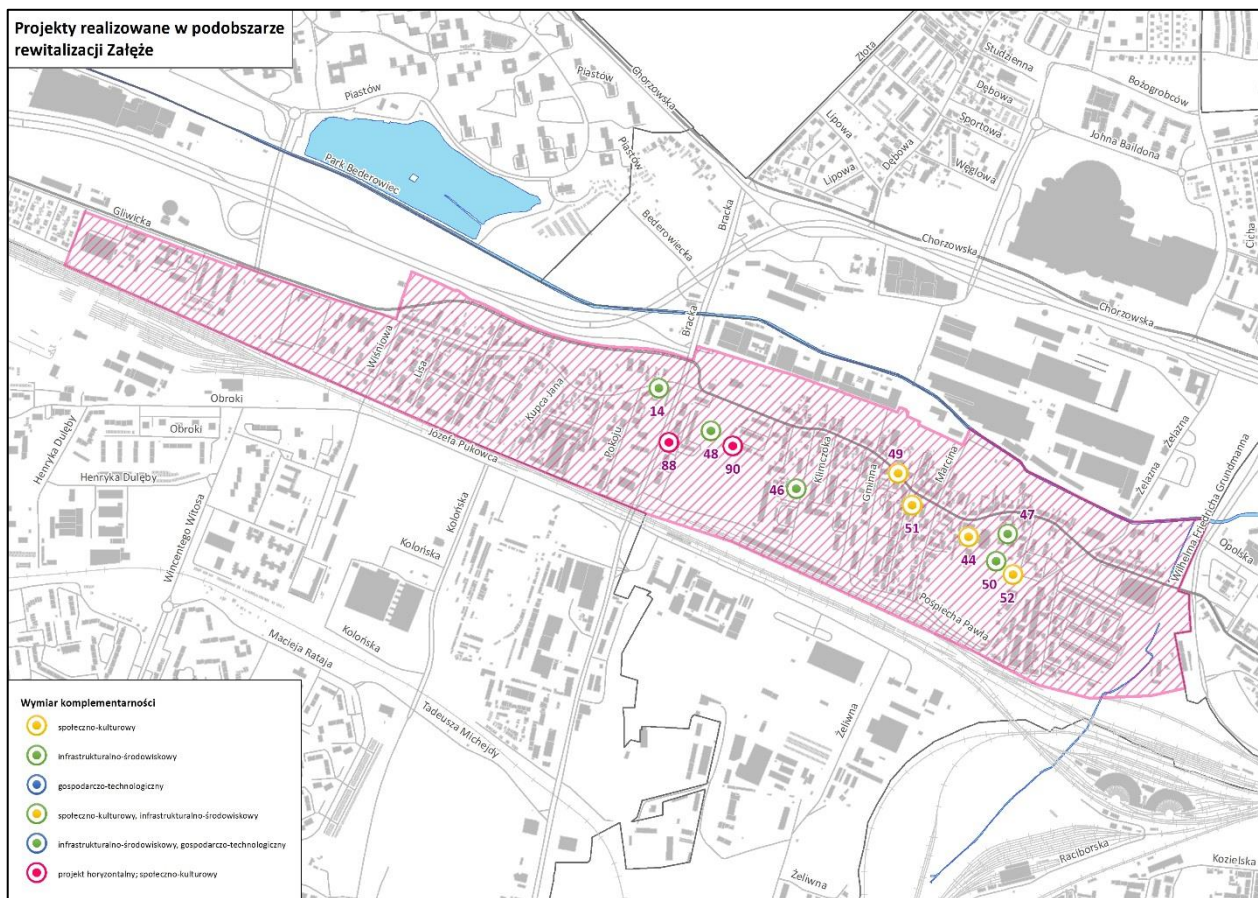


Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 3 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
14 10	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	350 150 zł	Ul. Gliwicka 148 – realizacja projektu zakończona w 2016 roku.	Z
44	Miasto Katowice (ZSiP nr 2 wspólnie z MOPS) Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - I etap	2017-2020	1 085 552 zł	W roku 2017 podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania (ogłoszono nabór na animatorów lokalnych) oraz organizacją projektu; wykonano remont sali przeznaczonej na realizację projektu "Klub" oraz "Punkt obywatelski", sali nr 52 wraz z adaptacją na gabinet pedagogiczny oraz gabinetu pedagogicznego wraz z adaptacją na świetlicę środowiskową.	R
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - II etap	2020-2023	700 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P
45	Miasto Katowice	2015-2016	2 513 218 zł	W roku 2016 zakończono realizację zadania.	Z

¹⁰ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice oraz Szopienice - Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	Przedłużenie ul. J. Baillona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej				
46 11	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b	2016-2018	6 615 507 zł	W roku 2016 opracowane zostały projekty techniczne oraz dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenia budowlane.	R
47	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gliwicka 74a w Katowicach)	2014-2019	1 275 386 zł	W roku 2016 wykonano aktualizację studium wykonalności oraz audyt energetyczny; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu. W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosku o umorzenie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu.	R
48	Miasto Katowice (ZZM) Rewitalizacja Placu Londzina	2017-2018	1 402 838 zł	W roku 2017 wykonano studium wykonalności oraz projekt budowlany.	R
49	Miasto Katowice Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych	2016-2018	138 015 zł	W 2016 we wrześniu powołana została Lokalna Grupa Urbact (LGU) w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Odbyły się 4 spotkania Grupy, podczas których zdefiniowano problemy dzielnicy oraz rozpoczęto prace nad wizją. W 2017 r. odbyło się 7 spotkań LGU podczas których pracowano nad kolejnymi elementami Zintegrowanego Planu Działania – wizją rozwoju dzielnicy, celami oraz działaniami przyczyniającymi się do poprawy sytuacji w dzielnicy. W październiku podczas Dni Załęża zorganizowano wydarzenie „Gruszkowe Maszkety”, którego celem było przedstawienie organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Rozpoczęto przygotowania do konferencji podsumowującej projekt, którą zaplanowano na luty 2018.	R
50	Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Prace remontowe ogrodzenia kościoła i cmentarza Parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu	2015-2019	4 500 000 zł	W roku 2016 Parafia w ramach środków własnych wykonała remont zachodniego odcinka ogrodzenia cmentarza parafialnego.	R
51	Wspólnota Dobrego Pasterza - Klub Młodzieżowy Wysoki Zamek Załęże - wspólna sprawa	2015-2020	2 000 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	R
52	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym metodą asysty aktywnej integracji	2018-2020	1 000 000 zł	ZADANIE 1 – ASYSTA INDYWIDUALNA - w ramach zadania wsparciem zostało objętych 43 osoby, w tym 36 kobiet oraz 7 mężczyzn. W efekcie wsparcia ze strony asystentów 12 osób znalazło pracę, w tym 10 kobiet oraz 2 mężczyzn. Łącznie odbyło się 781 spotkań indywidualnych, czyli 881 godzin asysty. Wszyscy uczestnicy posiadali swój Indywidualny Plan Rozwoju współtworzony wspólnie z asystentem. Odbyły się 72 godziny superwizji pracy asystentów. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z aktywizacji indywidualnej – spotkań z coach – odbyło się 21 godzin spotkań.	R

¹¹ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofska 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
				<p>ZADANIE 2 – WARSZTATY USPOŁECZNIAJĄCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – warsztaty kulinarne – 50 godzin, – warsztaty zdrowego żywienia – 64 godziny, – warsztaty artystyczne – 32 godziny, – warsztaty ruchowe – 8 godzin, – warsztaty kosmetyczne – 10 godzin, – warsztaty wychowawcze – 40 godzin. <p>ZADANIE 3 – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyjścia kulturalno-sportowe dla uczestników Projektu – 7 wyjść, – wycieczki dla uczestników Projektu wraz z osobami z otoczenia – 3 wycieczki, – 2-dniowe rajdy dla uczestników Projektu i ich rodzin – 3 rajdy, – pikniki integracyjne dla społeczności lokalnej – 1 piknik, – minipikniki dla społeczności lokalnej – 5 minipikników. <p>ZADANIE 4 – ROZWÓJ EDUKACYJNO-ZAWODOWY:</p> <ul style="list-style-type: none"> – doradztwo zawodowe – 18 godzin spotkań indywidualnych z doradcą, – zajęcia komputerowe – 108 godzin zajęć komputerowych, – konsultacje z prawnikiem – 32 godziny, – warsztaty z przygotowania do podjęcia pracy – 8 godzin, – warsztaty edukacyjne (ABC finansów) dla uczestników Projektu oraz osób z otoczenia – 8 godzin. <p>ZADANIE 5 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – doradztwo zawodowe – 23 godziny, – kursy zawodowe – 5 osób, – staże zawodowe – 5 osób, – wizyty studyjne w firmach – 4 wizyty, – spotkania z pracodawcami – 10 godzin, 5 spotkań. <p>Nakłady poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2017 r. wynoszą łącznie 438 315,04 zł (środki własne: 19 472,00 zł, środki unijne: 370 818,91 zł, inne źródła finansowania: 47 754,13 zł)</p>	

W granicach podobszaru Załęże przewidziano do realizacji **10 projektów: 7 miejskich** (w tym modernizacja budynku komunalnego przy ul. Gliwickiej 148) i **3 pozamiejskie**. W okresie sprawozdawczym **zakończono realizację 2 miejskich projektów, wszystkie pozostałe są w trakcie realizacji.**

W zakresie 1 projektu zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną, wnioskodawca nie odesłał informacji sprawozdawczej.

1.3.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Załęże, w latach 2016- 2017 zrealizowano w ramach:

- **działań adaptacyjnych zmierzających do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:** automatyczną miejską stacją wypożyczania rowerów: "Załęże Skwer S. Barei".
- **inwestycji i remontów realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w 2016 roku:** wykonanie źródła podgrzewania wody przy ul. Gliwickiej 102 i ul. Ondraszka 17; rekonstrukcję klatek schodowych w budynkach przy ul. Gliwickiej 83 i ul. Gliwickiej 120; wykonanie remontu kapitalnego dachu oraz wymianę i modernizację instalacji teletechnicznych w budynku przy ul. Zarębskiego 5; zakup i montaż wiat śmietnikowych przy ul. Gliwickiej 58, 95, 99; wydzielono strefę p.poż. w budynku przy ul. Ondraszka 17; wymianę stropu przy ul. Narutowicza 11; remont bramy; przejazd przy ul. Gliwickiej 87; dach budynku przy ul. Gliwickiej 194 oraz pomalowano klatkę przy ul. Zarębskiego 7a; a **w 2017 roku:** przebudowę chodników przy ul. Gliwickiej 120; rekonstrukcję klatki schodowej przy ul. Ondraszka 10; remont schodów wejściowych oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Gliwickiej 93a.
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa: Załęskie Zderzenia Kulturalne; Koncert Wielkopostny "Miłość Cię Znajdzie" (Małe Granty, Wydział Kultury, 2016),
 2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka (Budżet obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2016),
 3. Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji (Budżet obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2016),
 4. Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Gliwicka 74a (Budżet Obywatelski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projekt ogólnomiejski, 2016),
 5. Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta (ul. Gliwicka 55, 73, 58, 81, 93, 95, 97, 99, 131, 141, 120, 146, 150, ul. Zarębskiego 15, ul. Wolnego 8) [Budżet Obywatelski, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, projekt ogólnomiejski, 2016],
 6. Bezpieczny plac zabaw i boisko szkolne (ul. Gliwicka 92, ul. Zarębskiego 2) - oświetlenie placu zabaw i boiska szkolnego (Budżet Obywatelski, Wydział Edukacji i Sportu, 2017).

Dodatkowo:

- Podjęto uchwałę nr XXVIII/583/16 z dnia 27.07.2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (zmieniono granice obszaru objętego przystąpieniem).
- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach (uchwała nr XXVIII/584/16 RM Katowice z dnia 27.07.2016r.).

1.4 Podobszar Bogucice

1.4.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– depopulacja,– niska aktywność gospodarcza,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, <p>wymiar gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych,– podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	<p style="text-align: center;">Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące poprawę warunków zamieszkania, lepsze zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.</p>

1.4.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice

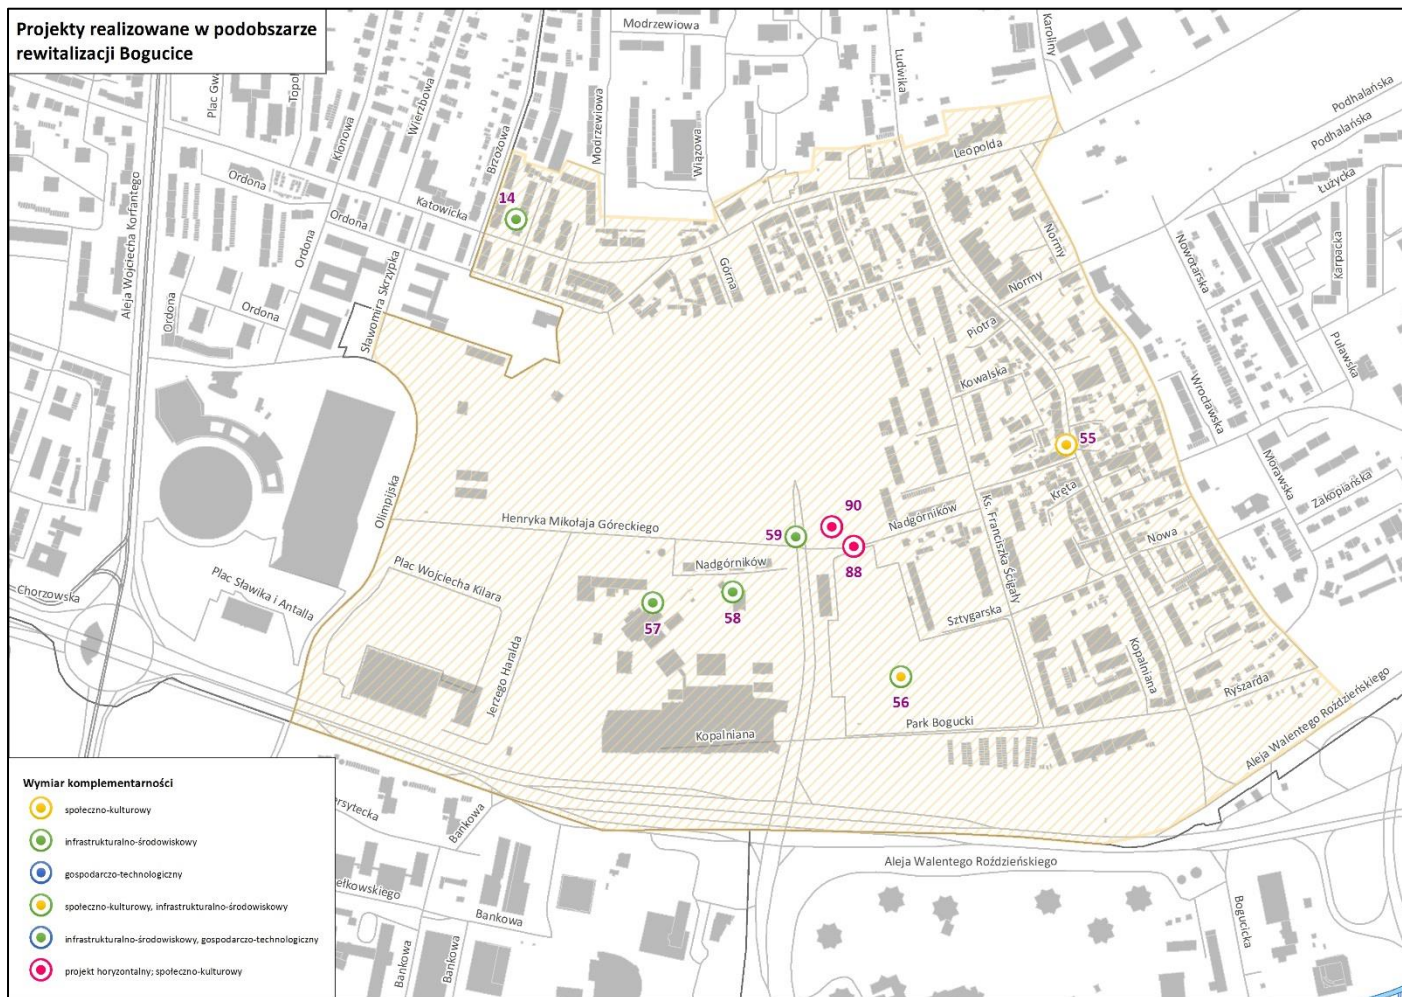


Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 1 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
14 ¹²	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	1 986 580 zł	Ul. Katowicka 48a, 50 - realizacja projektu zakończona w 2016 roku.	Z
55	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap	2018-2020	1 750 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice (MOPS) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap	2020-2023	1 400 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P

¹² Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice oraz Szopienice - Burowiec

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
56	Miasto Katowice (KZGM/ZZM) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	2013, 2015-2018	6 089 869 zł	W roku 2016 podpisano oraz zrealizowano umowę na zmianę opracowania projektowego w związku z planowaną budową pomnika ofiar deportacji. Ponadto w związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji studium wykonalności. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na następne lata. W roku 2017 w związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji studium wykonalności. Rzeczowa realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.	R
57	Muzeum Śląskie Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	2014-2017	30 105 769 zł	W roku 2016 wykonane zostały roboty budowlane oraz konstrukcyjne zgodnie z zakresem określonym w umowie dofinansowania. W związku z technicznymi problemami, jakie pojawiły się na etapie realizacji projektu, dotyczącymi złego stanu technicznego konstrukcji budynku Łaźni Głównej, odmiennych niż zakładano warunków gruntowych pod terenem parkingu oraz innymi problemami, które skutkowały koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, a także kilkukrotnym ogłaszaniem postępowań na wykonanie koncepcji wystawy stałej, Muzeum Śląskie wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia projektu. Miasto Katowice partycypuje w części działań prowadzonych w ramach realizacji tej inwestycji, w roku 2016 wykonanie finansowe w ramach przekazanej dotacji wyniosło 2 mln zł.	R
58	Muzeum Śląskie Rewitalizacja północnej części terenu po byłej kopalni Katowice wraz z adaptacją obiektów zabytkowych	2016-2022	80 000 000 zł	W 2016r. w ramach przygotowania projektu zrealizowano następujące działania: <ul style="list-style-type: none"> – opracowano projekt budowlany dla przebudowy budynków Kuźni i Warsztatu Mechanicznego, przygotowywany był wniosek o wydanie pozwolenia na budowę; – przygotowywana była dokumentacja aplikacyjna do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla przebudowy budynków Kuźni i Warsztatu Mechanicznego; – opracowano pełną inwentaryzację za pomocą skaningu laserowego 3D budynków Kuźni i Warsztatu Mechanicznego oraz zabytkowych obiektów kompleksu szybu Bartosz – do wykorzystania na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej; – uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy budynków Kuźni i Warsztatu Mechanicznego; – sporządzono aktualizację ekspertyz konstrukcyjnych dla wszystkich budynków wchodzących w zakres projektu; – sporządzono opinię geotechniczną dla terenu północnego objętego projektem; – uzyskano wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. zakresu adaptacji i remontu obiektów kompleksu szybu Bartosz. <p>W ramach przygotowań do realizacji projektu i wypracowania ostatecznej funkcjonalności obiektów, Muzeum Śląskie stara się angażować lokalną społeczność prowadząc m.in. cykl spotkań i warsztatów dotyczących różnych aspektów rewitalizacji. Działania te prowadzone są w ramach projektu „Szycha kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji”, realizowanego z udziałem partnera z Norwegii (Norweski Instytut Badań Dziedzictwa Kulturalnego) i finansowane z tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG.</p>	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
59 ¹³	Miasto Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego MŚ, MCK oraz siedziby NOSPR	2008-2018	153 600 696 zł	W roku 2016 wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Podpisano Akt Notarialny na wykup gruntu. Trwały postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok. W roku 2017 wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Trwały postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Zadanie będzie kontynuowane.	R

W granicach podobszaru Bogucice przewidziano do realizacji **6 projektów: 4 miejskie** (w tym modernizacja budynku przy ul. Katowickiej 48a, 50) i **2 zgłoszone** przez Muzeum Śląskie. Spośród nich **1 projekt zakończono** (miejski), **4 projekty znajdują się w trakcie realizacji, a 1 (miejski) – planuje się realizować od 2018 roku.**

1.4.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Bogucice, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno - Gospodarczych Miasta Katowice przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** w 2016 roku: malowanie klatki schodowej przy ul. Markiefki 56, wymianę instalacji domofonowej przy ul. Markiefki 68, a także remont części elewacji i ogrodzenia przy ul. Markiefki 64; a w 2017 roku: doprowadzenie instalacji wody i kanalizacji do mieszkań w budynku przy ul. Bończyka 4; przebudowę chodnika przy ul. Katowickiej 46-46c; remont kapitalny dachu budynku przy ul. Ścigały 59-59a.
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 33 przy ul. Markiefki 44A (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2016),
 2. Edukacyjne warsztaty instrumentalne o charakterze patriotycznym organizowane z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości (Stowarzyszenie Muzyczno – Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta "Katowice – Kleofas") [Otwarty konkurs ofert, Wydział Kultury, 2016],
 3. Wykonanie oświetlenia świątecznego na ul. Markiefki na czas Świąt Bożego Narodzenia (Budżet Obywatelski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 2016),
 4. Zagospodarowanie skweru przy ul. Wajdy (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2016)
 5. Wietrzymy nasz dom kultury – wykonanie klimatyzacji opartej na systemie istniejącej wentylacji w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej wentylacji pomieszczeń piwnicznych Działu Bogucice (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017),
 6. Zakup nowych książek dla Filii nr 33 MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017),
 7. Światowy Miesiąc Seniora - cykl integracyjnych spotkań i warsztatów dla Seniorów z Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej w ramach Światowego Dnia Praw Osób Starszych - cykl spotkań i warsztatów dla seniorów (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
 8. Światowy Tydzień Seniora - cykl integracyjnych spotkań i warsztatów dla Seniorów z Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
 9. Koncert zespołu "Zgrani fest" - piosenki ABBY po śląsku (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),

¹³ Projekt realizowany na granicy dwóch jednostek pomocniczych: Bogucice, Koszutka.

10. II Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Muzyczne Diamenty" 2017 - konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
11. Stała wystawa pamiątek i opracowań historycznych dotyczących kopalni KWK "Katowice" i dzielnicy "Bogucice" (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),
12. Cykl zajęć nauki gry w szachy dla dzieci (Inicjatywa Lokalna, Wydział Kultury, 2017),

Dodatkowo:

- Podjęto uchwałę nr XXVIII/583/16 z dnia 27.07.2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (zmieniono granice obszaru objętego przystąpieniem).
- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego (uchwała nr XXIV/502/16 z dnia 27.04.2016r.).
- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach (uchwała nr XLV/858/17 z dnia 27.07.2017r.).
- W podobszarze funkcjonowały 2 automatyczne miejskie stacje wypożyczania rowerów: "NOSPR Katowice" i "Bogucice Szpital"

1.5 Podobszar Szopienice-Burowiec

1.5.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none"> – depopulacja, – bezrobocie, – ubóstwo i wykluczenie społeczne, – przestępczość, – niska aktywność gospodarcza, – zły stan środowiska, – zły stan techniczny budynków 	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, – rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, – poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej, – wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, – kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tworzenie i wzmocnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, – podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, – ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu ponadlokalnym 	<p style="text-align: center;">Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie i wzmocnienie potencjału endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej, przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.</p>

1.5.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec

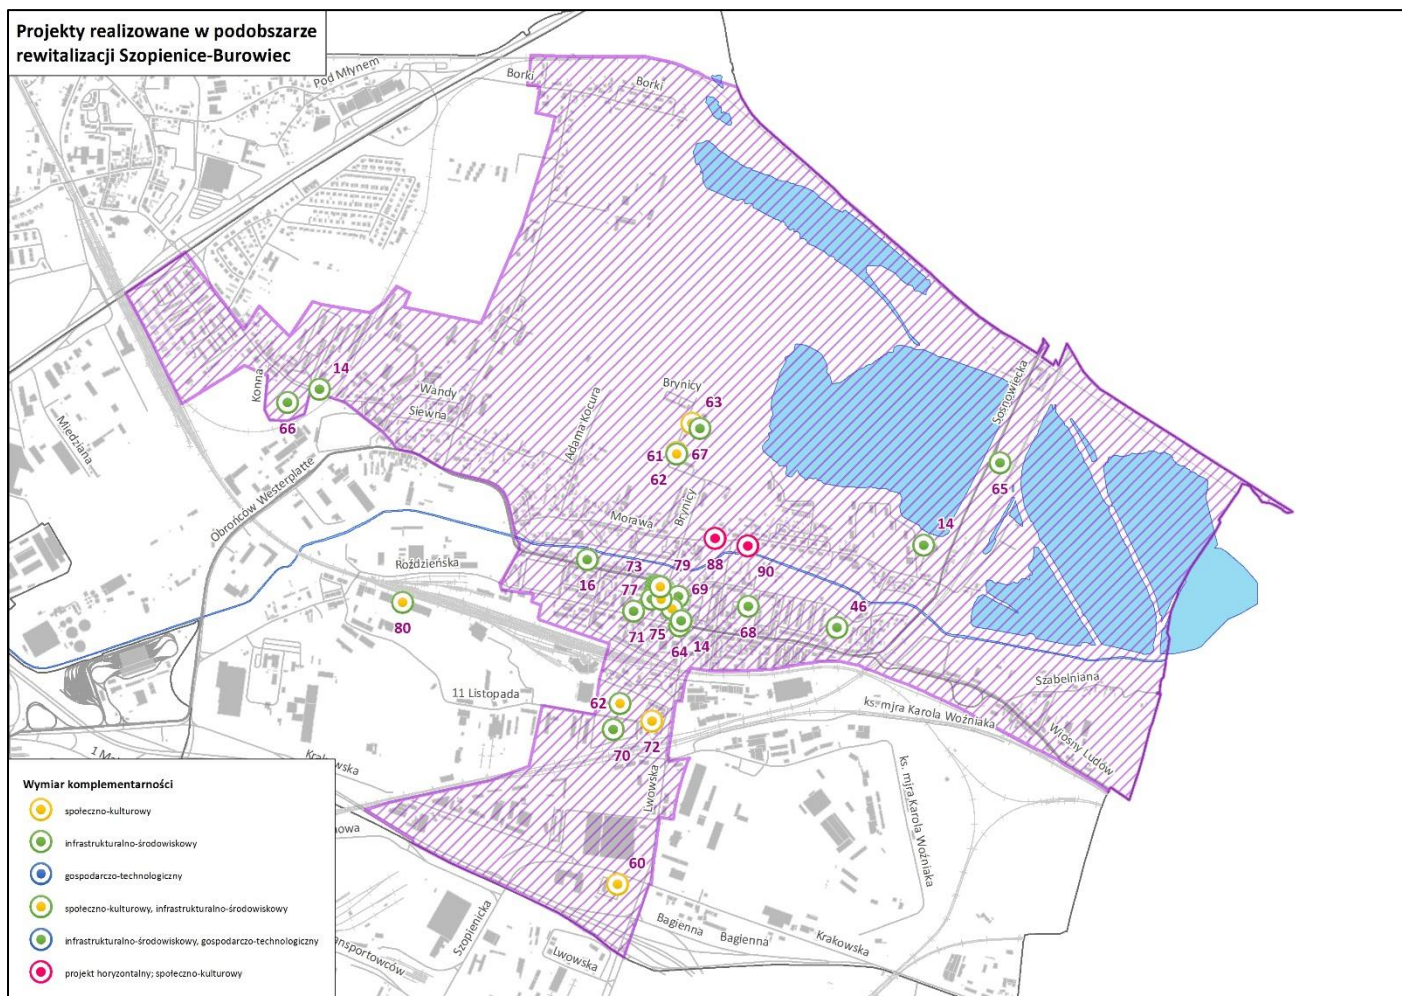


Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy

- * numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 5 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)
- * projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych
- * oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
14 ¹⁴	Miasto Katowice (KZGM) Modernizacja budynków komunalnych	2017-2021	4 018 247 zł	Ul. Morawa 119a – realizacja zakończona w 2016 r. Ul. Gen. Hallera 28 – planowana do realizacji Plac Powstańców 6, 7, 8 – faza przygotowawcza do realizacji	R
16 ¹⁵	Miasto Katowice (KZGM) Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Obr. Westerplatte 42-50)	2009-2017	8 018 115 zł	ul. Obr. Westerplatte 42-50 – w roku 2016 w wyniku przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017r. W roku 2017 zakończono budowę 45 mieszkań. W dniu 08.11.2017r. została wydana decyzja na użytkowanie trzech budynków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	Z

¹⁴ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice oraz Szopienice - Burowiec

¹⁵ Projekt realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec. Koszt podany łącznie dla dwóch lokalizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
46 ¹⁶	Miasto Katowice (KZGM) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b	2016-2018	6 615 507 zł	W roku 2016 opracowane zostały projekty techniczne oraz dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenia budowlane.	R
60	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap	2017-2020	1 710 387 zł	W 2016 roku ogłoszono otwarty nabór partnerów do projektu, w jego wyniku do realizacji Centrum Społecznościowego „SZOPKI” w Szopienicach wybrano Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”. W roku 2017 podjęto działania organizacyjne, administracyjno-biurowe projektu, działania dotyczące spraw promocyjno-informacyjnych projektu. Odbyły się spotkania animatora z mieszkańcami, udział w spotkaniach środowiskowych organizowanych przez mieszkańców (z okazji 10-lecia działań mieszkańców na osiedlu Bagno) i przez Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 (spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych działających w rejonie Szopienic). Animatorzy lokalni rozeznają lokalne potrzeby i zasoby. Odświeżono pomieszczenie pod Centrum Społecznościowe Szopki, zakupiono meble i część wyposażenia.	R
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – II etap	2020-2023	1 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P
61	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	2017-2018	941 793 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - II etap	2019-2020	1 200 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - III etap	2021-2022	1 200 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P
62	Miasto Katowice Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach oraz rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice.	2015-2018	1 912 859 zł	W roku 2016 dokonano uzupełnienia studium wykonalności, realizowanego od roku 2015. Studium zostało odebrane i w całości rozliczone. W roku 2017 dokonano aktualizacji studium wykonalności. Rzeczowa realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.	R
63	Miasto Katowice Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych	2016-2018	1 095 091 zł	W roku 2016 podpisano umowę o dofinansowanie – 12.10.2016. W grudniu 2017 wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Prace trwały w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. Projekt obejmował wybudowanie parterowego obiektu w technologii modułowej. Główne prace obejmowały roboty ziemne, montażowa i	R

¹⁶ Projekt realizowany w dwóch podobszarach: ul. Wolnego 8 (podobszar – Załęże), ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b (podobszar – Szopienice – Burowiec). Wartość projektu podano łącznie dla dwóch lokalizacji.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice – Miejskie Przedszkole nr 66 (2 oddziały integracyjne i 2 oddziały ogólnodostępne)			wykończeniowe, ponadto w MP nr 66 przeprowadzono częściową przebudowę w istniejącej części przedszkola. Prowadzony był także nadzór inwestorski oraz działania promocyjne. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie nowych oddziałów wychowania przedszkolnego (ogólnodostępne, integracyjne, specjalny dla dzieci autystycznych); zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rozwijania kompetencji społeczno- emocjonalnych. Zakupiono niezbędne wyposażenie.	
64	Miasto Katowice Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców (Pl. Powstańców Śląskich)	2010-2015 i 2017	7 894 337 zł	W roku 2016 trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok. W roku 2017 trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2018 rok. Projekt został zakończony w zakresie dot. budowy infrastruktury, trwa regulowanie spraw terenowo prawnych.	Z
65	Miasto Katowice Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus, Borki	2016-2018	406 765 zł	W latach 2015/2016 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania przedmiotowego terenu. Trwały ustalenia dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji. W roku 2017 wybrano wykonawcę zadania, z terminem zakończenia: 10.03.2018 r. Zadanie będzie kontynuowane.	R
66	Miasto Katowice Budowa trzech basenów w dzielnicach	2015-2019	28 684 450 zł	W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetargi na wybór Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych. W roku 2017 w wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowy na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu oraz na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 11.03.2019 r. Trwały roboty budowlane. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 4.000.000 PLN. Wpływ zgodnie z umową I transzy dofinansowania w dniu 22.12.2017r.	R
67	Miasto Katowice Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	2015-2017	3 829 665 zł	Projekt polegał na rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 41 i 66 w oparciu o modułowe rozwiązania. Wykonano wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe. Wykonano ponadto m.in. zabudowę kontenerową, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, prace elewacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i kanalizacyjne, instalacje C.O., zagospodarowanie terenu, dostarczone i zamontowano wyposażenie sal i kuchni.	Z
68	Miasto Katowice Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIb (Miejskie Przedszkole nr 65 ul. Ciesielska 1 w Katowicach)	2015-2019	1 865 068 zł	W roku 2016 trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz audytu energetycznego. W roku 2017 wykonano usługi na cele złożenia wniosku o środki z WFOŚiGW.	R
69	Miasto Katowice Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach	2014, 2016, 2017-2018	693 568 zł	W roku 2016 dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020. W roku 2017 zaktualizowano analizę finansową oraz studium wykonalności.	R
70	Miasto Katowice (ZZM) Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	2015-2016	223 605 zł	W roku 2015 przewidziano opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt został opracowany, rozliczony i odebrany. W roku 2016 wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone i odebrane.	Z
71	Miasto Katowice (KZGM)	2016-2018	1 185 571 zł	W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i Studium Wykonalności dotyczącej remontu i adaptacji	R

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych			pomieszczeń budynku. W roku 2017 dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenia budowlane.	
72	Fundacja For Animals Przeciwdziałanie bezrobociu oraz przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec	2015-2020	850 000 zł	W roku 2017 przeprowadzono spotkania z mieszkańcami dzielnicy Szopienice-Burowiec, podczas których badano ich potrzeby.	P
73	Browar Factory Centrum Nieruchomości Bros Johann Adaptacja budynku D Browaru Mokrskich na cele rozwoju małej średniej przedsiębiorczości oraz działań społecznych w dzielnicy Szopienice	2017-2019	14 500 000 zł	W roku 2016 zawarto porozumienie z partnerami społecznymi, wyłonionymi w trakcie przygotowań projektu, przebadano środowisko i określono grupy docelowe dla projektów EFS. Opisano działania komplementarne (miękkie) wraz ze wskaźnikami. Sporządzona została dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2017 złożono wnioski o dofinansowanie. Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2018-2019. Na dokumentację wydatkowano łącznie 95 000 zł z środków własnych inwestora, z czego 25 000 zł poniesiono w roku 2017.	P
74	Browar Factory Centrum Nieruchomości Bros Johann Waloryzacja przestrzeni publicznej Browaru Mokrskich wraz z infrastrukturą rowerową na cele rozwoju kultury i turystyki w dzielnicy Szopienice oraz zrównoważonej mobilności	2017-2020	4 700 000 zł	Do tej pory nie przystąpiono do prac ze względu na nierozpoczęcie i niezakończenie projektu dot. adaptacji budynku D – to on narzuci określone ramy przebudowy otoczenia Browaru. Dotychczas prowadzono jedynie działania mające na celu określenie ram prawno-organizacyjnych, finansowych oraz technicznych projektu.	P
75	Pro Invest Sp. z o.o. Adaptacja obiektu dawnej szkoły miejskiej przy ul. Brynicy 3 na obiekt gastronomiczno-hotelowy	2018-2020	19 500 000 zł	Projekt jest gotowy do realizacji, określono funkcje centrum. Zawarto porozumienia z partnerami społecznymi, wyłonionymi w trakcie przygotowań projektu. Przebadano środowisko i określono grupy docelowe dla projektów EFS. Sporządzono dokumentację techniczną.	P
76	Browar Factory Centrum Nieruchomości Bros Johann Utworzenie strefy inkubacyjnej na cele rozwoju małej średniej przedsiębiorczości w dzielnicy Szopienice	2018	2 500 000 zł	W roku 2016 dokonano diagnozy otoczenia oraz środowisk, do których kierowany będzie projekt. Określono partnerów społecznych oraz rozpoczęto z nimi rozmowy, celem wyłonienia partnerów do realizacji działań społecznych. Uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenia konserwatorskie. W 2017 roku złożono wnioski o dofinansowanie.	P
77	Browar Factory Centrum Nieruchomości Bros Johann Optymalizacja gospodarowania energią oraz zwiększenie efektywności energetycznej Browaru Mokrskich w Szopienicach	2017-2019	3 000 000 zł	Projekt znajduje się w fazie koncepcyjno-projektowej – opracowywane były założenia co do zakresu prac. Po zakończeniu tego etapu opracowane zostaną audyty i uszczegółowiony zostanie zakres prac. Inwestor posiada następujące dokumenty dot. projektu: koncepcja ogólna; inwentaryzacja źródeł światła i odbiorników wysokoenergetycznych; szczegółowa koncepcja technologiczna; diagnoza i wstępne założenia.	R
78	Browar Factory Centrum Nieruchomości Bros Johann Edukacja, szkolenia i staże zawodowe w Browarze Mokrskich w Szopienicach	2017-2020	2 960 000 zł	W roku 2016 dokonano diagnozy otoczenia oraz środowisk, do których kierowany będzie projekt. Określono partnerów społecznych oraz rozpoczęto z nimi rozmowy, celem wyłonienia partnerów do realizacji działań społecznych. W roku 2017 firma wdrażała pilotażowy program „Uczeń szkoły zawodowej”. W roku 2017 Beneficjent podjął współpracę z miastem Katowice (pilotaż)	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
				w zakresie przygotowania w ramach EFS pierwszej grupy uczniów – projekt zakończono. W latach 2019-2021 planuje się kontynuować te działania w budynku D. Obejmą one także budynek przy ul. Brynicy 3. Pod koniec marca 2017 roku podpisano listy intencyjne o współpracy. Opracowano wstępną koncepcję projektu i przystąpiono do konsultacji z IZ RPO WSL, a także MOPS.	
79	Browar Factory Centrum Nieruchomości Bros Johann/ Stowarzyszenie dla Szopienic Świetlica międzypokoleniowa na terenie obszaru Browaru Mokrskich w Szopienicach	2017-2020	4 500 000 zł	W roku 2016 dokonano diagnozy otoczenia oraz środowisk, do których kierowany będzie projekt. Określono partnerów społecznych oraz rozpoczęto z nimi rozmowy, celem wyłonienia partnerów do realizacji działań społecznych. W marcu 2017 roku podpisano listy intencyjne o współpracy – zawarto koalicję z 4 NGO na rzecz realizacji działań EFS w latach 2019-2020. Opracowano wstępną koncepcję projektu i przystąpiono do konsultacji z IZ RPO WSL, a także MOPS.	P
80	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Walcownia Cynku	2013-2020	6 300 000 zł	W okresie od maja do lipca 2016 r. Inwestor kontynuował roboty w ramach pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, polegających na remoncie budynku hali byłej Walcowni Cynku H.M.N. Szopienice. W sierpniu 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane i instalatorskie związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku Walcowni na obiekt: Walcownia cynku – Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach-Szopienicach, polegające m.in. na wykonaniu: wewnętrznej instalacji hydrantowej, zewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji okablowania ochronnego, montażu stolarki drzwiowej, uzupełniania okładzin i obudów ścian w pomieszczeniach sanitarnych, dokończenia montażu instalacji wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych, zabezpieczenia farbą podkładową konstrukcji słupów stalowych, wykonaniu klinów podjazdowych ułatwiających dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. W roku 2017 wykonano drogi dojazdowe oraz parking na 120 samochodów, drogi dojścia i dojazdu od strony parkingu, wyremontowano i uzupełniono oryginalne ceglane ogrodzenie, wykonano instalację okładzin ściennych w części sanitarnej, montaż wentylatorów wspomagających wentylację grawitacyjną oraz kontynuowano prace przy zabezpieczeniu konstrukcji stalowej przed pożarem. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wynoszą 6 300 000 zł.	Z
67*	Miasto Katowice Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte	Zmiana planu: Uchwała nr XXXIV/679/16 z 14.12.16r. W związku z wycofaniem się inwestora zewnętrznego z realizacji projektu zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę infrastruktury drogowej.		O	

*numer projektu odpowiada numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XXVII-559-16 z 29.06.2016)

W granicach podobszaru Szopienice – Burowiec przewidziano do realizacji **24 projekty: 15 miejskich** (w tym modernizację trzech budynków komunalnych) i **9 pozamiejskich. Zakończono realizację 5 projektów**, w tym 3 miejskich. **W trakcie realizacji znajduje się 11 projektów**, w tym 9 miejskich, a w latach kolejnych **planuje się realizację 8 pozostałych** (w tym 7 pozamiejskich). Zadania w ramach projekt obejmującego modernizację budynków komunalnych znajdują się na różnym etapie realizacji.

1.5.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Szopienice - Burowiec, w latach 2016-2017 zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno - Gospodarczych Miasta Katowice:**

przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2016 roku m.in.: zagospodarowanie terenu przy ul. Wiosny Ludów 79a, zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Wiosny Ludów 26a, 26b, 26c, ekspertyzę p.poż. budynku przy ul. Lwowskiej 5, malowanie klatki schodowej przy ul. Bednarskiej 15 i remont dachu przy ul. Przelotowej 1; a w roku 2017: rekonstrukcję klatek schodowych przy ul. Chemicznej 1, remonty kapitalne dachów budynków przy ul. Morawa 3, 5 oraz zasilanie do budynku przy ul. Przelotowej 23,

przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w 2016: przebudowę 2 kładek dla pieszych - ul. Lwowska, wiadukt nad DK-79

- **przedsięwzięć „oddolnych”:**

1. Festyn związany z otwarciem strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Katowicach – Szopienicach po przebudowie oraz obchody Dnia Strażaka (Ochotnicza Straż Pożarna w Katowicach-Szopienicach) [Małe Granty, Wydział Kultury, 2016],
2. Festiwal Muzyczny Artystów Nieprofesjonalnych "Na klepisku" - Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru (Małe Granty, Wydział Kultury, 2016),
3. Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 19 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 i Filii nr 36 przy ul. Gen. Hallera 28 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2016),
4. Muzyczne marzenia dzieci (Budżet Obywatelski , Miejskie Przedszkole nr 65, 2016),
5. "Bezpieczne drogi" - zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach (Budżet Obywatelski, Wydział Zarządzania Kryzysowego, 2016),
6. Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (Budżet Obywatelski , Wydział Zarządzania Kryzysowego, 2016),
7. Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta (ul. Hallera 44, ul. Wiosny Ludów 24, 26, 43, 45, ul. Obr. Westerplatte 100) [Budżet Obywatelski, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, projekt ogólnomiejski, 2016),
8. Zakup nowości i doposażenie Filii nr 36 MBP - zakup książek, audiobooków, prasy, zakup sprzętu multimedialnego-tablica interaktywna, zakup wyposażenia kąpieliska dla malucha (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017),
9. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Burowca i okolic – ul. Hallera (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2017),
10. Siłownia Plenerowa - ul. Borki 33 (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2017)

Dodatkowo:

- W podobszarze funkcjonowała 1 miejska automatyczna stacja wypożyczania rowerów: "Szopienice - Plac Powstańców Śląskich".

1.6 Podobszar Janów-Nikiszowiec

1.6.1 Problemy, kierunki, cel rewitalizacji

Główne problemy	Kierunki działań	Cel rewitalizacji
<ul style="list-style-type: none">– depopulacja,– niska aktywność gospodarcza,– zły stan techniczny budynków	<p>wymiar społeczno-kulturowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,– poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, <p>wymiar gospodarczo-technologiczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,– wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,– kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, <p>wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:</p> <ul style="list-style-type: none">– tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,– podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej	<p>Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych determinujących atrakcyjność turystyczną, w oparciu o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz unikatowe walory urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej</p>

1.6.2 Projekty podstawowe realizowane w podobszarze

Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec

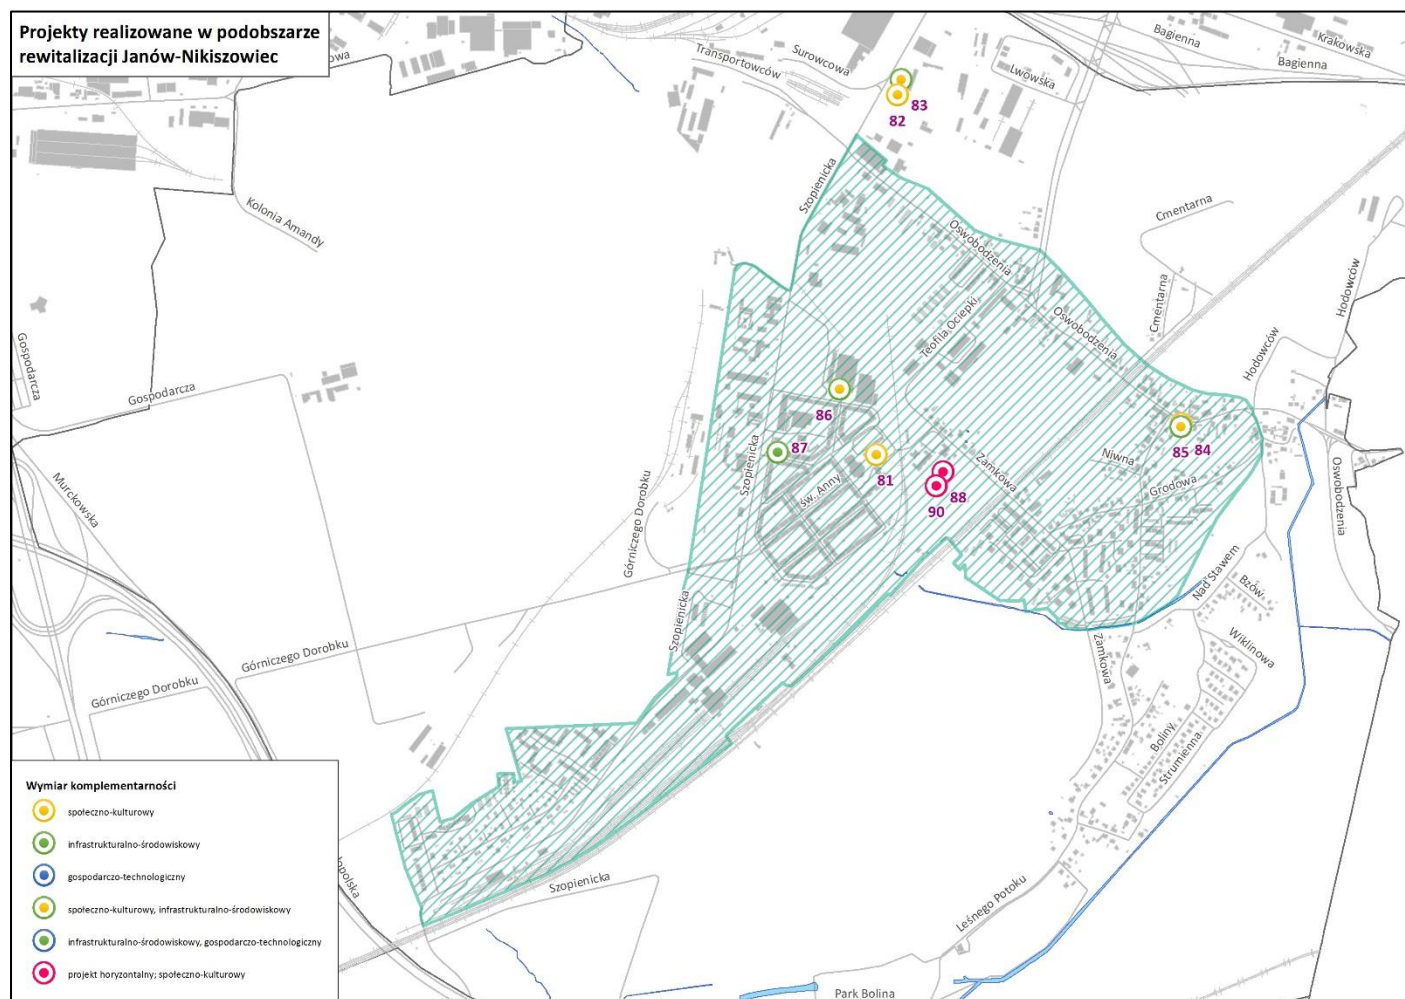


Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 6 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
81	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	2017-2020	1 854 269 zł	W roku 2016 ogłoszono otwarty nabór na partnera projektu, w ramach którego do realizacji projektu wybrano Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W roku 2017 podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu. Podjęto wstępne działania diagnostyczne obszarów objętych projektem tj. osiedla Nikiszowiec, Korea oraz część Janowa. Realizowano działania związane z funkcjonowaniem Inkubatora Animatorów Nikiszowca. Jego działalność opierała się na regularnych, codziennych spotkaniach z młodzieżą. W ramach działań związanych z rewitalizacją Nikiszowca nawiązano współpracę z miejscowością Ratingen w Zagłębiu Ruhry.	R
	Miasto Katowice (MOPS), NGO Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	2020-2023	1 000 000 zł	Projekt planowany do realizacji	P

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
82	Miasto Katowice Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych.	2016-2018	161 936 zł	W roku 2016 wypłacono wynagrodzenie za wykonanie umowy w zakresie doradztwa zawodowego. W roku 2017 zakupiono wyposażenie biura projektu, sterowniki PLC; przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego (38 uczniów) oraz kurs uprawnień elektrycznych SEP (18 uczniów) z egzaminem; zrealizowano kurs projektowania i symulacji układów elektronicznych CAD, montażu instalacji fotowoltaicznych, programowania sterowników PLC, obsługi górniczych kolejek podwieszanych; dla 6 uczennic przeprowadzono kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; skierowano do ZDZ Katowice-oddział Chorzów nauczyciela na kurs spawalniczy MIG/TIG; zakupiono odzież ochronną dla stażystów i praktykantów, wyposażenie biura projektowego; wypłacono stypendia stażowe, wynagrodzenia dla opiekunów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.	R
83	Miasto Katowice Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach	2015-2017	1 106 142 zł	W roku 2016 zapłacono I ratę za dozór techniczny projektu. Ponadto środki zaplanowano na wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie elektryki, elektrotechniki, górnictwa i ekonomii. W roku 2017 wykonano remont i modernizację budynku warsztatów szkolnych oraz pracowni; zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, projektor z tablicą interaktywną, sprzęt komputerowy, maszyny specjalistyczne (m.in. do metalu, drewna, spawania, dokonywania pomiarów geodezyjnych) oraz szafy narzędziowej. Projekt zakończono.	Z
84	Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Utworzenie Centrum wsparcia, wolontariatu i promocji zdrowia psychicznego	2015-2019	950 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
85	Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Utworzenie ogrodu terapeutycznego	2016-2020	850 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
86	BIZZTHINK.PL Sp. z o.o. Stworzenie medycznego centrum sportu, rehabilitacji i edukacji oraz usług społecznościowych NIKISZ	2015-2018	7 500 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
87	Śląska Prohibicja Sp. z o.o. Konservacja i przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowej elewacji w dzielnicy Nikiszowiec z uwzględnieniem wartości historycznych i społecznych tego miejsca	2017	1 168 560 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-

W granicach podobszaru Janów - Nikiszowiec przewidziano do realizacji **7 projektów (3 miejskie i 4 pozamiejskie)**.

W zakresie projektów miejskich **zakończono realizację 1 projektu, a 2 projekty są w trakcie realizacji**.

Podmioty zewnętrzne, które zgłosiły swoje projekty do ujęcia w LPR w podobszarze, nie odesłały informacji sprawozdawczej.

1.6.3 Projekty pozostałe realizowane w podobszarze

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto i inne podmioty we współpracy z Miastem, ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk i wielowymiarową odnowę podobszaru Janów - Nikiszowiec, w latach 2016-2017 zrealizowano w ramach:

- **projektów inwestycyjnych i remontowych realizowanych w ramach Programu Zadań Społeczno - Gospodarczych Miasta Katowice przez Zakład Zieleni Miejskiej:** fontannę na skwerze Rybka (2016), przez **Wydział Promocji:** Budowę Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu (2017), **przez MOSiR:** prace modernizacyjne na lodowisku Jantor (2017)
- **przedsięwzięć „oddolnych”:**
 1. Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 21 przy ul. Zamkowej 45 (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2016),
 2. Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 (Budżet Obywatelski, ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 53, 2016),
 3. Festiwal Muzyczny Artystów Nieprofesjonalnych "Na klepisku" - Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru (Małe Granty, Wydział Kultury, 2016),
 4. Róże Nikiszowca - prace konserwatorskie polegające na renowacji zabytkowej mozaiki ceramicznej usytuowanej na fasadzie budynku przy Placu Wyzwolenia 4 (Budżet Obywatelski, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 2017),
 5. Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii 21 w MBP (Budżet Obywatelski, Wydział Kultury, 2017),
 6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Szopienickiej 21, 23, 25 (Budżet Obywatelski, Zakład Zieleni Miejskiej, 2017)


Dodatkowo:

- W podobszarze funkcjonowała 1 miejska automatyczna stacja wypożyczenia rowerów: "Nikiszowiec Lodowisko Jantor".

2. Informacja sprawozdawcza z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w podobszarach występowania problemów przestrzennych

2.1 Podobszar Zawodzie – Porcelanowa

Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa

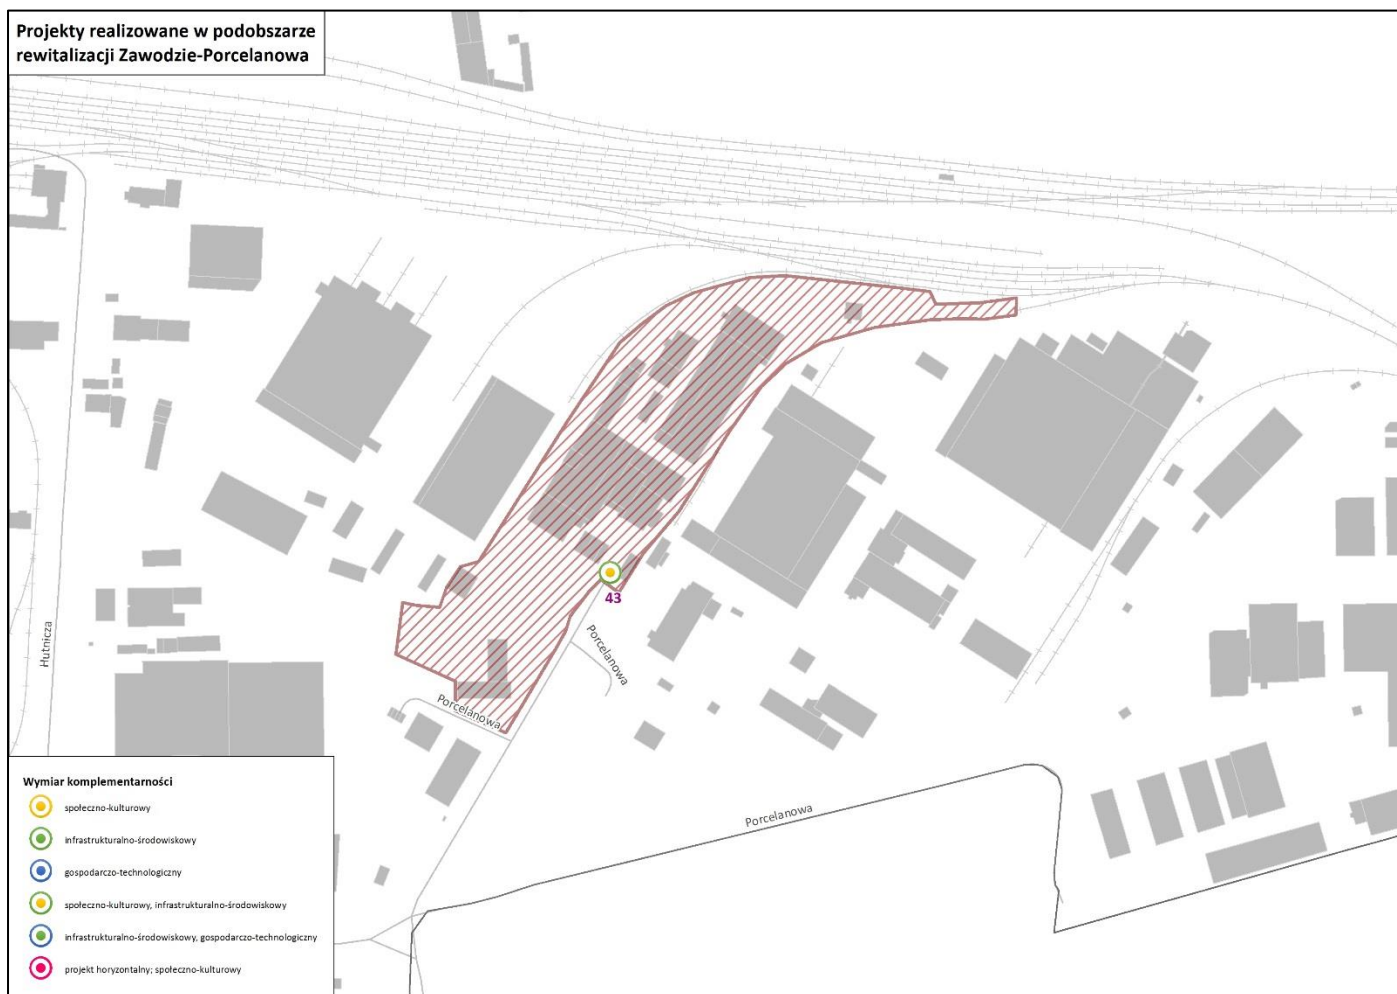

W podobszarze inwestor Fundacja Giesche na lata 2016-2019 zaplanował realizację projektu pn. **Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo - Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu.** Inwestor stara się o dofinansowanie unijne dla realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 7 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)


* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
43	Fundacja Giesche Adaptacja budynków Fabryki Porcelany w Katowicach na budynki biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach wraz z rozbudową Klastra Innowacyjności i Dizajnu	2016-2019	15 000 000 zł	W roku 2016 trwały prace nad korektą wniosku o dofinansowanie, przed jego ponownym złożeniem. W marcu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie, projekt nie uzyskał pozytywnej oceny. W roku 2018 planowane jest złożenie po raz kolejny wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano ok. 20 000 zł netto z środków własnych na porządkowanie i zabezpieczenie budynków przeznaczonych do rewitalizacji.	P

2.2 Podobszar Dąb – Baildona

Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Dąb-Baildona

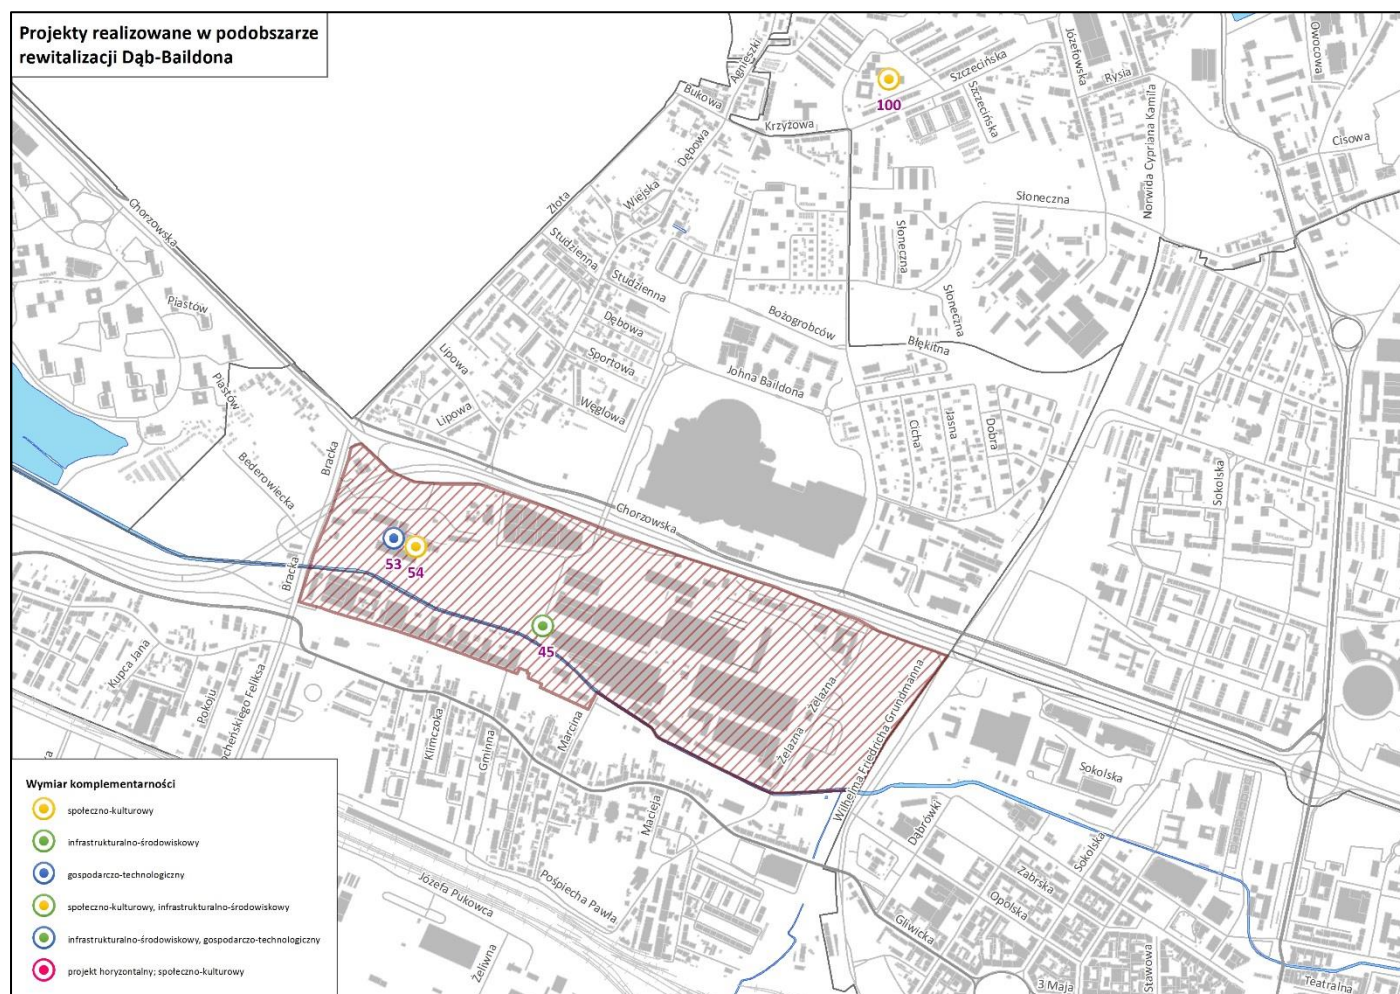

Łącznie w obrębie podobszaru w LPR ujęto 3 projekty. Głównym podmiotem realizującym działania rewitalizacyjne w tym obszarze miasta jest firma Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A., która kontynuuje zapoczątkowany wiele lat temu proces ożywienia tego terenu i planuje zrealizować w kolejnych latach 2 przedsięwzięcia rewitalizacyjne (projekt twardy i miękki). Miasto w podobszarze zakończyło zadanie dot. przedłużenia J. Baildona.

Dodatkowo, w ramach kategorii projektów pozostałych zrealizowanych w 2016r. w podobszarze Dąb – Baildona, uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVIII/585/16 z dnia 27.07.2016r., przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach. Znajduje się tu także stacja automatycznych wypożyczalni rowerów: "Silesia Business Park". Ponadto, inwestor zewnętrzny zrealizował budowę tunelu aerodynamicznego Flyspot.

Na terenie jednostki pomocniczej Dąb Miasto w roku 2017 zakończyło realizację Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! oraz jego kontynuacja w ramach projektu pn. Damy radę!) - jego realizacja przyczyniła się do poprawy sytuacji społecznej w dzielnicy stanowiącej część obszaru zdegradowanego, w zakresie problemów związanych z rynkiem pracy oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 8 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
45	Miasto Katowice Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	2015-2016	2 513 218 zł	Projekt zakończony w 2016 r. Obejmował realizację drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Z
53	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Baildon ¹⁷	2018-2023	180 000 000 zł	W latach 2016-2017 projekt pozostawał na etapie przygotowania poszczególnych inwestycji w ramach środków własnych Inwestora. Wnioskodawca oczekuje na uruchomienie zwrotnych mechanizmów finansowych w ramach środków unijnych i RPO WSL 2014-2020.	P
54	Maksimum Spółka z o.o. Holding S.K.A Program inkubowania i akceleracji aktywności społecznej i zawodowej lokalnej społeczności na terenie Nowego Baildonu	2019-2021	1 000 000 zł	Aktualnie inwestor realizuje pewne działania w ramach projektu ze środków własnych. W roku 2017 wykonano następujący zakres rzeczowy: udostępnienie powierzchni do pracy dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego odbiorcy, realizacja szkoleń, konferencji i warsztatów wspierających inkubację i akcelerację przedsięwzięć biznesowych odbiorców programu, udostępnienie strefy coworkingowej, realizacja usług doradczych o charakterze biznesowym dla zainteresowanych odbiorców programu, wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności biznesowej, wsparcie integracji i rozwoju lokalnej społeczności, szczególnie w obszarze aktywności zawodowej.	R
100 18	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	Projekt polegał na pracy ze społecznością lokalną w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieraniu procesu reintegracji zawodowej uczestników. Obejmował organizację spotkań i szkoleń animacyjnych, treningów umiejętności społecznych, lokalnych imprez integracyjnych oraz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych,	Z


¹⁷ Pierwotna nazwa projektu: „Rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita-Park” w dzielnicy Załęże w Katowicach na terenach po byłej Hucie Baildon”.

¹⁸ Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017
				korzystania ze wsparcia animatora lokalnego, zaplanowania i realizacji w grupie różnych inicjatyw. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

2.3 Podobszar Kolonia Alfred

Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred

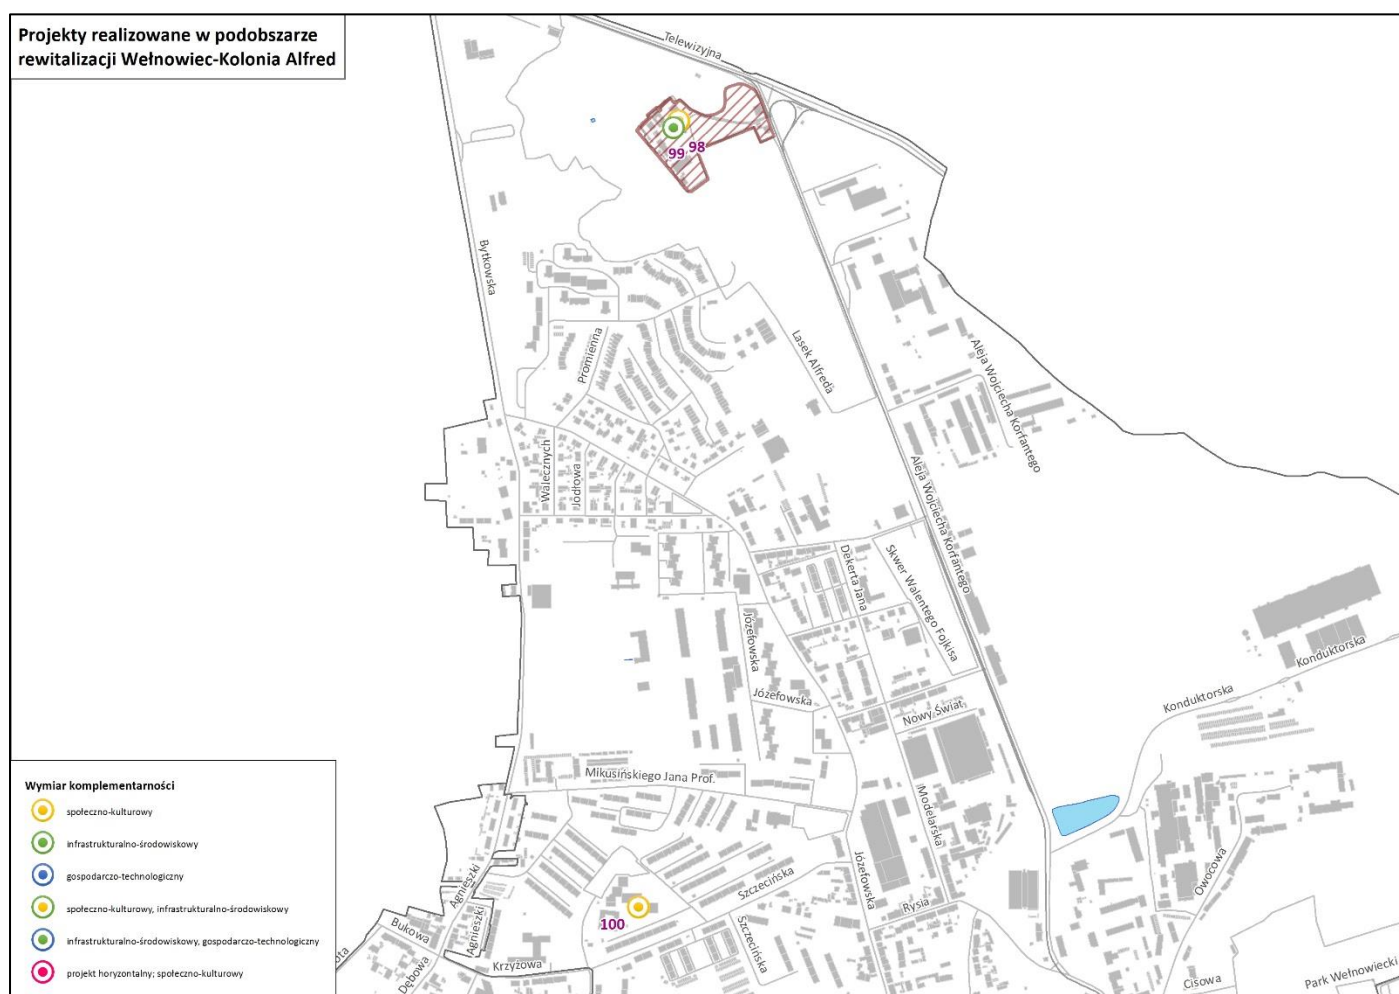

W podobszarze Kolonia Alfred zaplanowano **2** komplementarne względem siebie **projekty** zgłoszone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” mające na celu utworzenie Centrum Społecznościowego (**działania inwestycyjne oraz projekt miękkie**).

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto w roku 2017 zakończyło realizację Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! oraz jego kontynuacja w ramach projektu pn. Damy radę!) - jego realizacja przyczyniła się do poprawy sytuacji społecznej w dzielnicy stanowiącej część obszaru zdegradowanego, w zakresie problemów związanych z rynkiem pracy oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 9 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
98	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach - program działań na rzecz włączenia społecznego	2018-2020	800 000 zł	Projekt planowany do realizacji. Wszelkie działania społeczne wchodzące w zakres projektu będą mogły być prowadzone po zakończeniu działań inwestycyjnych.	P
99	Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” Centrum Społecznościowe "Wioska serca im. Jana Pawła II" w Katowicach – działania inwestycyjne	2016-2018	1 400 000 zł	W roku 2017 zakończono termomodernizację budynku przy ul. Alfreda 3, w którym wykonano następujący zakres prac: docieplenia (podłogi na gruncie, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych od wewnątrz, stropu nad ostatnią kondygnacją), wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; instalacja ogrzewania podłogowego – zakup i montaż oraz roboty elektryczne, zakup i montaż pompy ciepła oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, prace konserwatorskie, tj. odnowienie elewacji budynku, odnowienie pokrycia dachu budynku, rynien i rur spustowych, zakup i montaż instalacji odgromowej. Wydatki poniesione na realizację projektu (od początku realizacji do dnia 31.12.2017r.) na prace termomodernizacyjne to 256 340 zł brutto ogółem (środki własne: 85 786 zł, pożyczka WFOŚiGW: 156 495 zł, dotacja WFOŚiGW: 14 059 zł), z kolei nakłady inwestycyjne poniesione na prace konserwatorskie wyniosły 39 905,42 zł ogółem (środki własne: 4 905,42 zł, dotacja: 35 000 zł). Prace budowlane w ramach obiektów Alfreda 4 i 9 zaplanowano na lata następne.	R
100 19	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	Projekt polegał na pracy ze społecznością lokalną w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieraniu procesu reintegracji zawodowej uczestników. Obejmował organizację spotkań i szkoleń animacyjnych, treningów umiejętności społecznych, lokalnych imprez integracyjnych oraz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, korzystania ze wsparcia animatora lokalnego, zaplanowania i realizacji w grupie różnych inicjatyw. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.	Z

¹⁹ Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.4 Podobszar Wełnowiec – Konduktorska

Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska

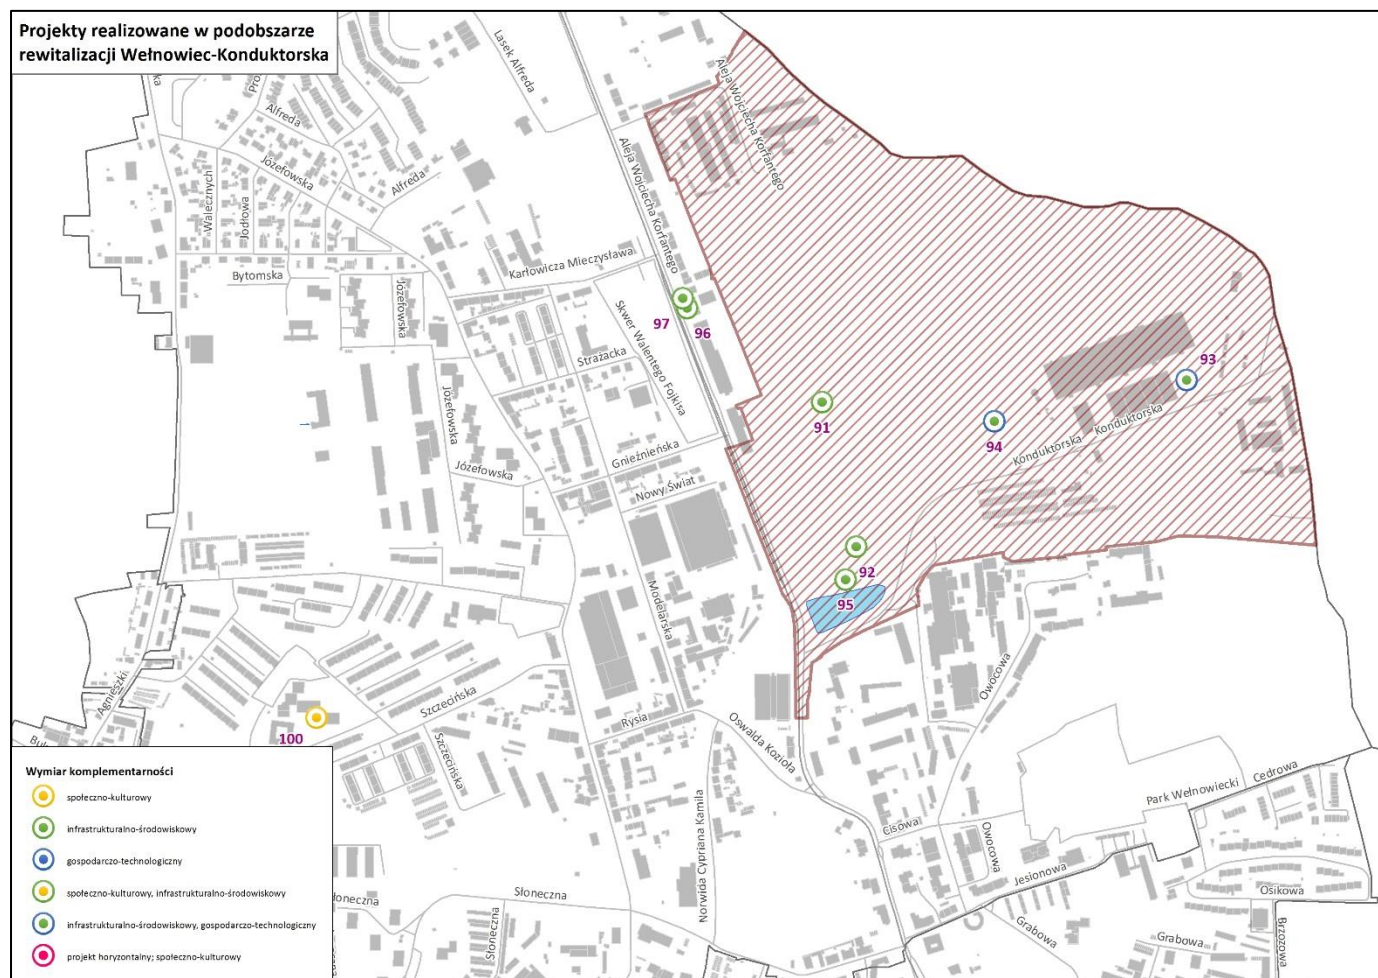


Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 10 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
91	Silesia Nova Sp. z o.o. Rekultywacja i uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2016-2022	13 000 000 zł	<p>W roku 2016 projekt był na etapie uzgodnień zewnętrznych – otrzymano opinię Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w której wskazano na potrzebę przedłożenia aktualnych badań gruntów z obszaru zwałowiska przemysłowego, jak i konieczność dostosowania standardów jakości gleby do planowanego zagospodarowania przedmiotowego obszaru.</p> <p>W związku z powyższym w październiku 2016r. podpisano umowę z firmą EKOID na wykonanie projektu planu remediacji, sporządzenie wniosku do RDOŚ oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie procesu remediacji, co w konsekwencji umożliwi zagospodarowanie terenu zgodnie z planowanymi zapisami MPZP. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu firmie JEMS Architektki z Warszawy.</p>	R

	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
92	EKO BRYZA Sp. z o.o. Rekultywacja i uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz z przekładką linii wysokiego napięcia	2016-2022	19 500 000 zł	W roku 2016 projekt był na etapie uzgodnień zewnętrznych – otrzymano opinię Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w której wskazano na potrzebę przedłożenia aktualnych badań gruntów z obszaru zwałowiska przemysłowego, jak i konieczność dostosowania standardów jakości gleby do planowanego zagospodarowania przedmiotowego obszaru. W związku z powyższym w październiku 2016r. podpisano umowę z firmą EKOID na wykonanie projektu planu remediacji, sporządzenie wniosku do RDOŚ oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie procesu remediacji, co w konsekwencji umożliwi zagospodarowanie terenu zgodnie z planowanymi zapisami MPZP. Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu firmie JEMS Architekci z Warszawy.	R
93	GPP Sp. z o.o. <i>(aktualnie: GPP Business Park S.A.)</i> Budowa plus energetycznego budynku administracyjno-biurowego moduł 4 kompleksu GPP Business Park przy ul. Konduktorskiej w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi i przebudową zjazdu ²⁰	2017-2018	36 000 000 zł	W roku 2017 przygotowano projekt zamienny oraz teren pod budowę.	R
94	GPP Sp. z o.o. <i>(aktualnie: Śląski Park Technologiczny Sp. z o.o.)</i> Budowa plus - energetycznego hotelu wraz z częścią rekreacyjną w postaci Parku i Centrum SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą	2017-2020	70 000 000 zł	W roku 2017 dokonano zakupu nieruchomości, przeprowadzono prace koncepcyjne, doradztwo prawne oraz wystąpiono do Tauron Dystrybucja o wydanie warunków kolizyjnych dla przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Bytków-Chorzów. Rozpoczęto prace projektowe dot. hotelu, obiektu SPA i części parku tematycznego.	P
95	Miasto Katowice Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Korfantego ²¹	2017-2020	27 400 000 zł	W 2017 r. opracowywano dokumentację projektową.	R
96	Przedsiębiorstwo PHU "FEIGA" Remont kapitalny budynku	2016-2020	10 000 000 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
97	Przedsiębiorstwo Handlowe "HERMES" Sp. z o.o. Budowa dwóch budynków usługowo-biurowych z garażem podziemnym z budową infrastruktury technicznej i elementami małej architektury	2016-2020	10 000 000 zł	W roku 2017 wykonano oraz zatwierdzono projekt rozbiórki budynków gospodarczych, budynki są wyburzone, trwają prace przygotowawcze terenu pod budowę.	R

²⁰ Pierwotna nazwa projektu: „Budynek administracyjnobiurowy - moduł 4, należący do kompleksu budynków GPP przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach, wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, przebudową zjazdu”.

²¹ Pierwotna nazwa projektu: „Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej”.

	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
100 22	Miasto Katowice (MOPS) Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)	2015-2017	321 806 zł	Projekt polegał na pracy ze społecznością lokalną w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieraniu procesu reintegracji zawodowej uczestników. Obejmował organizację spotkań i szkoleń animacyjnych, treningów umiejętności społecznych, lokalnych imprez integracyjnych oraz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, korzystania ze wsparcia animatora lokalnego, zaplanowania i realizacji w grupie różnych inicjatyw. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.	Z

W granicach podobszaru przewidziano do realizacji łącznie **7 projektów**, w tym **1 miejski i 6 pozamiejskich**. Spośród nich **5 znajduje się w trakcie realizacji**, a **1 planuje się realizować w kolejnych latach**. W zakresie 1 projektu zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną, brak jest informacji zwrotnej ze strony inwestora.


Dodatkowo, w ramach kategorii projektów pozostałych zrealizowanych przez Miasto w 2016r. w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska, uruchomiono sponsorowaną stację automatycznych wypożyczalni rowerów: „GPP Business Park”.

Ponadto, na terenie jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec Miasto w roku 2017 zakończyło realizację Programu Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (w ramach projektu pn. Włącz się! oraz jego kontynuacja w ramach projektu pn. Damy radę!) - jego realizacja przyczyniła się do poprawy sytuacji społecznej w dzielnicy stanowiącej część obszaru zdegradowanego, w zakresie problemów związanych z rynkiem pracy oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

²² Projekt wyszczególniono w tabeli i wskazano na mapie, gdyż administracyjnie dotyczy jednostek pomocniczych: Wełnowiec – Józefowiec i Dąb, i jest dedykowany ich mieszkańcom. Projektu nie wlicza się jednak do liczby projektów realizowanych w podobszarze - zaklasyfikowanym jako podobszar występowania problemów przestrzennych.

2.5 Podobszar Szopienice - Woźniaka

Rysunek 11. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka

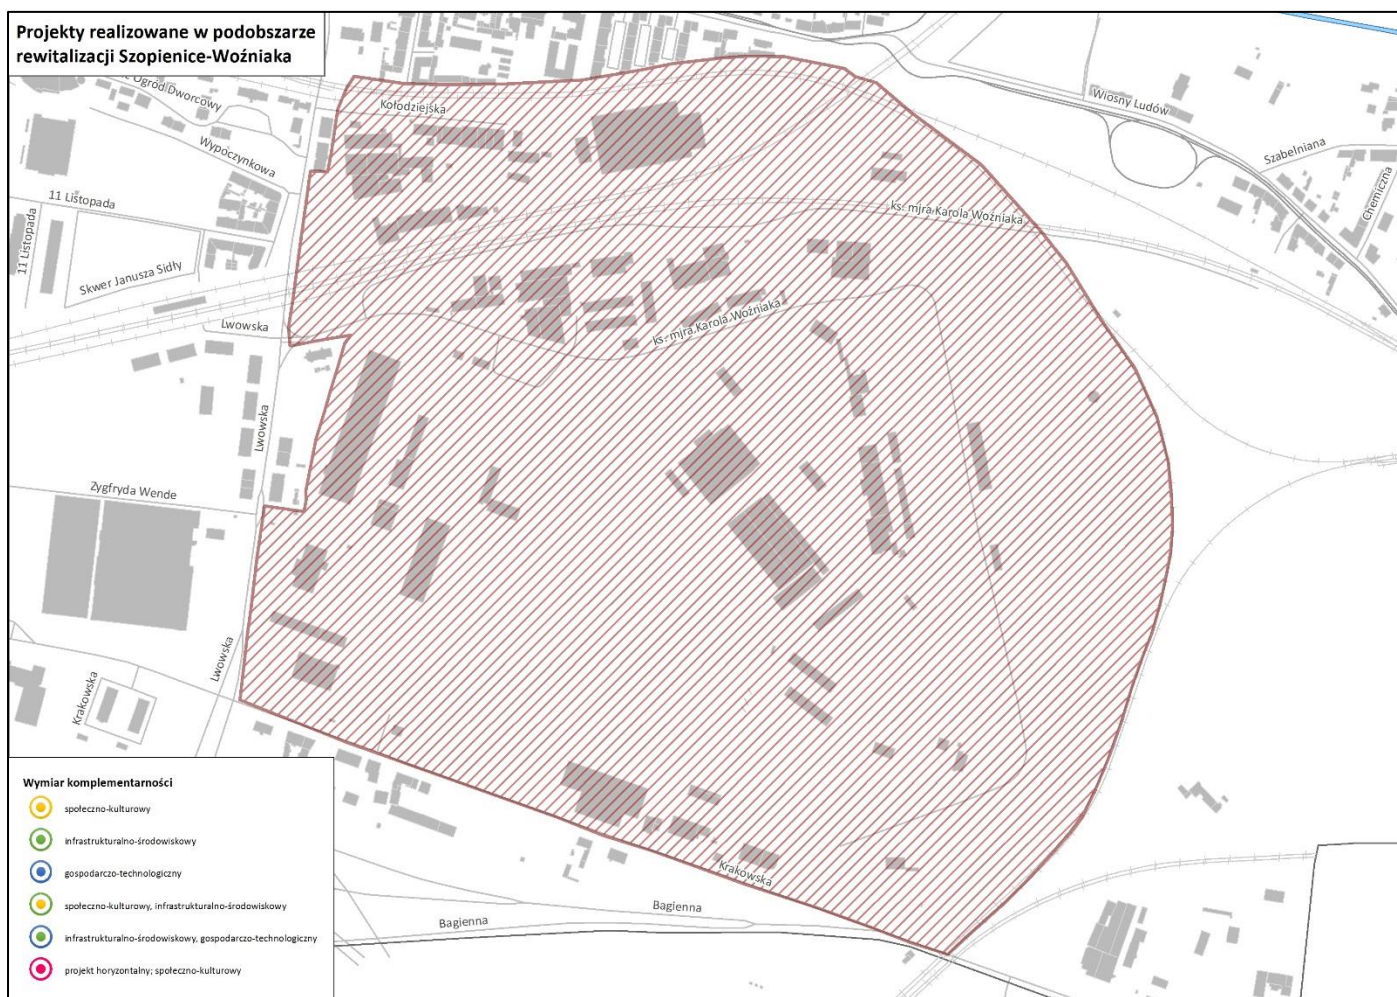

Miasto Katowice w 2015 roku w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta „Katowice 2030” określiło dla tego terenu nową funkcję polegającą na utworzeniu strefy aktywności gospodarczej. Informacje o przedmiotowym terenie były prezentowane na spotkaniach z inwestorami oraz przesyłane zainteresowanym stronom. Ponadto Miasto Katowice prowadzi bazę danych terenów przemysłowych należących do firm zewnętrznych, w której zawarte są informacje na temat terenów i obiektów pozostających w ofercie do zbycia lub najmu. Wśród nich znajduje się obszar w rejonie ul. Woźniaka należący do Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" w likwidacji. Likwidator sukcesywnie podejmuje próby sprzedaży poszczególnych nieruchomości.

3. Informacja sprawozdawcza z realizacji projektów i polityk horyzontalnych, obejmujących cały obszar Katowic

Projekty tej kategorii obejmują swym zasięgiem obszar całego Miasta, bądź adresowane są do wszystkich jego mieszkańców, choć przy realizacji niektórych z nich, szczególny nacisk kładzie się na poprawę sytuacji w dzielnicach zlokalizowanych w obrębie obszaru zdegradowanego lub poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

W ramach projektów podstawowych ujętych w LPR, do realizacji przewidziano następujące projekty o charakterze horyzontalnym:

Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy

* numeracja projektów odpowiada numeracji na Rysunku 11 oraz numeracji projektów w Zał. 1 do LPR (uchwała nr XLV/856/17 z 27.07.2017)

* projekty miejskie – wg stanu na dzień 31.12.2017; projekty pozamiejskie – na podstawie kart monitoringowych

* oznaczenie symboli: Z – zrealizowane, R – w trakcie realizacji, P – planowane do realizacji

Nr	Projekt	Lata realizacji	Wartość szacunkowa	Zakres prac wykonanych w ramach projektu w latach 2016 - 2017	
88	Miasto Katowice (MOPS), NGO Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap	2017-2020	3 120 631 zł	W roku 2017 podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu; przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu; realizowano działania promocyjne (plakaty informacyjne); zorganizowano spotkania seniorów w dzielnicy Janów - Nikiszowiec oraz Bogucice; zorganizowano warsztaty oraz spotkania ze specjalistami (dietetykiem, podologiem).	R
	Miasto Katowice (MOPS) Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – II etap	2020-2023	953 407 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
89	Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA Katowice - Ambasadą Niemożliwego	2015-2019	4 741 430 zł	Brak danych – nie odesłano karty monitoringowej.	-
90	Miasto Katowice (MOPS), NGO Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – I etap	2018-2019	1 088 135 zł	Projekt planowany do realizacji.	P
	Miasto Katowice (MOPS) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – II etap	2019-2021	1 271 210 zł	Projekt planowany do realizacji	P
	Miasto Katowice (MOPS) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – III etap	2021-2023	1 271 210 zł	Projekt planowany do realizacji	P

W ramach pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano:

1. Działania horyzontalne w zakresie edukacji:

Realizacja w latach 2016-2017 projektów w ramach programu Erasmus+ (programy sektorowe: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna, Edukacja szkolna – Współpraca na rzecz innowacji

i wymiany dobrych praktyk) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Programy mobilności ponadnarodowej), skierowanych uczniów oraz nauczycieli, celem rozwoju kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń, polegających na współpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie wspólnej realizacji wyznaczonych zadań m.in. w trakcie wzajemnych wizyt. Uczniowie doskonalią kompetencje językowe, poznają kulturę i obyczaje w innych krajach, uczą się współpracy w międzynarodowych grupach. Nauczyciele doskonalią swoje kompetencje językowe, a także poszerzają swoje kwalifikacje dzięki współpracy z zagranicznymi szkołami. W szkołach zawodowych realizacja programu polega przede wszystkim na udziale polskich uczniów w odpowiednich praktykach zawodowych organizowanych przez zagranicznych partnerów, pod opieką polskich opiekunów.

2. Działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu:

- a. "Miejski Plan Adaptacji" (MPA) - dnia 30 grudnia 2016 r. powołano Zespół roboczy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. "Plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców". W 2017 roku w ramach prac nad projektem dokumentu odbywały się spotkania i warsztaty. (Wydział Kształtowania Środowiska)
- b. Automatyczne wypożyczalnie rowerów

Liczba	2016 ROK	2017 ROK
Automatyczne wypożyczalnie rowerów	11	35
miejskie	10	25
sponsorowane	1	10
Suma użytkowników	9 204	20 000
Wypożyczenia	38 217	103 620
Rejestracje nowych użytkowników	6 549	11 000
Wydatki z budżetu Miasta	244 000 zł (66 000 zł w ramach BO)	657 000 zł (405 000 zł w ramach BO)

Zadanie dotyczące uruchomienia sieci automatycznych wypożyczalni rowerów w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. Operatorem systemu wypożyczalni rowerów miejskich był Nextbike Polska Sp. z o.o. Najpopularniejsze stacje City By Bike w 2017 roku to: "Katowice Rynek", "Silesia City Center" i "Murapol Mariacka". Najpopularniejsze trasy: "KTBS - Krasińskiego 14" do "Katowice Rynek", "Katowice Rynek" do "KTBS - Krasińskiego 14", "Ul. Powstańców - Biblioteka Śląska" do "Katowice Rynek", "Silesia City Center" do "Katowice Rynek", "Katowice Rynek" do "Murapol Mariacka".

3. **Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego** realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice, w powiązaniu z Policją i Strażą Miejską, w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2016” (uchwała nr XXI/407/16 z dnia 27 stycznia 2016r.) oraz „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017” (uchwała nr XXXVI/692/17 z dnia 02 lutego 2017r.). Głównym celem programu była poprawa stanu bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu było ograniczenie lub eliminowanie

negatywnych zjawisk i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Duże znaczenie przywiązywano do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw. Zrealizowane działania:

- a. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie lokali gastronomicznych i rozrywkowych, placówek handlowych oraz ich najbliższego otoczenia (dot. głównie nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów regulujących obrót napojami alkoholowymi w sklepach i lokalach gastronomicznych).

LICZBA	2016 ROK	2017 ROK
Kontrole	637	542
Ujawnione nieprawidłowości	29	25

- b. Ograniczenie zjawiska handlu ulicznego prowadzonego bezprawnie (priorytet: Śródmieście). Realizacja zadań w zakresie kontroli handlu ulicznego ukierunkowana była na zminimalizowanie tego zjawiska zarówno w Śródmieściu Katowic, jak i w obrębie targowisk miejskich na terenie całego miasta. W omawianym okresie strażnicy przeprowadzili ogółem 655 kontroli i ujawnili ogółem 148 wykroczeń.

LICZBA	2016 ROK	2017 ROK
Kontrole	359	655
Ujawnione wykroczenia	238	148

- c. Ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej najwięcej wykroczeń z tej kategorii ujawnili na obszarze Śródmieścia Katowic. W pozostałych dzielnicach interwencje z zakresu przestrzegania prawa o ruchu drogowym dotyczyły głównie obszarów, na których skupiona jest znaczna ilość instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej. Strażnicy miejscy podjęli w 2016 roku 15241, a w 2017 roku 16435 interwencji komunikacyjnych.

- d. Ograniczenie zdarzeń zakłócających spokój i porządek w miejscach publicznych, m.in. kontrole miejsc spożywania alkoholu, miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych oraz osób pod wpływem środków odurzających, kontrole w zakresie dużego zadymienia i nieprzyjemnego zapachu

- e. Ograniczenie kradzieży i dewastacji infrastruktury komunalnej i elementów metalowych – kontrole punktów skupu metali kolorowych (38 kontroli w 2016 i 44 kontrole w 2017 roku).

- f. Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych – system monitoringu wizyjnego miasta obejmujący aktualnie 218 kamer, dzięki którym służby mundurowe mogą szybciej reagować na zachowania sprzeczne z prawem, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (z głównym naciskiem na Śródmieście).

- g. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

LICZBA	2016 ROK	2017 ROK
Kolizje, wypadki	6337	6602
Wypadki śmiertelne	15	9

- h. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i ich okolicy – działania prowadzone poprzez:
- realizację programów/akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straż Miejską i Wydział Zarządzania Kryzysowego m.in.: „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”, „Bezpieczny Gimnazjalista”, „Bezpieczna Młodzież”, „Z bajką bezpieczniej”, „Kibicuję Fair Play”, „Nie truj – segreguj – myśl ekologicznie”, „Bezpieczna Wakacje – Bezpieczna Woda”, „Gry terenowe ze Strażą Miejską”, spektakle teatralne „Ogród pełen bajek”
 - spotkania w szkołach (rok 2016: 463 prelekcje, 7864 uczestników; rok 2017: 330 spotkań, 6625 uczestników)
 - realizację programów/akcji z zakresu tematyki p. poz. (Florek w Małej Strażnicy, Turniej wiedzy pożarniczej, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i in.)
 - współpraca i współfinansowanie programów i akcji prewencyjno-profilaktycznych realizowanych przez Komendę Miejską Policji, skierowanych do dzieci i młodzieży („Bezpieczny Maluch”, „Bezpieczna droga do szkoły”) oraz mieszkańców miasta („MOC! Na Ty”, „Bezpieczna Przystań”)
 - Poprawa funkcjonowania i standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (w tym w roku 2016: rozbudowa i modernizacja infrastruktury lokalowej służb porządkowych i ratowniczych oraz zakup wyposażenia usprawniającego funkcjonowanie jednostek, pracę funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców oraz w 2017 roku: termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Katowicach przy ul. Kościuszki 189 oraz zakup wyposażenia usprawniającego funkcjonowanie jednostek, pracę funkcjonariuszy i obsługę mieszkańców)
- i. Edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego poprzez:
- promocję programów profilaktycznych i prewencyjnych (Profilaktyka Rówieśnicza - przeglądy spektakli i spotów profilaktycznych, Turniej Debat Oksfordzkich; Profilaktyka Cyberzagrożeń – Sieć to nie śmietnik; Program dla seniorów „Bezpieczna Przystań”); organizacja i współorganizacja imprez/akcji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (m.in. festyny okolicznościowe).
- 4. Działania z zakresu wspierania inwestorów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji** (opiekun inwestora, tzw. project manager) [Wydział Obsługi Inwestorów]
- 5. Działania w zakresie gospodarki prowadzone przez Miasto Katowice na rzecz pobudzenia gospodarczego** (Wydział Obsługi Inwestorów, w tym we współpracy m.in. z uczelniami wyższymi, PUP, sektorem biznesu)
- a. **„Przedsiębiorcą być”**: szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, we współpracy z Fundacją Tax Care Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości (6 szkoleń w 2016, 7 szkoleń w 2017 roku)

- b. **Bezpłatne konsultacje z doradcami podatkowymi** dedykowane przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych (4 spotkania w 2016, 5 spotkań w 2017 roku)
- c. „Wadium w formie poręczenia - wsparcie dla przedsiębiorców startujących w przetargach” - **seminarium tematyczne** dla przedsiębiorców zorganizowane w 2016 roku, we współpracy ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym oraz Funduszem Górnośląskim (12 uczestników)
- d. **Konferencja tematyczna** „Pozyskiwanie kapitału i wsparcia finansowego dla katowickich firm” zorganizowana w 2016 roku, skierowana do firm działających na terenie Katowic ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w branży nieruchomości, usług oraz nowych technologii (ok. 60 uczestników)
- e. „**Ogrody Przedsiębiorczości**” - **warsztaty** wspierające innowacyjną przedsiębiorczość w regionie. Wsparcie Fundacji Ogrody Przedsiębiorczości w organizacji warsztatów (3 edycje warsztatów w 2016 roku, ok. 250 uczestników)
- f. III i IV edycja programu **Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście** w 2016 i 2017 roku (warsztaty, szkolenia skierowane do młodych przedsiębiorców do 35 roku życia, którzy prowadzą firmę nie dłużej niż trzy lata. Głównym celem Programu był rozwój kompetencji przedstawicieli młodego biznesu)
- g. Konferencja promująca przedsiębiorczość wśród młodzieży zorganizowana w 2016 roku we współpracy z **Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości**. Celem wydarzenia było przedstawienie przedstawicielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Katowicach działalności edukacyjnej Fundacji oraz zapoznanie ich z programami przygotowującymi młodzież do wejścia na rynek pracy i kształtującymi postawy przedsiębiorcze
- h. Aktywna promocja Miasta podczas **European Start-up Days** (2016 i 2017 rok) oraz nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami start-up'ów. Na potrzeby wydarzenia nakręcono film o ekosystemie start-up'owym w Katowicach przy współudziale katowickich start-up'ów
- i. Współorganizacja **VI (2016) i VII (2017) Europejskiego Kongresu MŚP** oraz promocja Miasta na targach Biznes Expo
- j. Współorganizacja w 2016 roku konferencji **School of New Media** nt. marketingu internetowego (1000 uczestników)
- k. **Warsztaty strategiczne** (2016 i 2017 rok) obejmujące tematykę rozwoju gospodarczego Katowic. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele następujących sektorów: nowoczesne usługi biznesowe, ICT i branże kreatywne, medycyna i inżynieria medyczna, zielona gospodarka, MŚP i rzemiosło, przemysł
- l. Prowadzenie w 2016 i 2017 roku działań wzmacniających atrakcyjność katowickich innowacyjnych firm oraz promocja Miasta Katowice w **Dolinie Krzemowej**
- m. **Festiwal Innowacji INnO KATowice** – współorganizacja serii wydarzeń związanych z innowacjami, start-up'ami, przedsiębiorczością i nowymi technologiami - w 2016 i 2017 roku
- n. Organizacja **Dnia Przedsiębiorczości** (17.11.2016 r. oraz 16.11.2017 r.) w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach. Osoby

zainteresowane problematyką przedsiębiorczości mogły skorzystać z porad i pomocy specjalistów z zakresu tworzenia oraz prowadzenia własnej firmy. Prelegentami wydarzenia byli przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Funduszu Górnośląskiego S.A. Doradcy podatkowi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych udzielali porad podatkowych.

- o. Prowadzenie serwisu internetowego msp.katowice.eu (od kwietnia 2016 r.) i **fanpage'a Strefa Innowacji Miasta Katowice** (od października 2016r.) - źródła wiedzy dla katowickich przedsiębiorców m.in. o aktualnych wydarzeniach dedykowanych MŚP w mieście,
- p. Współpraca z licznymi **instytucjami otoczenia biznesu** (m.in.: Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Fundusz Górnośląski, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Śląska Izba Budownictwa),
- q. **Spotkanie start-up'ów** z Wicepremierem i Ministrem Rozwoju i Finansów Mateuszem Morawieckim (04.08.2016r.) – prezentacja katowickich start-up'ów
- r. **Pitching session z Dominikiem Schmidtem** (27.10.2016r.) – prezentacja pomysłów biznesowych 9 śląskich start-up'ów przed przedstawicielem funduszu QTV z Doliny Krzemowej. Zwycięski start-up z Katowic otrzymał bilet lotniczy do Doliny Krzemowej i zapewniono mu udział w Poland Day 2017
- s. **Sesja „Ask Me Anything” na portalu Wykop.pl** (31.10.2016 r.) – możliwość konsultacji firm i start-up'ów zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański z prof. Piotrem Moncarzem, ówczesnym doradcą Prezydenta Miasta Katowice ds. współpracy z Doliną Krzemową
- t. **VII Konferencja ABSL w Katowicach** (27-29.06.2016 r.). Współorganizacja wydarzenia ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL). Konferencja ta rokrocznie gromadzi niemal tysiąc uczestników i jest jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas siódmej edycji konferencji spotkali się przedstawiciele wiodących firm z sektora usług dla biznesu, przedsiębiorstw i organizacji, które wspierają jego rozwój, politycy, samorządowcy, analitycy i liderzy opinii.
- u. Współorganizacja 8 spotkań **„Young Business Silesian Dinner”** mających na celu dzielenie się wiedzą, umiejętnościami. Ich zadaniem było stworzenie warunków do pozyskiwania wartościowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń oraz pozyskania praktycznej wiedzy biznesowej.

6. Działania w zakresie pomocy społecznej oraz programów adresowanych do osób, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące programy z zakresu polityki społecznej, realizowane przez MOPS

- a. „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy” - zadanie realizowane w 2016 roku w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Program skierowany był do rodzin romskich objętych pomocą społeczną i realizowany przez Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice, szkołami oraz przedstawicielami społeczności romskiej. Celem zadania było wyposażenie dzieci romskich w wyprawki szkolne.

- b. „Młodzi podróżnicy w poszukiwaniu źródła dobrego wychowania” - zajęcia realizowane w 2016 roku w ramach konkursu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” przez Świetlicę Specjalistyczną nr 4.
- c. Projekt pozakonkursowy „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowano zadania: Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu, Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu - Józefowcu i Dębie, Program Aktywności Lokalnej w Giszowcu, Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”, Klub Integracji Społecznej, Program Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, „Misja: Bobas”, kontrakty socjalne, w ramach których proponowano m.in usługi asystenta rodziny, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne (lata 2016-2017).
- d. Miejski Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021, adresowany do osób, które ukończyły 60 rok życia. Głównym celem programu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia seniorów, poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiednich form wsparcia (lata 2016-2017).
- e. Program „Aktywni Seniorzy” realizowany od 2014r. i skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia, to program ulg dla seniorów zachęcający do korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej miasta oraz różnorodnych usług. Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku katowickich seniorów (lata 2016-2017).
- f. „Nas Troje i więcej” - program adresowany do rodzin wielodzietnych (bez względu na posiadany przez nie dochód), zastępczych, a także korzystających ze świadczeń MOPS w Katowicach na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Celem programu jest wspieranie ww. rodzin oraz poprawa ich warunków życia, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych (lata 2016-2017).
- g. „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” – celem programu jest wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, wspieranie babć/dziadków będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności wychowawczych, zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla babć/dziadków i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich (lata 2016-2017).
- h. „Program zajęć grupowych dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie”, realizowany od 2010 r. na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we współpracy z Policją i Kuratorską Służbą Sądową. Uczestnicy programu kierowani są do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Policję w ramach prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” (lata 2016-2017).
- i. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 i 2017 (środki MRPIPS) obejmujący refundację kosztów wynagrodzeń dla zatrudnionych w ramach środków gminnych pracowników realizujących zadania z zakresu asysty rodzinnej (16 asystentów w 2016 roku i 19 asystentów w 2017 roku) oraz dofinansowanie kosztów rozwoju sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnianych w powiatach do wsparcia rodzin zastępczych.
- j. „Pomocna dłoń dla rodziny” projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa „Nowy Dom” w Siemianowicach Śląskich, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs. Celem głównym projektu

jest poprawa w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2018 roku funkcjonowania społecznego 137 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 122 kobiet i 15 mężczyzn) tj. osób z rodzin m.in. z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty wsparcia 3 asystentów rodziny, terapeuty, pedagoga i grup wsparcia oraz 82 osób z rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze (w tym 52 kobiet i 30 mężczyzn) oraz udziału w szkoleniach. Od początku realizacji projektu do końca 2017 roku uczestniczyło w nim 158 osób.

- k. „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” obejmujący prowadzenie zajęć grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nakierowanych na zmianę wzorców zachowań oraz monitoring zachowań po ukończeniu programu (2017 rok)

7. Działania w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej prowadzone przez PUP²³, realizowane w ramach: Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021, Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016 i 2017-2021 - Katowice bez barier, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zadań ustawowych urzędu i przedsięwzięć pozaustawowych.

8.1. Miejska Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2021; cel strategiczny „Rynek pracy otwarty dla każdego”:

- a. w zakresie realizacji wspólnych działań instytucji sektora publicznego, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych w latach 2016-2017 PUP współpracował z różnymi podmiotami rynku pracy, w tym w szczególności z pracodawcami lokalnego i chronionego rynku pracy (m.in. organizacja Targów Pracy i spotkań informacyjno – konsultacyjnych) - w dyspozycji urzędu pozostawało: 12840 ofert pracy w roku 2016 [w tym subsydiowanych: 1995 i 1168 dla osób niepełnosprawnych] i 17497 ofert w roku 2017 [w tym 1355 subsydiowanych i 1112 dla osób niepełnosprawnych], instytucjami szkoleniowymi w zakresie kierowania bezrobotnych na szkolenia zawodowe, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (m.in. Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016), Wydziałem Rozwoju Miasta oraz Wydziałem Obsługi Inwestorów UMK (Dni Otwarte dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej firmy), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, którym objęto osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej: [74 osoby w 2016 i 28 osób w 2017 roku]), agencjami zatrudnienia, Izbą Rzemieśniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, Regionalną Izbą Gospodarczą i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo w 2017 roku, w ramach współpracy z WUP oraz agencją zatrudnienia PUP zrealizował projekt zlecenia działań aktywizacyjnych dla 300 osób bezrobotnych z ustalonym II i III profilem pomocy. Urząd uczestniczył również w przygotowaniu Barometru zawodów na rok 2018 na terenie Miasta Katowice (wspólnie w WUP, Izbą

²³ Powiatowy Urząd Pracy w realizacji projektów kierował się zasadą równości w dostępie do świadczonych usług, o której mowa jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy, pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wobec powyższego, podejmowane przez PUP działania skierowane były do wszystkich zarejestrowanych osób bez względu na ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Wydziałem Obsługi Inwestorów UMK). Ponadto urząd na bieżąco współpracował z ośrodkami szkoleniowymi prowadzącymi szkolenia zawodowe dla zarejestrowanych osób w celu zwiększenia ich szans wejścia lub powrotu na rynek pracy.

- b. w zakresie doskonalenia systemu współpracy instytucji i organizacji wspierających adaptację zawodową urząd uczestniczył w okresie sprawozdawczym w spotkaniach warsztatowych Lokalnej Grupy Urbact w ramach projektu „Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”, których celem było opracowanie i realizacja działań służących wizji rozwoju Załęża w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym.
- c. w zakresie wspierania działań sprzyjających rozwojowi usług i instrumentów rynku pracy w mieście, w tym przy wykorzystaniu środków unijnych, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia:
 - osób młodych do 29 roku życia, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) urząd realizował Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)”, w ramach PO WER 2014-2020 (wsparciem objęto 429 osób bezrobotnych w 2016, a 299 w 2017 roku),
 - osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, urząd realizował Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)”, w ramach RPO WSL 2014-2020 (wsparciem objęto 170 bezrobotnych w 2016 i 187 osób bezrobotnych w 2017),
- d. w zakresie wspierania osób planujących założyć własną działalność gospodarczą urząd podejmował w 2017r. działania związane z promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy poprzez: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 271 osób w 2016 i 265 osób w 2017, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 48 w 2016 i 23 w 2017 skierowanych bezrobotnych, współorganizowanie w siedzibie urzędu corocznych Dni Otwartych Przedsiębiorczości, a także przeprowadzenie w 2017 roku przez Fundację TAX CARE bezpłatnego szkolenia pn. „Przedsiębiorcą być” podczas którego zostały omówione zagadnienia dot. finansów w firmie, optymalizacji kosztów, kwestie podatkowe wraz z indywidualnymi konsultacjami z trenerami biznesu.
- e. w ramach diagnozowania zasobów, potrzeb i problemów związanych z bezrobociem na terenie miasta, PUP opracował w 2017 roku monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, w ramach którego przeprowadzono badanie kwestionariuszowe przedsiębiorstw. Wg wyników badań zwiększenie zatrudnienia zadeklarowało: w 2016r. ponad 70% pracodawców, a w 2017 - 33,8% pracodawców; 22% pracodawców w 2016 i 59% pracodawców w 2017 wskazało zatrudnienie na tym samym poziomie, a zmniejszenie zatrudnienia zaplanowało odpowiednio: 2% i 7,2% pracodawców.
- f. w zakresie tworzenia nowych i rozwijania istniejących projektów i programów dla grup defaworyzowanych na rynku pracy, w 2016 roku urząd realizował projekt „Zatrudnienie bez przeszkód” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków wzrostu zatrudnienia ukierunkowanych na trwałe

i długookresowe rozwiązania poprawiające sytuację tych osób. Projekt realizowany był w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

- g. w zakresie rozszerzania współpracy z pracodawcami urząd realizował spotkania bezrobotnych z pracodawcami w ramach giełd pracy (w 2016 r. zorganizowano 139 giełd, w 2017r. - giełd pracy w siedzibie urzędu). PUP w okresie sprawozdawczym organizował także spotkania informacyjne na temat oferowanych form wsparcia oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców i przygotował coroczne Targi Pracy.

Na potrzeby opracowania prognozy zapotrzebowania na zawody i specjalności PUP we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Wydziałem Obsługi Inwestorów UMK uczestniczył w przygotowaniu Barometru zawodów na rok 2018 na terenie Miasta Katowice. Celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki, urząd pracy sfinansował koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W zakresie wzmocnienia aktywności osób niepełnosprawnych w poruszaniu się po rynku pracy urząd realizował w 2016 r. program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier”, a w 2017r. w ramach „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 – Katowice bez barier” oraz wspierał pracodawców z obszaru lokalnego rynku pracy poprzez finansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych, a także zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (ze środków PFRON).

- h. w ramach zwiększenia dostępności instrumentów rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz wzrostu ich potencjału adaptacyjnego w sferze społeczno-zawodowej, liczba bezrobotnych objętych instrumentami rynku pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia, finansowanych ze środków FP, EFS oraz PFRON wyniosła w 2016r. 1.927 osób, a w 2017 r. 1665 osób.

8.2. Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, przedsięwzięcie strategiczne *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych”:*

- a. w zakresie powstania nowych podmiotów w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielono 173 (i 172 w 2017r.) dotacje osobom do 34 roku życia i utworzonych zostało 268 (263 w 2017r.) nowych podmiotów oraz 48 i 16 (2017) miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy. Łącznie wydatki poniesione w 2016r. na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły 5.936.601 zł (środki FP; PO WER, Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia finansowanego ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
- b. w zakresie utworzenia miejsc pracy w ramach udzielonych kosztów doposażenia stanowisk pracy na podstawie umów zawartych z pracodawcami, urząd dokonał refundacji kosztów wyposażenia

lub doposażenia 48 stanowisk pracy na łączną kwotę 1.116.549 zł w 2016 roku i 16 stanowisk pracy na łączną kwotę 384.207,41 zł w 2017 r., finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

8.3. *Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier* oraz *Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 – Katowice bez barier* - działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych:

- a. w zakresie Projektu „Pośrednictwo pracy” zorganizowano 20 giełd pracy w 2016 i 17 giełd w 2017 roku, w których uczestniczyło odpowiednio: 377 osób (90,6% zarejestrowanych niepełnosprawnych) i 160 osób (45,6% spośród ogólnej liczby zarejestrowanych niepełnosprawnych). W wyniku realizacji projektu zatrudnienie podjęło 71,2% w 2016 r. i 79.8% w 2017 r. ogółu niepełnosprawnych zarejestrowanych na koniec grudnia. Źródła finansowania to:
 - FP (55.577 zł w 2016 i 54.146,76 zł w 2017)
 - EFS, POWER 2014-2020: *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II)* (46.805 zł) i *(III)* 23.317,16 zł oraz *Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)* (7.644 zł) i *(III)* 22.249,73 zł
 - PFRON (412.812 zł w 2016 i 390.000 zł w 2017)
- b. w zakresie Projektu „Poradnictwo zawodowe” usługami poradnictwa objęto ogółem 29 osób niepełnosprawnych w 2016 i 16 osób niepełnosprawnych w 2017r.
- c. Projekt „Szkolenia dla zarejestrowanych osób niepełnosprawnych” – w trybie indywidualnym przeszkolono 1 osobę w 2016 r. i 1 osobę w 2017 r., w ramach środków z Funduszu Pracy: 12.894,86 zł w 2016; 773,61 zł w 2017 roku.
- d. w zakresie Projektu „Instrumenty rynku pracy” przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej: 6 osobom niepełnosprawnym w 2016 r. (środki FP, EFS, PFRON) i 2 osobom w 2017 r. (środki PFRON) oraz dokonano refundacji kosztów wyposażenia: 8 (w 2016 r.) i 7 (w 2017 r.) stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej.
- e. w zakresie Projektu „Zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy” w 2016 r. wydatkowano 13.817 zł na zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia dwóch asystentów osób niepełnosprawnych (środki PFRON); w 2017 r. natomiast do urzędu pracy nie wpłynęły wnioski pracodawców w tym zakresie.

9. **Działania promocyjne w zakresie promocji turystyki biznesowej** (Wydział Promocji, Convention Bureau Katowice) tj. m.in. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania kongresów, konferencji, targów, wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych dla Katowic. Działania te skupiają się przede wszystkim na terenie Strefy Kultury.

LICZBA	2016 ROK	2017 ROK
Liczba wydarzeń biznesowych w tym trwających 2 dni lub więcej	6317 21%	6334 ponad 25%
Liczba uczestników wydarzeń biznesowych	762 tys.	827 tys.

Liczba spotkań konferencyjnych i biznesowych w MCK	220 (530 tys. uczestników)	232 (533 tys. uczestników)
Całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych	116 mln zł	140 mln zł
Średni czas trwania konferencji i innych wydarzeń biznesowych	1,26 dnia	1,32 dnia

Jak wynika z raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2017 roku”, rok 2017 był kolejnym wyjątkowym okresem dla rozwoju przemysłu spotkań w Katowicach. W mieście pojawili się nowi inwestorzy z różnych sektorów gospodarki, w tym także na rynku hotelarskim, zwiększyła się liczba odwiedzających miasto uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. W 2017 roku zorganizowano w Katowicach m.in. kolejną edycję Intel Extreme Masters, Europejski Kongres Gospodarczy, Międzynarodowe Targi Górnicztwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego czy Targi Muzyki Świata WOMEX. Intel Extreme Masters – międzynarodowe targi gier komputerowych i oprogramowania - to największe wydarzenie biznesowe w roku 2017. Podczas dwóch weekendów przestrzeń Spodka i MCK odwiedziło ponad 173 tys. osób. Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym w 2017 roku był Europejski Kongres Gospodarczy. Podczas 3 dni Kongresu odbyły się 132 sesje, a całe wydarzenie odwiedziło ponad 9 000 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2017 roku nastąpił ponad 8% wzrost liczby uczestników wydarzeń biznesowych – do Katowic przyjechało ok. 65 tys. więcej osób. Aktualnie Katowice dysponują 22 hotelami (dwa więcej niż w roku poprzednim) z 4360 miejscami hotelowymi (wzrost o 920 miejsc hotelowych). Warto także, wspomnieć, że uczestnicy wydarzeń jednodniowych odbywających się w mieście wydarzeń „zostawiają” w Katowicach 141 zł, a korzystający z noclegu blisko 628 zł.

Turystyka biznesowa stała się istotnym produktem miasta, który oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz ważnym elementem promocji zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych. Organizacja imprez cyklicznych o randze międzynarodowej np. IEM czy EKG przekłada się w sposób bezpośredni na wzrost rozpoznawalności marki Miasta. Istotnym czynnikiem sukcesu jest ogromny potencjał oddanego do użytku w 2015 r. Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), który ze Spodkiem tworzy największą przestrzeń konferencyjną w Polsce. Warto jednak pamiętać, że z rozwijające się poprzez turystykę biznesową podmioty usługowe oraz infrastruktura wzbogacają ofertę dostępną, nie tylko do odwiedzających, a również dla mieszkańców Miasta.

4. Szczegółowa informacja sprawozdawcza dot. realizacji miejskich projektów podstawowych w okresie 2016-2017

W celu uzyskania bardziej czytelnej i szczegółowej prezentacji postępów realizacji miejskich projektów podstawowych, informację w tym zakresie przedstawiono w formie fiszek projektowych. W rozdziale ujęto wyłącznie fiszki projektów, których realizacja obejmowała zakresem lata 2016-2017. Kolejność oraz numeracja projektów jest zgodna z załącznikiem do uchwały nr XLV/856/17 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”.

KATOWICE, MIASTO OTWARTE - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE – ADAPTACJA NA POTRZEBY ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 43

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE/MOPS

LATA REALIZACJI

2015 - 2018

LOKALIZACJA

UL. FRANCUSKA 43

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje przebudowę budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socialnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. W sierpniu 2016 roku rozpoczęto prace budowlane.

2017

Zgodnie z zawartą umową trwały roboty budowlane oraz realizacja usług nadzoru autorskiego i branżowego w specjalności teletechnicznej. Rozpoczęto rozliczenia i procedurę odbiorową.

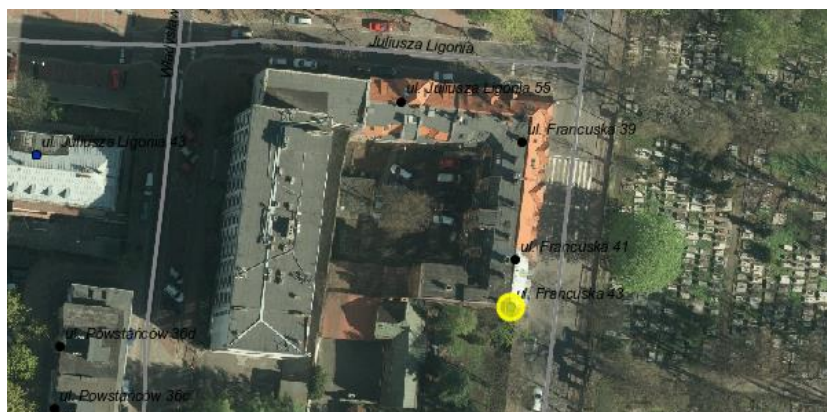

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	110 659	5 350 391	6 639 522
Fundusze strukturalne	92 213	4 325 116	5 391 306
Pozostałe środki krajowe	18 446	1 025 275	1 248 216

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	4 075 501	1 741 937	406 583,29
Fundusze strukturalne	3 464 176	1 419 562	343 606,29
Pozostałe środki krajowe	611 325	322 375	62 977,00
2017	5 889 527	3 560 464	3 516 088,36
Fundusze strukturalne	4 764 107	2 940 567	2 930 801,00
Pozostałe środki krajowe	1 125 420	619 897	585 287,36
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	4 033 330,65

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Katowice,-miasto-otwarte-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-inwestycyjne-%E2%80%93-adaptacja-na-potrzeby-organizacji-us%C5%82ug-spo%C5%82ecznych-i-%C5%9Brodowiskowych-dl.aspx>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent miękki)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2017

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15
UL. MARCINKOWSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu było zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w Żłobku. Projekt obejmuje utworzenie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków, bieżące funkcjonowanie w związku z otwarciem dwóch nowych oddziałów i grup żłobkowych w których opieką objęto 140 dzieci oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

2017

Poniesiono wydatki na utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	5 581	2 931 128	2 751 138
Fundusze strukturalne	0	2 384 485	2 200 254
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	84 158	77 657
Pozostałe środki krajowe	5 581	462 486	473 227

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	1 685 367	1 807 304	1 196 840,39
Fundusze strukturalne	1 356 735	1 384 939	945 173,53
Dotacje stanowiące wkład krajowy	47 884	48 880	33 359,06
Pozostałe środki krajowe	280 748	373 485	218 307,80
2017	1 728 707	2 339 170	1 548 716,34
Fundusze strukturalne	1 439 311	1 879 076	1 255 080,18
Dotacje stanowiące wkład krajowy	50 799	66 319	44 296,97
Pozostałe środki krajowe	238 597	393 775	249 339,19
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	2 751 137,73

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/%C5%BB%C5%82obek-szans%C4%85-na-rozw%C3%B3j-dziecka-i-aktywno%C5%9B%C4%87-zawodow%C4%85-rodzic%C3%B3w.aspx>

ŻŁOBEK SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECKA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW (komponent twardy)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2017

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15
UL. MARCINKOWSKIEGO 13

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu było zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych, nowych miejsc w żłobku. Projekt obejmuje utworzenie dwóch nowych oddziałów żłobka miejskiego w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wykonano adaptację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 6 i 19 na pomieszczenia żłobka oraz dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenia. Opracowano Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla żłobków wraz z wyposażeniem oraz program funkcjonalno-użytkowy żłobków. Ponadto zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu.

2017

Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac zabaw, plac gospodarczy, ciąg pieszo - jezdny, wiatę śmietnikową, nasadzone krzewy. Na terenie żłobka miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 wydzielono teren zabaw ogrodzeniem wewnętrznym, wykonano plac manewrowy wraz z placem gospodarczym, plac zabaw, nasadzone krzewy.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	105 374	2 558 450	2 836 084
Fundusze strukturalne	0	771 079	771 079
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	27 215	27 214
Pozostałe środki krajowe	105 374	1 760 156	2 037 791

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	2 614 663	2 873 642	2 453 075,57
Fundusze strukturalne	981 194	883 882	771 078,78
Dotacje stanowiące wkład krajowy	34 631	31 197	27 214,55
Pozostałe środki krajowe	1 598 838	1 958 563	1 654 782,24
2017	0	420 567	277 635,20
Fundusze strukturalne	0	112 803	0
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	3 983	0
Pozostałe środki krajowe	0	303 781	277 635,20
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	2 836 084,77

REMONT I MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW DYDAKTYCZNYCH I PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚLĄSKIE TECHNICZNE
ZAKŁADY NAUKOWE

LATA REALIZACJI

2015 - 2018

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Projekt jest skierowany do grupy docelowej, którą stanowią uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Grupa liczy ok. 800 uczniów w skali roku szkolnego. Realizacja przedmiotowej inwestycji wynika bezpośrednio z potrzeby projektu pn. „SOS Szkolenia Otwartych Szans”, realizowanego przez ŚZTN w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Rozliczono umowę na wykonanie projektu budowlanego po wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej, zakupiono frezarki CNC oraz dwie tokarki numeryczne, dostosowano budynek do przepisów p.poż. oraz osób niepełnosprawnych.

2017

Wykonano remont dachu oraz sal m.in.: wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową i okienną, wykonano tynki, instalacje elektryczne. Zamówiono obrabiarki CNC.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	110 700	3 906 271	3 753 211
Fundusze strukturalne	97 613	2 689 119	2 485 733
Pozostałe środki krajowe	13 087	1 217 152	1 267 478

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	2 281 815	783 960	45 510,00
Fundusze strukturalne	1 939 542	541 761	0
Pozostałe środki krajowe	342 273	242 199	45 510,00
2017	3 750 061	2 179 604	1 242 583,52
Fundusze strukturalne	2 591 506	1 506 230	858 695,93
Pozostałe środki krajowe	1 158 555	673 374	383 887,59
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	1 398 793,52

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

PODMIOT REALIZUJĄCY

ŚTZN / MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2018

LOKALIZACJA

UL. SOKOLSKA 26

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OBSZAR ZDEGRADOWANY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, jak również poprzez poprawę wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych, kursów, praktyk i staży uwzględniających specyficzne potrzeby firm. Zawody, w jakich kształcą się uczniowie, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu to: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik energetyk.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Rzeczową realizację zadania przesunięto na rok 2017 z uwagi na ścisłe powiązanie z projektem twardym pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego".

2017

Zrealizowano zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 60 uczniów; zakończono szkolenie pierwszej grupy uczniów (11 osób) AutoCAD - podstawa; zakupiono 17 zestawów komputerowych, projektor i ekran projekcyjny do przeprowadzenia szkolenia AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor; zrealizowano szkolenia z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli i 36 uczniów; zakupiono meble do pracowni AutoCAD; wybrano wykonawcę na wykonanie instalacji stanowiskowej elektrycznej i teleinformatycznej.

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	487 586	410 859
Fundusze strukturalne	386 805	341 102
Dotacje stanowiące wkład krajowy	45 507	40 168
Pozostałe środki krajowe	55 274	29 588

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	175 654	215 054	0
Fundusze strukturalne	149 306	159 759	0
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	18 795	0
Pozostałe środki krajowe	26 348	36 500	0
2017	344 023	559 077	267 295,63
Fundusze strukturalne	269 247	429 006	223 544,20
Dotacje stanowiące wkład krajowy	31 676	50 471	26 337,06
Pozostałe środki krajowe	43 100	79 600	17 414,37
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	267 295,63

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZŁ „SĄDOWA”

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2013, 2015 - 2020

LOKALIZACJA

UL. SĄDOWA

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Węzeł Przesiadkowy „Sądowa” jest elementem większego projektu pn.: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę jednopoziomowego bezobsługowego parkingu naziemnego o pojemności 50 miejsc;
- budowę parkingu dla rowerów oraz budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła;
- budowę zadaszonych wielostanowiskowych peronów przystankowych dla autobusów lokalnych, krajowych, międzynarodowych;
- budowę strefy obsługi podróżnych i operatorów;
- dostosowanie przyległego układu drogowego;
- budowę oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w obrębie projektowanego węzła z uwzględnieniem przejazdu rowerowego oraz budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją;
- zagospodarowanie terenu.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Opracowano model ruchu komunikacyjnego na potrzeby projektów infrastrukturalnych oraz wykonano analizę otrzymanych wyników i na ich podstawie dokonano analizy kosztów i korzyści.

2017

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane; trwały prace komisji przetargowej.



Rysunek 12 Wizualizacja – węzeł Sądowa

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	72 027	59 535 171	59 588 700
Fundusze strukturalne	43 875	34 637 784	34 639 636
Pożyczki i kredyty	0	4 050 000	4 050 000
Pozostałe środki krajowe	28 152	20 847 387	20 899 064

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	10 120 440	458 529	453 630,15
Fundusze strukturalne	8 602 374	264 957	263 103,75
Pożyczki i kredyty	0	0	0
Pozostałe środki krajowe	1 518 066	193 572	190 526,40
2017	4 454 533	2 148	2 146,35
Fundusze strukturalne	2 429 516	997	996,05
Pożyczki i kredyty	2 025 000	0	0
Pozostałe środki krajowe	17	1 151	1 150,30
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	527 803,5

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Katowicki-System-Zintegrowanych-W%C4%99z%C5%82%C3%B3w-Przesiadkowych-%E2%80%93-W%C4%99z%C5%82-S%C4%85dowa.aspx>

PRZEBUDOWA STREFY ŚRÓDMIEJSKIEJ MIASTA KATOWICE

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2005-2018

LOKALIZACJA

ulice: Dworcowa, Tylna Mariacka, Mickiewicza, św. Jana, Korfańtego

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Realizowany od 2005 r. projekt przebudowy strefy śródmiejskiej jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych ujętych w Programie. Kluczowym elementem była prowadzona od 2012 roku przebudowa strefy Rondo-Rynek, w tym przebudowa układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz zagospodarowanie Placu Centralnego. Projekt realizowany jest etapami. Lata 2016-2017 obejmują realizację etapów IV (Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo – Rynek) i V (Przebudowa ulicy Dworcowej).

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Etap IV – trwała realizacja robót z terminem wykonania: 28.02.2017 r. - Trwała realizacja działania dot. „Zaprojektowania i wykonania toalety publicznej na parterze budynku C4 – część wschodnia na Rynku w Katowicach” z terminem wykonania: 28.02.2017 r. Zrealizowano umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego bliźniaczego zadaszania po stronie zewnętrznej wiat przystankowych T1 i T2 - Katowice ul. Korfańtego i ul. Warszawska”.

Etap V - W wyniku przeprowadzonych warsztatów studialno-projektowych wybrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach i urzędzenia ul. Tylnej Mariackiej.

2017

Etap IV – zakończono realizację budynku C4 wraz z utworzeniem toalety publicznej na parterze budynku.

Podpisano umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej zadania „Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek” w zakresie oddziaływania akustycznego zmodernizowanych odcinków dróg i torowisk w Strefie Rondo-Rynek na tereny podlegające ochronie akustycznej. Umowę zrealizowano. Opracowano dokumentację w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części placu centralnego stanowiącego połączenie formalne płaszczyzny placu z budynkiem C4 i częścią rekreacyjną. Wybrano wykonawcę zadania - adaptacja istniejącego projektu budowlano-wykonawczego budowy dwóch wiat w ramach dokumentacji projektowej pn. Projekt zagospodarowania terenu w rejonie północnej części placu centralnego stanowiącego połączenie formalne płaszczyzny placu z budynkiem C4 i częścią rekreacyjną – umowę zrealizowano.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	259 339 466	300 520 075	274 057 944
Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej (2007-2010)	16 415 451	16 415 451	n. d.
Etap II - Strefa Rondo-Rynek (2010-2016)	207 254 736	213 914 300	n. d.
Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie (2010-2015)	26 829 414	26 829 414	n. d.
Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo – Rynek (2015-2016)	745	5 198 512	7 199 745
Etap V - Przebudowa ulicy Dworcowej (2016-2018)	0	29 070 130	n. d.

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	10 050 000	17 408 565	12 180 608,75
2017	3 833 000	454 213	229 212,58
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	271 749 287,33

REWITALIZACJA I PRZYWRÓCENIE MIESZKAŃCOM PODWÓRKA MIĘDZY ULICAMI ADAMSKIEGO I KOSZAROWĄ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

ulice: Adamskiego, Koszarowa

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował realizację zagospodarowania otoczenia budynków przy ul. Koszarowej 8,8a,8b, 8c, 10, 10a,10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f i ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e. Projekt realizowany był w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, poprzedził go szczegółowy proces konsultacyjny, prowadzony w 2014 r.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

W roku 2015 opracowana została dokumentacja techniczna, a w 2016 r. zostały wykonane roboty budowlane w planowanym zakresie. Odbiór robót został dokonany w dniu 08.12.2016r. Wykonana została kanalizacja deszczowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczna. Wymieniona została nawierzchnia drogi dojazdowej wraz z chodnikami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.



Rysunek 15. Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – stan przed.



Rysunek 14. Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – po zrealizowaniu projektu
źródło: KZGM



Rysunek 13. Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – po zrealizowaniu projektu
źródło: KZGM

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016		Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	
OGÓŁEM – środki własne Miasta		48 000		750 000
	Plan na 01.01		Plan na 31.12	Wykonanie
2016	702 000		702 000	702 000,00
		WYKONANIE ŁĄCZNIE		750 000,00

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Konsultacje-Adamskiego.aspx>

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP VI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. UNIWERSYTECKA 15

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną, trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu.

2017

Realizowano roboty budowlane; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu; w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowę na roboty budowlane i zrealizowano ok. 21% wartości jej zakresu.

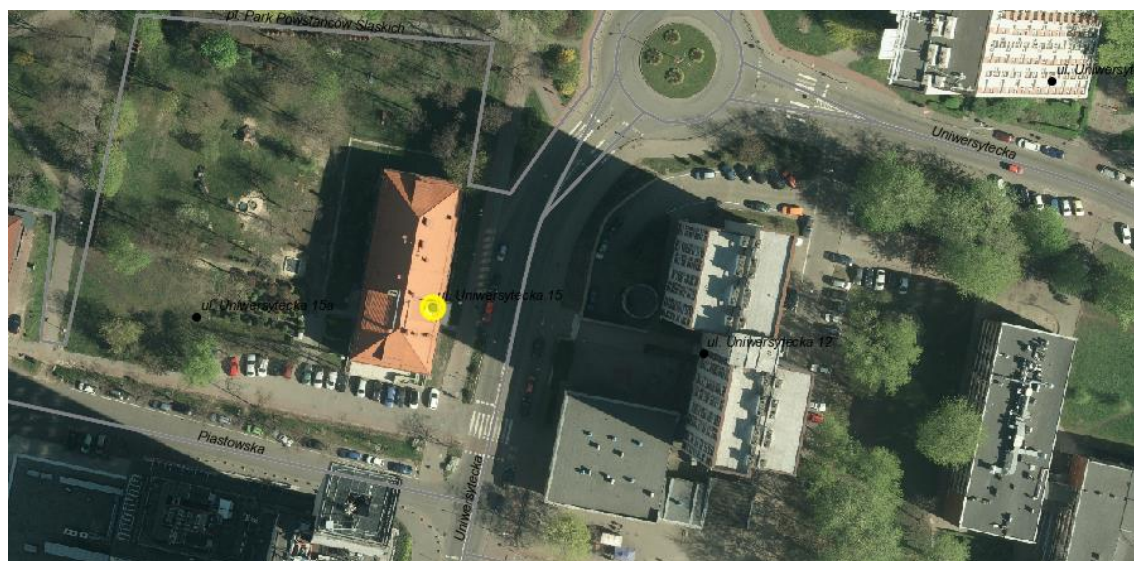

DANE FINANSOWE

Lata	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII	W tym dofinansowanie UE*
2016	1 637 024,00 zł	1 024 491,00 zł
2017	1 637 024,00 zł	1 024 491,00 zł

Lata	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Wydatki narastająco od początku realizacji inwestycji
2016	0,00 zł	1 608 067,00 zł	246,00 zł	29 203,00
2017	1 607 699,00 zł	1 149 108,00 zł	304 161,71 zł	333 364,37
WYKONANIE ŁĄCZNIE				333 364,37

*Wartość szacunkowa

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP III

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. LIGONIA 43

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY


2016

Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne.

2017

Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Unieważniono przetarg nieograniczony w części dot. przedmiotowego obiektu ze względu na brak ofert i ogłoszono kolejny przetarg - prace komisji przetargowej zakończono w dn. 28.12.2017 r.

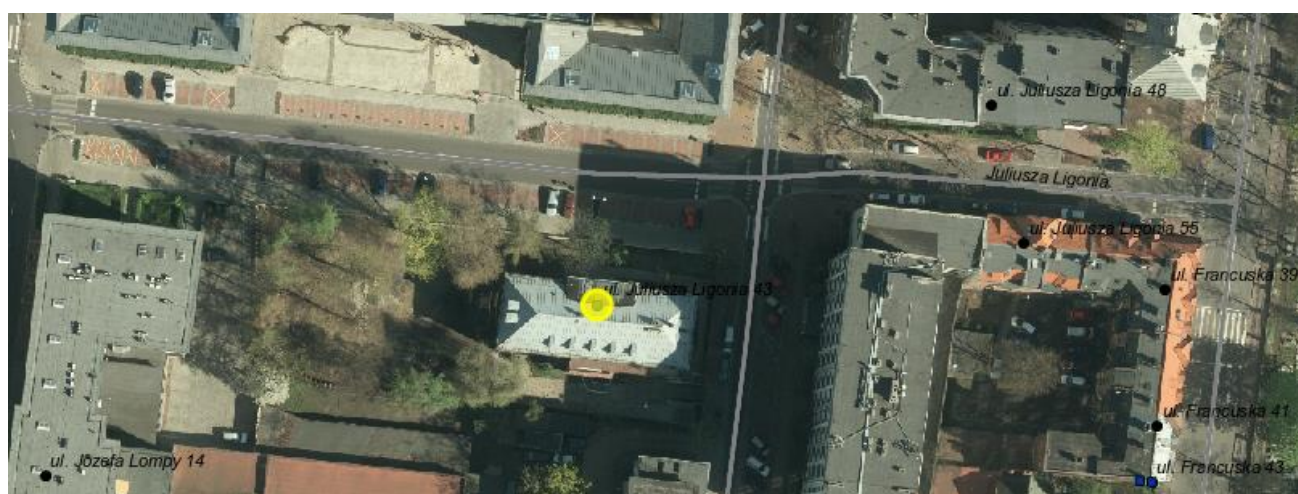

DANE FINANSOWE

Lata	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII	W tym dofinansowanie UE*
2016	1 470 922, 00 zł	827 029,40 zł
2017	1 472 922,00 zł	828 458,00 zł

Lata	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Wydatki narastająco od początku realizacji inwestycji
2016	683 157,57 zł	305,57 zł	246,00 zł	16 031,09
2017	1 458 727,00 zł	444 596,00 zł	1 560,00 zł	17 591,09
WYKONANIE ŁĄCZNI				17 591,09

*Wartość szacunkowa

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP VIII

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2019

LOKALIZACJA

UL. 3 MAJA 42

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC


WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wykonano dokumentację dotyczącą inwentaryzacji architektoniczno - budowlano - instalacyjnej oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu.

2017

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto jej realizację.

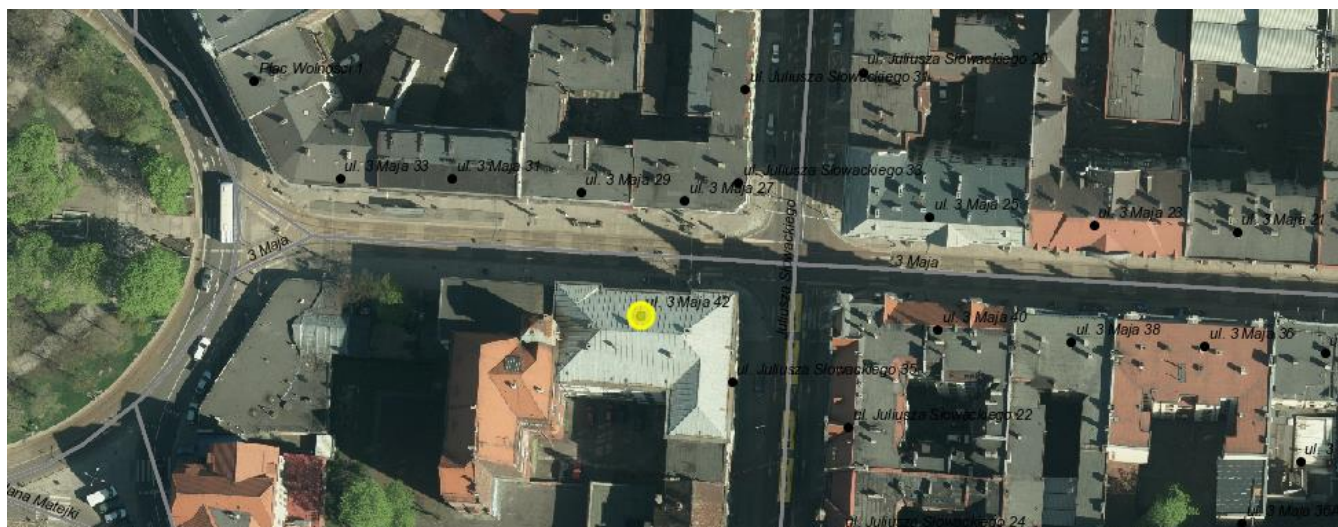

DANE FINANSOWE

Lata	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII	W tym dofinansowanie UE
2016	3 597 684,00 zł	2 768 331,00 zł
2017	3 597 800,00 zł	2 486 284,00 zł

Lata	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Wydatki narastająco od początku realizacji inwestycji
2016	75 000,00 zł	24 000,00 zł	23 883,53 zł	23 883,53 zł
2017	233 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 883,53 zł
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	23 883,53 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP II

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

UL. PLEBISCYTOWA 46

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego.

2017

Podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosku o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu.



DANE FINANSOWE

Lata	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII	W tym dofinansowanie UE
2016	1 844 761,00 zł	1 513 267,00 zł
2017	1 845 446,00 zł	818 517,00 zł

Lata	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Wydatki narastająco od początku realizacji inwestycji
2016	3 300,00 zł	1 847,00 zł	1 846,23 zł	21 178,23
2017	1 097,00 zł	2 021,00 zł	683,33 zł	21 861,56
WYKONANIE ŁĄCZNIE				21 861,56

MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2007-2021

LOKALIZACJA

WIELE

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

W ramach zadania remontowane są budynki mieszkalne i użytkowe, wchodzące w skład miejskiego zasobu nieruchomości, które ze względu na swój stan techniczny oraz walory estetyczne wymagają prac modernizacyjnych.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

✓ BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE

Lokalizacja	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie w 2017 r.
OGÓŁEM				
ul. 3 Maja 36	2 079 645,10	455 077,37	743 637,65	880 930,19
Katowicka 48a, 50	1 986 580,26	1 657 661,00	328 919,26	0,00
Morawa 119a	1 582 423,58	1 554 473,58	27 950,00	0,00
Plebiscytowa 4, 4a	807 768,71	282 195,02	525 573,69	0,00
Mikołowska 11, 13	513 199,18	351 132,74	162 067,18	0,00
Gen. Hallera 28	1 513 370,00	23 370,00	0,00	0,00
Szeligiewicza 3c	1 157 944,73	0,00	61 000,00	298 542,78
Powstańców 7,9	887 182,69	0,00	29 143,62	28 039,08
Gliwicka 148	350 150,20	23 999,76	326 150,44	0,00
PCK 1	4 390 766,35	3 792 084,74	35 393,19	547 037,80
Drzymały 13	474 784,19	0,00	28 659,00	446 125,19
3 Maja 7	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00
Warszawska 6 / Teatralna 9	4 341 975,53	1 518 103,53	20 202,00	13 468,00
Warszawska 42	2 707 865,89	2 529 237,96	0,00	26 027,93
Królowej Jadwigi 6	667 581,38	0,00	26 445,00	237 094,30
Astrów 3/Różana	93 553,48	0,00	14 514,00	79 039,48
Karola 3	4 400 540,00	0,00	113 775,00	6 765,00
Francuska 59, 59a, 59b	86,00	0,00	86,00	0,00
Pl. Powstańców 6,7,8	922 453,50	0,00	22 472,10	14 981,40
Opolska 9b, 9c	729 990,00	0,00	17 994,00	11 996,00

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY		
Lokalizacja	do 2016 r.	2017 r.
ul. 3 Maja 36	Opracowana została dokumentacja techniczna na wzmocnienie stropów, dobudowę pionów kominowych i remont klatek schodowych w oficynach; wzmocniono stropy w budynku; rozpoczęto realizację robót budowlanych w lewej oficynie. Kontynuowano roboty budowlane.	Kontynuowano i zakończono realizację robót budowlanych. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 25.07.2017 r.
Katowicka 48a, 50	Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynków wraz z dobudową przewodów kominowych i wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej; prowadzono realizację robót budowlanych w budynkach. Zadanie zakończone w roku 2016.	n. d.
Morawa 119a	Opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku OSP oraz budowy zjazdu z drogi publicznej, zrealizowano roboty budowlane; zakończone zostały roboty polegające na rekultywacji zieleni na skarpie. Zadanie zakończone w roku 2016.	n. d.
Plebiscytowa 4, 4a	Opracowane zostały dokumentacje techniczne na: - remont dachu, naprawę ścian poddasza, kominów oraz stropów budynku nr 4; - wykonanie rozbiórki z zabezpieczeniem sąsiednich nieruchomości, graniczących z budynkiem 4a; - remont podwórza z przebudową kanalizacji i remontem bramy przejazdowej oraz na przebudowę instalacji gazu w bramie przejazdowej. Zakończono roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto realizację robót polegających na zagospodarowaniu podwórza i rekonstrukcji klatki schodowej i bramy przejazdowej.	Kontynuowano i zakończono realizację robót budowlanych ze środków niewygasających z upływem 2016r.- zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem, remont bramy przejazdowej i klatki schodowej budynku
Mikołowska 11, 13	Opracowana została dokumentacja techniczna na zagospodarowanie podwórzy wraz z budową kanalizacji; rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakończono roboty budowlane. Zadanie zakończone w roku 2016.	n. d.
Gen. Hallera 28	Opracowana została dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wraz z budową sieci kanalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego w otoczeniu budynku.	Realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2021.
Szeligiewicza 3c	Opracowana została dokumentacja techniczna, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Zostało wydane pozwolenie budowlane. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
Powstańców 7,9	n. d.	Została opracowana dokumentacja techniczna na likwidację podziemnej kotłowni, zagospodarowanie podwórza i wykonanie kanalizacji deszczowej.
Gliwicka 148	Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Dom Aniołów Stróżów. Zadanie zakończone w roku 2016	
PKK 1	Opracowana została dokumentacja techniczna na ogrzewanie i remont budynku wraz z przebudową elewacji, wzmocnieniem stropów piwnic i przebudową instalacji kanalizacyjnej, zrealizowane zostały roboty budowlane w budynku użyteczności publicznej.	Zostało wydane pozwolenie budowlane. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji robót budowlanych. Odbiór końcowy robót odbył się 20.12.2017r.
Drzymały 13	Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie remontu kapitalnego dachu, dobudowę przewodów kominowych i rekonstrukcję klatki schodowej, uzyskane zostało pozwolenie budowlane, ogłoszony został przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych.	Rozpoczęto i zakończono realizację robót budowlanych. Odbiór końcowy robót odbył się 27.10.2017r.
3 Maja 7	KZGM wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków w planie WPF na zadaniu wraz z przesunięciem środków na dokumentację techniczną na 2017 r.	Podjęto decyzję o wycofaniu zadania z realizacji.
Warszawska 6 / Teatralna 9	Opracowana została dokumentacja techniczna na ogrzewanie i remont i budynku, zrealizowano roboty budowlane.	Zostało wydane pozwolenie budowlane na wykonanie instalacji c.o. wraz z budową wymiennika ciepła. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie p.poż. budynku wraz z remontem klatek schodowych w budynku przy Teatralnej 9.
Warszawska 42	Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie remontu elewacji wraz z remontem otoczenia budynku.	Została opracowana ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku. KZGM partycypował w kosztach opracowanej przez WOMP dokumentacji na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji c.o. w budynku i budowie instalacji wentylacji w piwnicach oraz kosztach pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Królowej Jadwigi 6	Opracowana została dokumentacja techniczna, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Zostało wydane pozwolenie budowlane. Rozpoczęto realizację robót budowlanych- dobudowa przewodów kominowych, przebudowa wew. instalacji gazowej, c.o.,c.w.u.
Astrów 3/Różana	Opracowana została dokumentacja techniczna, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Zostało wydane pozwolenie budowlane. Rozpoczęto i zakończono realizację robót budowlanych. Odbiór końcowy robót odbył się 21.12.2017r.
Karola 3	Trwało opracowanie dokumentacji technicznej.	Zostało wydane pozwolenie budowlane. Wstrzymano ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych ze względu na niewykwaterowanie wszystkich użytkowników.
Francuska 59, 59a, 59b	Wstrzymano wymianę nawierzchni drogi do czasu wymiany kanalizacji przez KW S.A.; opracowanie dokumentacji technicznej przesunięto na rok 2017.	Brak działań na zadaniu.
Pl. Powstańców 6,7,8	Opracowana została dokumentacja techniczna, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu budowlanym – wniesione zostało odwołanie od decyzji przez właściciela sąsiedniej nieruchomości.
Opolska 9b, 9c	b. d.	Została opracowana dokumentacja na przebudowę lokalu użytkowego na parterze budynku. Wydano pozwolenie budowlane.



Rysunek 16 Modernizacja budynków komunalnych - Morawa 119a (źródło: KZGM)

BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ FITNESS

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. KOSZAROWA
UL. ADAMSKIEGO

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Budowa placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c,12d,12e,12f; ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a, 13b,13c,13d,13e.

PODOBZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015 r. z terminem zakończenia do 25.10.2016 r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 08.12.2016 r.



Rysunek 18 Plac zabaw ze strefą fitness – Koszarowa, Adamskiego



Rysunek 17 Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016
OGÓŁEM	50 000,00	744 098

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	900 000	850 000	694 097,52
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	744 097,52

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE-KOMUNALNE

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM	2009-2017	UL. KORDECKIEGO 3,4; OBROŃCÓW WESTERPLATTE 42-50	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt obejmował budowę obiektów mieszkalnych.</p> <p>W ramach inwestycji przy ul. Kordeckiego 3 i Kordeckiego 4 najpierw wyburzono stare budynki, w miejscu których powstał nowy, funkcjonalny budynek mieszkalny. Obiekt posiada cztery kondygnacje. W każdej z klatek budynku znajduje się po 11 mieszkań, w tym po dwa mieszkania na parterze i po trzy mieszkania na pozostałych trzech kondygnacjach.</p> <p>W ramach inwestycji przy ul. Obrońców Westerplatte - w trzech budynkach usytuowanych jest łącznie 45 lokali mieszkalnych:</p> <p>18 lokali trzypokojowych o powierzchni użytkowej ok. 60 m²,</p> <p>18 lokali dwupokojowych o powierzchni użytkowej ok. 48 m²,</p> <p>9 lokali jednopokojowych o powierzchni użytkowej ok. 40 m².</p>			<p>✓ ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>ZAWODZIE</p> <p>ZAŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>✓ SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

ul. Kordeckiego 3,4 – trwały roboty budowlane. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy w dniu 25.07.2016 r. zaszła konieczność zlecenia dokończenia budowy. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 29.11.2016 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą robót z terminem zakończenia do 09.04.2017 r.

ul. Obr. Westerplatte 42-50 - w wyniku przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016 r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017 r. Z uwagi na konieczność przeprojektowania zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych oraz rzędnych posadowienia 2 budynków, przesunięto część wydatków na 2017 r., niewykorzystanych w 2016 r.

2017

ul. Kordeckiego 3b, 4b - zakończono budowę 22 mieszkań. W dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap - zakończono budowę 45 mieszkań. W dniu 08.11.2017 r. została wydana decyzja na użytkowanie trzech budynków. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	2 791 574 z	14 920 167 zł	11 967 662 zł
Kordeckiego 3,4	2 290 715	3 944 889 zł	3 949 547 zł
Obrońców Westerplatte 42-50	500 859	10 975 277 zł	8 018 115 zł

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	7 350 000,00 zł	6 913 000,00 zł	4 842 396 zł
Kordeckiego 3,4	350 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 505 174 zł
Obrońców Westerplatte 42-50	7 000 000,00 zł	5 313 000 zł	3 338 222 zł
2017	5 700 000 zł	5 700 000 zł	4 333 692 zł
Kordeckiego 3,4	200 000,00 zł	200 000 zł	154 657 zł
Obrońców Westerplatte 42-50	5 500 000 zł	5 500 000 zł	4 179 035 zł
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	11 967 662,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE

<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3739-nowoczesnie-modnie-i-wygodnie>
<http://www.kzgm.katowice.pl/aktualnosci/3762-nowe-mieszkania-nad-rawa>



Rysunek 21. ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki (źródło: KZGM)



Rysunek 20. ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki (źródło: KZGM)



Rysunek 19. ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46 (źródło: KZGM)



Rysunek 23. ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46 (źródło: KZGM)



Rysunek 22. ul. Kordeckiego 3b, 4b – nowe budynki (źródło: KZGM)

BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2022

LOKALIZACJA

UL. MICKIEWICZKA 11

STATUS PROJEKTU

W PRZYGOTOWANIU

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada budowę hali sportowej dla III LO im. A. Mickiewicza.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwało opracowanie wytycznych do projektowania.

2017

W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie ekspertyzy wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę.



Rysunek 24 Budowa hali sportowej - przewidywana lokalizacja

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	0	7 950 000	7 600 000

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	50 000	50 000	0
2017	400 000	400 000	0
	WYKONANIE ŁĄCZNIE		0

PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY „KATOWICE MIASTO OGRODÓW – INSTYTUCJA KULTURY IM. KRYSZYNY BOCHENEK

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2016-2019	PL. SEJMU ŚLĄSKIEGO	REALIZACJA
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
<p>Projekt zakłada wykonanie działań termomodernizacyjnych i ulepszeń mających na celu zmniejszenie zużycia energii, poprawę bezpieczeństwa użytkowania budynku, poprawę jego stanu technicznego oraz estetyki obiektu i jego otoczenia. Główne założenia programowe, to stworzenie miejskiej sali widowiskowej.</p>			✓ ŚRÓDMIEŚCIE
<p>2016 Trwało opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy i koncepcji programowo-przestrzennej dla przedmiotowego zadania, z terminem wykonania: 28.02.2017 r.</p>			ZAWODZIE
<p>2017 Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę i koncepcję programowo-przestrzenną dla przedmiotowego zadania. Wykonano specyfikację techniczną oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.</p>			ZAŁĘŻE
			BOGUCICE
			SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 26 Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek - Wizualizacja 1



Rysunek 25 Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek - Wizualizacja 2

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	n. d.	1 061 500	4 000 000
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	500 000	500 000	61 500,00
2017	1 400 000	209 408	209 407,50
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	270 907,5

ROZBUDOWA, MODERNIZACJA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEJ AWF IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2011-2018

LOKALIZACJA

ULICE: SZMAUSA, MIKOŁOWSKA

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej, roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne oraz roboty wodno-kanalizacyjne.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwała termomodernizacja sali sportowej przy ul. Mikołowskiej, modernizacja budynku B (sale dydaktyczne, sale biurowe, korytarz).

2017

Realizacja kolejnego etapu rozbudowy i modernizacji obiektów AWF (hala sportowa, Okrągłak, budynek B).

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	10 200 000	11 200 000	15 450 000

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2017	0	1 000 000	1 000 000
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	12 200 000

PRZEBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2017

LOKALIZACJA

UL. KRASIŃSKIEGO 8

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje dofinansowanie realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

✓ ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwała przebudowa sieci komputerowej.

2017

Zakończono przebudowę sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	n. d.	996 912	996 370

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	500 000	744 281	741 193,26
2017	255 719	255 719	255 176,63
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	996 369,89

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W ZAWODZIU (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MOPS + NGO	2015 - 2017	UL. ŁĄCZNA 2-4	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Program Aktywności Lokalnej na Zawodziu był częścią projektu „Włącz się” Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach. Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice, Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Mocni Razem i Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Zakładał wsparcie i integrację mieszkańców m.in. dzielnicy Zawodzie poprzez pracę metodą organizowania społeczności lokalnej (OSL). Podejmowane działania miały na celu wyrównywanie szans poprzez wspieranie w rozwoju osób, rodzin i środowisk znajdujących się w najtrudniejszym położeniu. Projekt był współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.</p>			<p>ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>✓ ZAWODZIE</p> <p>ZAŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			

2016

Program był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. W 2016 roku udział w Programie rozpoczęły 52 osoby. Zrealizowano następujące działania:

- spotkania animacji lokalnej z mieszkańcami – odbyło się 149 spotkań, w których udział brało średnio 12 osób;
- spotkania ze specjalistą ds. wolontariatu z wolontariuszami – 66 spotkań, w których udział brało średnio 8 osób;
- cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych – cztery szkolenia dla 14 uczestników oraz wyjazdowa wizyta studyjna, w której udział wzięło 11 uczestników,
- trening umiejętności społecznych dla 13 uczestników, zorganizowano i współorganizowano wydarzenia lokalne, takie jak: spotkanie wielkanocne w Klubie 13 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla 49 mieszkańców (w tym 11 uczestników Programu); Dzień Rodzica w Świątlicy Specjalistycznej nr 5 - dla 40 mieszkańców; „Herbatka Sąsiedzka na Łącznej”; „Herbatka Sąsiedzka na Boh. Monte Cassino”; „Herbatka Sąsiedzka na Gwiazdach” i „Dzielnicowe Śniadania na Trawie” – w każdym z wydarzeń udział wzięło około 100 mieszkańców dzielnicy, w tym uczestnicy Programu; festyn z okazji Świątowych Dni Młodzieży dla około 200 mieszkańców; gra terenowa „Poznajemy Zawodzie” – dla 24 mieszkańców (w organizację gry zaangażowało się 15 uczestników Programu i 3 przedstawiciele instytucji lokalnych); II Dni Zawodzia dla około 500 mieszkańców;
- wsparcie mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej „Razem dla Rawy” – wydarzenie skierowane było do około 200 mieszkańców, w organizację zaangażowało się 14 uczestników Programu;
- wyjścia integracyjne – 11 wyjść dla uczestników Programu i ich najbliższego otoczenia oraz spotkania integracyjno – edukacyjne, m.in.: warsztaty fotograficzne, pieczenia chleba i bułek, relaksacyjne.

2017

W Programie wzięło udział 77 osób. Animatorzy lokalni przeprowadzili 234 spotkania z mieszkańcami, specjalista ds. wolontariatu przeprowadził 51 spotkań z wolontariuszami. Odbyły się 73 spotkania integracyjno – edukacyjne - warsztaty fotograficzne, rękodzieła, florystyczne, makijażu, szycia, stylizacji, treningi z trenerem personalnym, spotkania z dietetykiem, Grupa Praktyków Społecznych, warsztaty rozwojowe. Przeprowadzono cykl szkoleń wyjazdowych dla liderów lokalnych, zorganizowano wyjazdową wizytę studyjną, zorganizowano i współorganizowano następujące wydarzenia lokalne:

- II Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy;
- gra terenowa „Poszukiwacze Skarbów”;
- tworzenie muralu przy ul. Łącznej, „Sąsiedzkie Zumbowisko”;
- gra terenowa „Zombie Szpil”;
- „Andrzejki”;
- Impreza Mikołajkowa;
- spotkanie świąteczne.

Współorganizowano III Dni Zawodzia. Animatorzy lokalni wsparli mieszkańców w przygotowaniu i realizacji inicjatyw lokalnych oraz w realizacji projektu w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	90 038,75	466 827,69	466 805,00
Fundusze strukturalne	90 038,75	466 827,69	466 805,00
Pozostałe środki krajowe	0,00	0,00	0,00

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	90 038,75 zł	186 722,00 zł	189 128,00 zł
Fundusze strukturalne	90 038,75	183 722,00	186 128,00
Pozostałe środki krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
2017	191 137,00	191 137,00	191 136,91
Fundusze strukturalne	191 137,00	191 137,00	191 136,91
Pozostałe środki krajowe	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	470 303,66



Rysunek 27 Spotkanie świąteczne 2017
(źródło: www.mocnirazem.org)



Rysunek 28 Śniadanie na trawie 2016
(źródło: www.mocnirazem.org)

DODATKOWE INFORMACJE

<https://mocnirazem.org/2017/12/30/cal-zawodzie/>
<https://pl-pl.facebook.com/CALZawodzie/>

KATOWICKI SYSTEM ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH – WĘZŁ ZAWODZIE

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015 - 2020

LOKALIZACJA

OKOLICE PĘTLI UL. 1 MAJA,
BAGIENNEJ, KRAKOWSKIEJ

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

PODOBZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

✓ ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. W celu niezbędne jest znaczące zwiększenie wykorzystania potencjału infrastruktury tramwajowej, przebudowywanej w ramach odrębnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych na tramwaj w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z wschodniej części subregionu planowane jest zapewnienie przesiadek pomiędzy komunikacją autobusową i tramwajową oraz przesiadek z komunikacji indywidualnej na tramwaj i uzyskanie funkcji Park&Ride.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016


Opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności dla przedmiotowego zadania.

2017

Uregulowano należność za wykonanie wycinki drzew oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej; podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych; nabyto od Spółki Tramwaje Śląskie S.A prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. 1 Maja.



Rysunek 30 Węzeł Zawodzie – wizualizacja 1

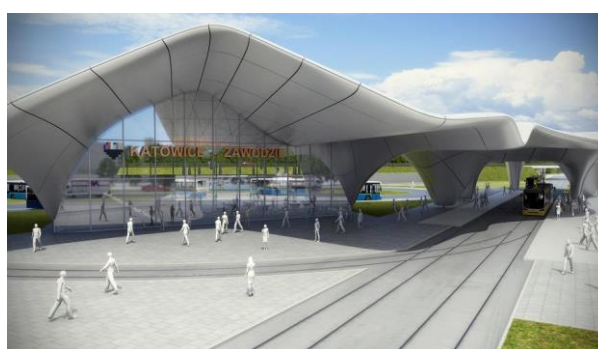

Rysunek 29 Węzeł Zawodzie – wizualizacja 2

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	56 273	80 132 153	82 628 477
Fundusze strukturalne	0	53 803 923	53 786 361
Pożyczki i kredyty	0	8 500 000	8 500 000
Pozostałe środki krajowe	56 273	17 828 231	20 342 116
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	20 839 761	2 998 218	486 219,00
Fundusze strukturalne	15 588 797	4 144	2 762,50
Pozostałe środki krajowe	5 250 964	2 994 074	483 456,50
2017	4 055 928	2 641 378	2 620 238,65
Fundusze strukturalne	2 320 966	97 700	78 756,75
Pozostałe środki krajowe	1 734 962	2 543 678	2 541 481,90
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	3 162 730,65

PRZEBUDOWA UL. 1 MAJA NA ODCINKU OD UL. STASZICA DO ISTNIEJĄCEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ W KATOWICACH-ZAWODZIU




OPIS PROJEKTU

Projekt polegał na przebudowie ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Staszica do pętli tramwajowej w dzielnicy Zawodzie w Katowicach. Zakres przebudowy obejmował:

- ulicę wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i wjazdami, miejscami postojowymi, zatokami autobusowymi;
- kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi;
- oświetlenie uliczne;
- sieć teletechniczną;
- zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem zgodnie z otrzymanymi warunkami i uzgodnieniami;
- nowe nasadzenia, elementy małej architektury;
- docelową organizację ruchu i organizację ruchu na czas robót.

Modernizacja ulicy 1 Maja polegała na przywróceniu pierwotnego przekroju poprzecznego poprzez wykonanie poszerzeń jezdni w miejscu istniejących peronów tramwajowych oraz zachowanie na całym odcinku szerokości pasa ruchu 6,25 m. Projekt zakładał wykonanie korekty przebiegu drogi, nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych. W zakresie mieściła się również przebudowa odwodnienia, oświetlenia i instalacji technicznej (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi) oraz wykonanie przejazdu przez torowisko.

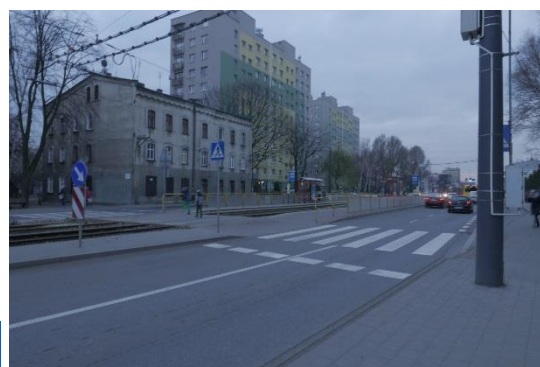

Rysunek 31 ul. 1 Maja

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2014/2015

Realizowano i zakończono roboty budowlane. Trwało postępowanie w sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji.

2016

Środki zaplanowano na wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z obniżeniem wartości gruntu, jednak wycofano się z zawarcia umowy dotyczącej stanu prawnego, z uwagi na brak stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii wysokości kosztów.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016
OGÓŁEM	11 512 729	11 512 729
Fundusze strukturalne	7 285 328	7 285 328
Pozostałe środki krajowe	4 227 401	4 227 401

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	11 000	11 000	0
Fundusze strukturalne	0	0	0
Pozostałe środki krajowe	11 000	11 000	0
WYKONANIE ŁĄCZNIE			11 512 729

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE – „NASZE ZAŁĘŻE” – ETAP I

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2017 - 2020

LOKALIZACJA

UL. ZARĘBSKIEGO 2

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 66 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Katowice – Załęże.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: spotkania z animatorami lokalnymi w Centrum Społecznościowym Nasze Załęże, Klub Rodzica, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże, Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej oraz Klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo w projekcie realizowane będą działania środowiskowe wzmocniające potencjał i integrację społeczności lokalnej oraz działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.

PODOB SZAR
REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Ogłoszono nabór na animatorów lokalnych oraz podjęto działania związane z organizacją projektu; wykonano remont sali przeznaczonej na realizację projektu "Klub" oraz "Punkt obywatelski", sali nr 52 wraz z adaptacją na gabinet pedagogiczny oraz gabinetu pedagogicznego wraz z adaptacją na świetlicę środowiskową.



DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	1 085 552	200 000	107 173	32 724,51
Fundusze strukturalne	949 853	170 000	69 897	7 850,22
Dotacje stanowiące wkład krajowy	111 748	0	8 276	923,84
Pozostałe środki krajowe	23 950	30 000	29 000	23 950,45
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	32 724,51

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.mops.katowice.pl/node/2347>

<https://www.facebook.com/Centrum-Spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-Nasze-Za%C5%82%C4%99%C5%BCe-2193533884216177/>

PRZEDŁUŻENIE UL. BAILDONA W KIERUNKU PLANOWANEJ UL. NOWOGLIWICKIEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2015 - 2016	UL. BAILDONA	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOBSZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował realizację drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.			ZAWODZIE-PORCELANOWA
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			✓ DĄB-BAILDONA
2015			KOLONIA ALFRED
W efekcie realizacji projektu wykonano: 1 037,63 m ² drogi oraz 379,55 m ² chodnika oraz most, w tym 104,64 m ² pow. asfaltowa płyty mostowej i 96,28 m ² chodnika			WEŁNOWIEC-KONDUKTORSKA
2016			SZOPIENICE-WOŹNIAKA
Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Zakończono realizację zadania.			



DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	
OGÓŁEM	2 080 907,55	2 513 218	
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	440 000	440 000	432 310,00
	WYKONANIE ŁĄCZNIE		2 513 217,55

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WOLNEGO 8, ZAMENHOFA 36-38, 36A-38A, 36B-38B

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2019

LOKALIZACJA

UL. WOLNEGO
UL. ZAMENHOFA

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Opracowane zostały projekty techniczne oraz dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej.

2017

Opracowano dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenia budowlane.



Rysunek 32 ul. Wolnego 8



Rysunek 33 ul. Zamenhofa 36a-38a

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	0,00	3 246 667,00	6 615 507,00
w tym fundusze strukturalne	n. d.	b.d.	4 225 063,00

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	305 000,00	305 000,00	80 120,00
2017	1 158 600,00	87 084,00	51 497,00
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	131 617,00

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP II

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2014 - 2019

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA 74A

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCIE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz audyt energetyczny; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu.

2017

Podpisano umowę na wykonanie dodatkowych opracowań dla uzupełnienia wniosku o umorzenie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu.



DANE FINANSOWE

Lata	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII	W tym dofinansowanie UE*
2016	1 275 384,00 zł	564 335,12 zł
2017	1 275 386,00 zł	564 336,00 zł

Lata	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Wydatki narastająco od początku realizacji inwestycji
2016	3 300,00 zł	1 846,40 zł	1 846,23 zł	14 425,44
2017	1 097,00 zł	2 020,00 zł	854,17 zł	15 279,61
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	15 279,61

*Wartość szacunkowa

REWITALIZACJA PLANU LONDZINA

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2017 - 2018

LOKALIZACJA

UL. GLIWICKA

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

W ramach inwestycji planuje się przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie stref dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się utworzenie trzech wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną. Planuje się umiejscowienie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna- plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich - ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku planuje się nasadzenia izolujące od hałasu oraz podkreślające istniejący starodrzew. Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania z RPO WSL w ramach poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

PODOBZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Wykonano studium wykonalności oraz projekt budowlany. Projekt konsultowany był ze społecznością lokalną w ramach realizacji projektu Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych.



Rysunek 34 Lokalizacja Placu Londzina

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	1 402 838	100 000	33 500	25 500,00
Fundusze strukturalne	1 192 412	85 000	28 475	21 675,00
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
Pozostałe środki krajowe	210 426	15 000	5 025	3 825,00
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	25 500,00

RESILIENT EUROPE - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ELASTYCZNOŚCI MIEJSKIEJ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016 - 2018

LOKALIZACJA

DZIELNICA ZAŁĘŻE

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru Załęża w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

We wrześniu powołana została Lokalna Grupa Urbact (LGU) w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Odbyły się 4 spotkania Grupy, podczas których zdefiniowano problemy dzielnicy oraz rozpoczęto prace nad wizją.

2017

Odbyło się 7 spotkań LGU podczas których pracowano nad kolejnymi elementami Zintegrowanego Planu Działania – wizją rozwoju dzielnicy, celami oraz działaniami przyczyniającymi się do poprawy sytuacji w dzielnicy. W październiku podczas Dni Załęża zorganizowano wydarzenie „Gruszkowe Maszkiety”, którego celem było przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Rozpoczęto przygotowania do konferencji podsumowującej projekt, którą zaplanowano na luty 2018.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	0	151 415	138 015
Fundusze strukturalne	0	114 903	103 513
Pozostałe środki krajowe	0	36 512	34 502

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	0	44 804	11 422,95
Fundusze strukturalne	0	38 082	9 709,50
Pozostałe środki krajowe	0	6 722	1 713,45
2017	72 540	105 921	59 139,90
Fundusze strukturalne	61 659	90 032	50 268,92
Pozostałe środki krajowe	10 881	15 889	8 870,98
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	70 562,85

DODATKOWE INFORMACJE

Broszura nt. projektu: http://www.katowice.eu/SiteAssets/Strony/Resilient-Europe/Broszura_PL.pdf

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

✓ ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIEJSKICH W TYM PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYSZŁEGO OTOCZENIA W DZIELNICY BOGUCICE – REWITALIZACJA PARKU BOGUCKIEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
KZGM/ZZM	2013, 2015-2018	UL. KOPALNIANA	REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowa i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej” wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Podpisano oraz zrealizowano umowę na zmianę opracowania projektowego w związku z planowaną budową pomnika ofiar deportacji. Ponadto w związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji studium wykonalności. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na następne lata.

2017

W związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji studium wykonalności. Rzeczowa realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ **BOGUCICE**

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 35. Wizualizacja - Krąg taneczny



Rysunek 36. Wizualizacja - Plac pod sceną mobilną

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	132 951	6 352 023	6 089 869
Fundusze strukturalne	76 416	5 362 627	5 047 319
Pozostałe środki krajowe	56 535	989 396	1 042 550

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	6 326 559	174 812	43 925,00
Fundusze strukturalne	5 377 575	148 590	37 336,25
Pozostałe środki krajowe	948 984	26 222	6 588,75
2017	2 744 699	0	0
Fundusze strukturalne	2 332 994	0	0
Pozostałe środki krajowe	411 705	0	0
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	176 876,00

UKŁAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO, MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KONGRESOWEGO ORAZ SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2008-2018

LOKALIZACJA

kwartał ul. Olimpijskiej,
Góreckiego, Dobrowolskiego,
al. Roździeńskiego

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje ulicę Dobrowolskiego (stanowiąca przedłużenie ul. Dudy Gracza); przedłużenie ul. Nadgórników oraz przedłużenie śladu ulicy Olimpijskiej, co łącznie stanowi 2,2 km nowych i przebudowanych dróg. Ponadto wybudowano parking w rejonie ul. Olimpijskiej; kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską oraz ścieżki rowerowe.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Podpisano akt notarialny na wykup gruntu. Trwały postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok.

2017

Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Trwały postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2018 roku. Zadanie będzie kontynuowane.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE


ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

✓ BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

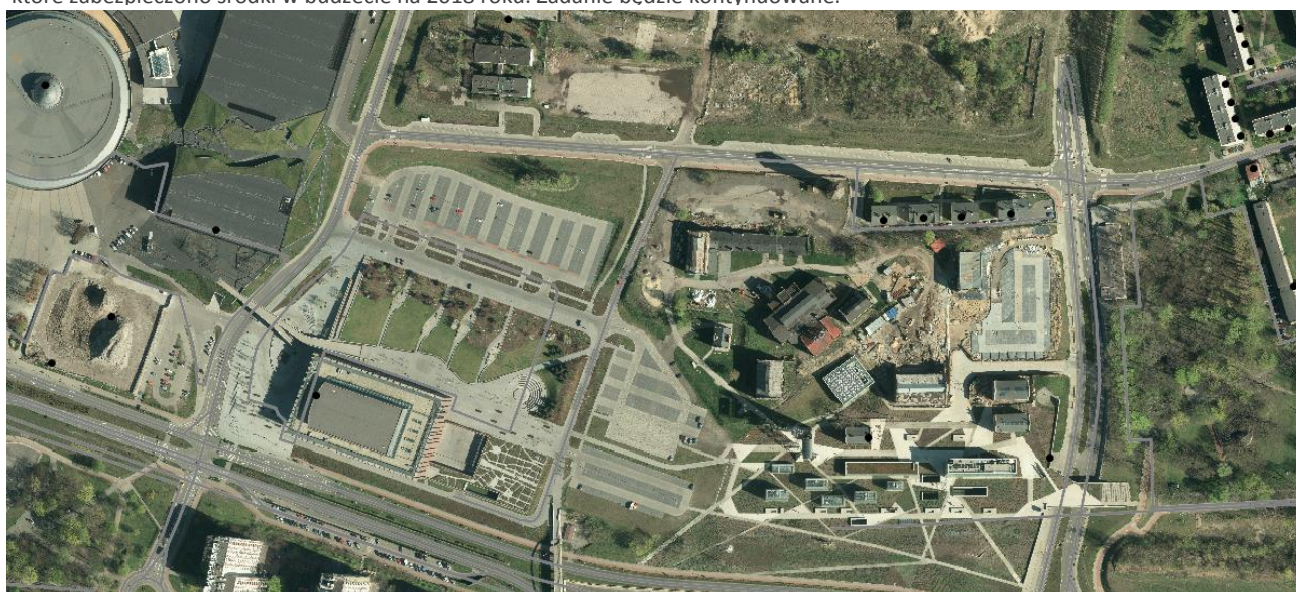

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓLEM	150 317 373	152 295 257	153 600 696
W tym środki EBI	117 587 475	117 587 475	117 587 475

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	3 970 000	3 970 000	1 977 884,40
2017	720 000	2 683 846	1 305 439,30
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	153 600 696,7

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE „SZOPKI” W SZOPIENICACH – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2017-2020

LOKALIZACJA

UL. KRAKOWSKA 138

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Dwójka.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Katowic – dzielnicy Szopienice-Burowiec, którzy chcieliby zmieniać pozytywnie wizerunek dzielnicy, a także do osób, które chciałyby poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych. Projekt zakłada wsparcie i integrację mieszkańców dzielnicy poprzez pracę metodą organizowania społeczności lokalnej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

W dniu 16 czerwca 2016 roku ogłoszono otwarty nabór partnerów do projektu, w jego wyniku do realizacji Centrum Społecznościowego „SZOPKI” w Szopienicach wybrano Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”.

2017 (projekt realizowany od września)

Podjęto działania organizacyjne, administracyjno-biurowe projektu, działania dotyczące spraw promocyjno-informacyjnych projektu. Odbyły się spotkania animatora z mieszkańcami, udział w spotkaniach środowiskowych organizowanych przez mieszkańców (z okazji 10-lecia działań mieszkańców na osiedlu Bagno) i przez Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 (spotkanie z przedstawicielami instytucji lokalnych działających w rejonie dzielnicy). Animatorzy lokalni rozeznali lokalne potrzeby i zasoby. Odświeżono pomieszczenie pod Centrum Społecznościowe Szopki, zakupiono meble i część wyposażenia.



DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	1 710 387	200 000	79 430	39 816,92
Fundusze strukturalne	1 466 148	170 000	36 689	15 337,12
Dotacje stanowiące wkład krajowy	172 489	0	4 316	1 804,83
Pozostałe środki krajowe	71 750	30 000	38 425	22 674,97
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	39 816,92

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.facebook.com/centrumspolecznoscioweszopki/>
<https://mocnirazem.org/2018/01/15/centrum-spoolecznosciowe-szopki/>
http://www.dwojka-katowice.ugu.pl/?fn_mode=fullnews&fn_id=62
<https://www.mops.katowice.pl/node/2346>

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ (PO KOTŁOWNI) PRZY GIMNAZJUM NR 13 W KATOWICACH – SZOPIENICACH POD CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻOWEJ W SZOPIENICACH ORAZ REWITALIZACJA PARKU OLIMPIJCZYKÓW W DZIELNICY SZOPIENICE

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
ZZM / GIMNAZJUM NR 13	2015-2018	UL. BRYNICY 7	REALIZACJA
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
<p>Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń w budynku w gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku szkoły o przedsionek windy, a także rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych oraz zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren dzielnicy Szopienice-Burowiec.</p> <p>Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana w szczególności do projektów planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.2.1 RPO WSL 2014-2020), - Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.1.1 RPO WSL 2014-2020). 			<p>ŚRÓDMIEŚCIE</p> <p>ZAWODZIE</p> <p>ZAŁĘŻE</p> <p>BOGUCICE</p> <p>✓ SZOPIENICE-BUROWIEC</p> <p>JANÓW-NIKISZOWIEC</p>

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Dokonano uzupełnienia studium wykonalności, realizowanego od roku 2015. Studium zostało odebrane i w całości rozliczone. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na następne lata.

2017

W związku z ogłoszeniem kryteriów oraz harmonogramem naboru wniosków konkursowych dokonano aktualizacji studium wykonalności. Rzeczowa realizacja projektu została przesunięta na 2018 rok.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	86 108	932 827	1 912 859
Fundusze strukturalne	73 191	763 796	1 625 929
Pozostałe środki krajowe	12 917	169 031	286 930

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	1 670 226	945 081	43 665,00
Fundusze strukturalne	1 419 693	803 319	37 115,25
Pozostałe środki krajowe	250 533	141 762	6 549,75
2017	1 124 489	0	0
Fundusze strukturalne	955 816	0	0
Pozostałe środki krajowe	168 673	0	0
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	976 492

DODATKOWE INFORMACJE

[http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-\(po-kot%C5%82owni\)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx](http://katowice.eu/Strony/Dostosowanie-pomieszcze%C5%84-(po-kot%C5%82owni)-przy-Gimnazjum-nr-13-w-Katowicach---Szopienicach-pod-Centrum-Animacji-M%C5%82odzie%C5%BCowej-w.aspx)

WZROST DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROZBUDOWANYCH PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO KATOWICE (MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 66)

PODMIOT REALIZUJĄCY

MP NR 66/ CUW

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest doposażenie dwóch miejskich przedszkoli w pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia dla dzieci, zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Faktyczna realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku. Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Podpisano umowę o dofinansowanie – 12.10.2016, rzeczowa realizacja projektu w 2017 r.

2017

W grudniu 2017 wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Prace trwały w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. Projekt obejmował wybudowanie parterowego obiektu w technologii modułowej. Główne prace obejmowały roboty ziemne, montażowa i wykończeniowe, ponadto w MP nr 66 przeprowadzono częściową przebudowę w istniejącej części przedszkola. Prowadzony był także nadzór inwestorski oraz działania promocyjne.

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie nowych oddziałów wychowania przedszkolnego (ogólnodostępne, integracyjne, specjalny dla dzieci autystycznych); zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju, rozwijania kompetencji społeczno- emocjonalnych. Zakupiono niezbędne wyposażenie.

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	1 095 091,00	321 039,00	321 039,00	254 859,00
Fundusze strukturalne	930 828,00	268 359,00	268 359,00	209 344,00
Pozostałe środki krajowe	164 263,00	52 680,00	52 680,00	45 515,00
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	254 859,00

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE WIOSNY LUDÓW ORAZ SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ, BEDNORZA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE (PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH)

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2010-2015; 2017-2018	UL. WIOSNY LUDÓW	ZAKOŃCZONY
OPIS PROJEKTU			PODOB SZAR REWITALIZACJI
Projekt obejmował zadania z zakresu przebudowy infrastruktury drogowej.			ŚRÓDMIEŚCIE
WYKONANY ZAKRES RZECZOWY			ZAWODZIE
2016 Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok.			ZAŁĘŻE
2017 Trwały postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2018 rok. Projekt został zakończony w zakresie dot. budowy infrastruktury, regulowano sprawy terenowo - prawne			BOGUCICE
			✓ SZOPIENICE-BUROWIEC
			JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 38 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte - 1



Rysunek 37 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte - 2

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	7 893 697,10	7 893 697	7 894 337
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	250 000	250 000	0
2017	250 000	250 000	640,00
	WYKONANIE ŁĄCZNIE		7 894 337,1

KOMPLESKOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W OKOLICY STAWÓW MORAWA, HUBERTUS, BORKI

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

okolice stawów: MORAWA, HUBERUS, BORKI

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

Odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania przedmiotowego terenu. Trwały ustalenia dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji.

2017

Otrzymano zgodę na wykonanie rocznej inwentaryzacji przyrodniczej, w ramach którego wybrano wykonawcę zadania, z terminem zakończenia: 10.03.2018 r. Zadanie będzie kontynuowane.



Rysunek 40. Kompleks Stawów Szopienice-Burowiec- widok z góry
źródło: Raport procesu konsultacji społecznych obszaru stawów Borki, Morawa, Hubertusy w Katowicach Szopienicach Katowice Szopienice PRONOBIS STUDIO



Rysunek 39. Kompleks stawów Szopienice-Burowiec

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	0	100 000	406 765
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	100 000	100 000	0
2017	100 000	100 000	6 765,00
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	6 765,00

BUDOWA TRZECH BASENÓW W DZIELNICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2019

LOKALIZACJA

DZIELNICA SZOPIENICE-
BUROWIEC

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt jest elementem zadania „Budowa trzech basenów w dzielnicach”, którego celem jest zwiększenie dostępności do infrastruktury sportów wodnych. Każdy projekt zakłada budowę niecki sportowej o wym. 25x16m (6-torową) oraz niecki rekreacyjno-pływackiej dla potrzeb nauki pływania z wydzielonym miejscem na rekreację. Przy basenie będą także trybuny na 115 miejsc, wieża umożliwiająca wejście na wysokość ponad 8 m., zjeżdżalnia o długości 80 m, przebiegająca częściowo na zewnątrz i częściowo wewnątrz obiektu. W części basenowej zaplanowano również zespół saunarium.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetargi na wybór inżyniera kontraktu oraz wybór wykonawcy robót budowlanych.

2017

W wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowy na pełnienie usług inżyniera kontraktu oraz na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 11.03.2019 r. Trwały roboty budowlane. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 4.000.000 PLN.



Rysunek 42 Wizualizacja 1



Rysunek 41 Wizualizacja 2

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	48 983	31 979 093	28 677 309
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	666 666,67	275 000,00	265 321,42
2017	12 754 167,00	1 497 918	237 413,09
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	551 717,51

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2543&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e>

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO KATOWICE, POPRZEZ Utworzenie NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH²⁴

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2015-2017

LOKALIZACJA

UL. BRYNICY 50

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 41 i 66 w oparciu o modułowe rozwiązania.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZĄŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Ze względu na późny termin podpisania umowy z wykonawcą robót, przesunięto realizację zadania na rok 2017.

2017

Wykonano wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe. Wykonano ponadto zabudowę kontenerową, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, prace elewacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i kanalizacyjne, instalacje C.O., zagospodarowanie terenu, dostarczono i zamontowano wyposażenie sal i kuchni.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	97 939	97 939	3 829 664,5
Fundusze strukturalne	83 248	83 248	2 707 430
Pozostałe środki krajowe	14 691	14 691	1 122 234,5

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	3 632 424,5	3 664 251	0
Fundusze strukturalne	3 045 741	2 625 821,5	0
Pozostałe środki krajowe	586 683,5	1 038 429,5	0
2017	3 664 251	3 737 751	3 731 725,6
Fundusze strukturalne	2 625 821,5	2 625 821,5	2 624 181,9
Pozostałe środki krajowe	1 038 429,5	1 111 929,5	1 107 543,6
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	3 829 664,9

DODATKOWE INFORMACJE

<http://katowice.eu/Strony/Zwi%C4%99kszenie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-do-plac%C3%B3wek-wychowania-przedszkolnego%2C-dla-kt%C3%B3rych-organem-prowadz%C4%85cym--jest-miasto-Katowice-poprze.aspx>

²⁴ Dane finansowe dla MP 66 uzyskano przez równy podział ogólnej wartości całego projektu.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KATOWICE – ETAP VII

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	LOKALIZACJA	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE	2016-2018	UL. CIESIELSKA 1	REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 65.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Trwała realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz audytu energetycznego.

2017

Wykonano usługi na cele złożenia wniosku o środki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PODOBSZAR REWITALIZACJI
ŚRÓDMIEŚCIE
ZAWODZIE
ZĄŁĘŻE
BOGUCICE
<input checked="" type="checkbox"/> SZOPIENICE-BUROWIEC
JANÓW-NIKISZOWIEC



Rysunek 43 Budynek przy ul. Ciesielskiej 1 - wejście



Rysunek 44 Budynek przy ul. Ciesielskiej 1 – od strony placu zabaw

DANE FINANSOWE			
Lata	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII		W tym dofinansowanie UE*
2016	1 865 069,00 zł		946 570,50 zł
2017	1 865 068,00 zł		946 570,00 zł

Lata	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie	Wydatki narastająco od początku realizacji inwestycji
2016	3 300,00 zł	1 846,67 zł	1 846,23 zł	13 060,14
2017	1 098,00 zł	2 020,00 zł	683,33 zł	13 743,47
WYKONANIE ŁĄCZNIE				13 743,47

*Wartość szacunkowa

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY SZOPIENICE-GISZOWIEC PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE/MDK

LATA REALIZACJI

2014; 2016, 2017-2018

LOKALIZACJA

UL. OBROŃCÓW
WESTERPLATTE 10

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

PODOBZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach. Jego celem jest zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w obiekcie. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Zaktualizowano dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020

2017

Zaktualizowano analizę finansową oraz studium wykonalności.



Rysunek 45 Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	39 975	672 166	693 568
Fundusze strukturalne	33 979	556 469	468 415
Pozostałe środki krajowe	5 996	115 697	225 153

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	10 000	10 000	0
Fundusze strukturalne	8500	8500	0
Pozostałe środki krajowe	1500	1500	0
2017	650 641	3 690	0
Fundusze strukturalne	553 044	2 644	0
Pozostałe środki krajowe	97 597	1 046	0
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	39 975

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU JANUSZA SIDŁY

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZYM

LATA REALIZACJI

2015-2016

LOKALIZACJA

UL. 11 LISTOPADA

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował przebudowę parku, w tym przebudowę ciągów pieszych, budowę miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2015/2016

W roku 2015 opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2016 wykonano roboty budowlane, polegające na niwelacji i utwardzeniu powierzchni gruntu, remoncie uszkodzonych fragmentów istniejących nawierzchni oraz zagospodarowania skweru zielenią. Ustawiono ogrodzony wybieg dla psów oraz inne elementy małej architektury (ławki i kosze). Zadanie zakończone i odebrane.



Rysunek 47 Skwer Janusza Sidły – 1



Rysunek 46 Skwer Janusza Sidły - 2

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016		Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016
OGÓŁEM		10 947	223 605
	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	489 053	264 053	212 657,60
	WYKONANIE ŁĄCZNIE		223 604,60

SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

KZGM

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

UL. BEDNORZA 14

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

✓ SZOPIENICE-BUROWIEC

JANÓW-NIKISZOWIEC

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje dostosowanie lokalu (dotychczasowa funkcja - apteka) o powierzchni ok 180 m² do nowej funkcji tj. usług społecznościowych. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków EFRR w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń budynku.

2017

Opracowano dokumentację techniczną, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenia budowlane.



Rysunek 48 Budynek przy ul. Bednorza 14

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	1 186 285	1 185 571
Fundusze strukturalne	1 008 342	1 007 735
Pozostałe środki krajowe	177 943	177 836

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	0	5 000	0
Fundusze strukturalne	0	4 250	0
Pozostałe środki krajowe	0	750	0
2017	345 000	71 931	71 217,00
Fundusze strukturalne	293 250	61 141	60 534,45
Pozostałe środki krajowe	510750	10 790	10 682,55
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	71 217,00

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE W NIKISZOWCU – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY

MOPS + NGO

LATA REALIZACJI

2017-2020

LOKALIZACJA

PL. WYZWOLENIA 21

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest dalszy rozwój dzielnicy – z uwzględnieniem różnic i potencjałów poszczególnych jej części tj. Janowa, Korei i Nikiszowca; wsparcie zawodowo-społeczne osób indywidualnych; wzmocnienie społeczności lokalne. Projekt wybrany został do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

W dniu 16 czerwca 2016 roku ogłoszono otwarty nabór na partnera projektu. W wyniku przeprowadzonych naborów do realizacji Centrum Społecznościowego w Nikiszowcu wybrano Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które od wielu lat prężnie działa w dzielnicy.

2017 (realizacja od sierpnia 2017 r.)

Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych. Podjęto wstępne działania diagnostyczne obszarów objętych projektem tj. osiedla Nikiszowiec, Korea oraz część Janowa. W tym celu stworzono takie narzędzia jak: kwestionariusz ankiety, wywiad kwestionariuszowy, indywidualny wywiad pogłębiony. Realizowano działania związane z funkcjonowaniem Inkubatora Animatorów Nikiszowca. Jego działalność opierała się na regularnych, codziennych spotkaniach z młodzieżą. W ramach działalności Inkubatora niektórzy młodzi ludzie zostali przygotowywani – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej – do roli przewodnika turystycznego w Nikiszowcu. Jeden z nich samodzielnie oprowadza wycieczki po osiedlu. W ramach działań związanych z rewitalizacją Nikiszowca nawiązano współpracę z miejscowością Ratingen w Zagłębiu Ruhry ze względu na analogie między tymi regionami i wynikającą z tego potrzebę dalszego – bardziej kompleksowego i profesjonalnego – podejścia do działań związanych z wykorzystaniem zasobów turystycznych Nikiszowca i ich wykorzystanie dla rozwoju ekonomicznego miejsca.

PODOBZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	1 854 269	304 592	179 022	133 290,57
Fundusze strukturalne	1 589 793	258 903	129 465	104 257,81
Dotacje stanowiące wkład krajowy	187 039	0	15 231	12 269,64
Pozostałe środki krajowe	77 437	45 689	34 326	16 763,12
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	133 290,57

DODATKOWE INFORMACJE

<http://www.fil.org.pl/pl/nasze-marki/centrum-spolecznościowe-w-nikiszowcu/centrum-spolecznościowe-w-nikiszowcu-wiecej>

MOJE WYBORY – MOJE KWALIFIKACJE – MOJE ZAWODOWE PERSPEKTYWY. NOWOCZESNE I AKTYWNE ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZSZ NR 3/CUW

LATA REALIZACJI

2016-2018

LOKALIZACJA

DZIELNICA JANÓW-NIKISZOWIEC

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest powiązanie wiedzy zdobywanej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach w trakcie procesu kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. W ramach projektu przewiduje się organizację kursów oraz staży dla uczniów szkoły. Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020 – poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

PODOB SZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Wypłacono wynagrodzenie za wykonanie umowy w zakresie doradztwa zawodowego.

2017

Zakupiono wyposażenie biura projektu, sterowniki PLC; przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego (38 uczniów) oraz kurs uprawnień elektrycznych SEP (18 uczniów) z egzaminem. Zrealizowano kurs projektowania i symulacji układów elektronicznych CAD, montażu instalacji fotowoltaicznych, programowania sterowników PLC, obsługi górniczych kolejek podwieszanych; dla 6 uczennic przeprowadzono kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; skierowano do ZDZ Katowice- oddział Chorzów nauczyciela na kurs spawalniczy MIG/TIG; zakupiono odzież ochronną dla stażystów i praktykantów, wyposażenie biura projektowego; wypłacono stypendia stażowe, wynagrodzenia dla opiekunów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	195 541	161 936
Fundusze strukturalne	162 843	134 894
Dotacje stanowiące wkład krajowy	19 158	15 870
Pozostałe środki krajowe	13 540	11 172

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	61 764	11 146	1 330,00
Fundusze strukturalne	52 500	7 913	1 130,00
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0	931	133,00
Pozostałe środki krajowe	9 264	2 302	67,00
2017	122 860	132 676	89 255,15
Fundusze strukturalne	101 541	108 324	73 592,47
Dotacje stanowiące wkład krajowy	11 946	12 744	8 657,93
Pozostałe środki krajowe	9 373	11 608	7 004,75
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	90 585,15

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Moje-wybory---moje-kwalifikacje---moje-zawodowe-perspektywy--Nowoczesne-i-aktywne-zdobywanie-kwalifikacji-zawodowych.aspx>

NAUCZYCIELEM WSZYSTKIEGO JEST PRAKTYKA – MODERNIZACJA BAZY WARSZTATOWO-DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 W KATOWICACH

PODMIOT REALIZUJĄCY

ZSZ nr 3

LATA REALIZACJI

2015-2017

LOKALIZACJA

UL. SZOPIENICKA 66

STATUS PROJEKTU

ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje przebudowę bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

PODOBSZAR REWITALIZACJI

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAWODZIE

ZAŁĘŻE

BOGUCICE

SZOPIENICE-BUROWIEC

✓ JANÓW-NIKISZOWIEC

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

Zapłacono I ratę za dozór techniczny projektu. Ponadto środki zaplanowano na wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie elektryki, elektrotechniki, górnictwa i ekonomii. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.

2017

Wykonano remont i modernizację budynku warsztatów szkolnych oraz pracowni; zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, projektor z tablicą interaktywną, sprzęt komputerowy, maszyny specjalistyczne (m.in. do metalu, drewna, spawania, dokonywania pomiarów geodezyjnych) oraz szafy narzędziowej. Projekt zakończono.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	41 820	43 050	1 106 142
Fundusze strukturalne	10 200	10 200	733 448
Pozostałe środki krajowe	31 620	32 850	372 694

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	1 411 121	1 411 121	1 230,00
Fundusze strukturalne	1 199 453	946 141	0
Pozostałe środki krajowe	211 668	464 980	1 230,00
2017	1 192 215	1 424 651	1 063 092,39
Fundusze strukturalne	794 865	946 141	723 248,06
Pozostałe środki krajowe	397 350	478 510	339 844,33
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	1 106 142,39

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.katowice.eu/Strony/Nauczycielem-wszystkiego-jest-praktyka---modernizacja-bazy-warsztatowo-dydaktycznej-w-Zespole-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-nr-3-w-Katow.aspx>

WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM ORAZ ICH ŚRODOWISKA RODZINNEGO – I ETAP

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	ODDZIAŁYWANIE	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE + NGO	2017-2020	HORYZONTALNE	REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest integracja społeczna osób w wieku senioralnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Katowice oraz dotkniętych pogłębiającymi się procesami starzenia poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w formie działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych, edukacyjnych i kulturalnych wpływających pozytywnie na poprawę sytuacji seniorów oraz upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Podjęto działania związane z zatrudnieniem kadry realizującej zadania, organizacją projektu tj. przygotowaniem dokumentacji projektowej, promocji projektów, przygotowaniem do realizacji działań projektowych. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu poprzez informowanie seniorów przez organizatorów społeczności lokalnej o ofercie projektu na spotkaniach, w których ww. uczestniczą np. w Klubie Ślązaka, Kafe Byfyj, MDK Bogucice, plakaty informujące o spotkaniach umieszczone w kluczowych miejscach dzielnic: w bibliotekach, przy szkołach, tablicy miejskiej, administracjach budynków, kłatkach schodowych, facebooku Centrum Zimbardo.

W dzielnicy Janów – Nikiszowiec odbyły się: spotkanie z seniorami w ramach spotkań „Klubu Ślązaka” gdzie przedstawiono założenia projektu senioralnego; spotkania Klubu Społecznościowego „Senior w działaniu”, warsztaty decoupage, warsztaty „Stroiki na Wszystkich Świętych”, zajęcia z dietetykiem w ramach cyklu zajęć edukacyjnych „Na zdrowie”, spotkania przedświąteczne, w czasie którego uczestnicy mogli porozmawiać na temat zwyczajów kultywowanych w ich domach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wymienić się przepisami na potrawy świąteczne.

W dzielnicy Bogucice podjęto prace związane z rozeznaniem sytuacji środowiskowej dzielnicy. Nawiązano kontakt i zaplanowano współpracę z Dziennym Domem Pomocy Społecznej przy ul. Wiślanej, Parafią pod wezwaniem Św. Szczepana, Miejskim Domem Kultury Bogucice - Zawodzie Dział Bogucice, Radą Jednostki Pomocniczej 13 – Bogucice. Przeprowadzono wizję lokalną terenu, osiedli i ulic w Bogucicach oraz Parku Boguckiego. Odbyły się zajęcia „Klubu seniora”, w ramach których odbyły się Warsztaty kreatywne pt. „Porcelana jak malowana - czyli ozdabianie filiżanek według własnych projektów”; spotkanie ze specjalistą podologiem, dietetykiem na temat zdrowego odżywiania w ramach cyklu „Porozmawiajmy o zdrowiu”.

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	3 120 631	476 000	52 928	42 127,73
Fundusze strukturalne	2 658 240	404 600	8 835	5 359,49
Dotacje stanowiące wkład krajowy	312 735	0	1 039	630,90
Pozostałe środki krajowe	149 655	71 400	43 054	36 137,34
			WYKONANIE ŁĄCZNIE	42 127,73

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.mops.katowice.pl/node/2270>

<https://www.katowice.eu/Strony/Wzmocnienie-systemu-wsparcia-os%C3%B3b-w-wieku-senioralnym-oraz-ich-%C5%9Brodowiska-rodzinnego---I-etap.aspx>

PRZEDŁUŻENIE UL. STĘŚLICKIEGO NA ODCINKU OD UL. MISJONARZY OBLATÓW DO AL. KORFANTEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY

MIASTO KATOWICE

LATA REALIZACJI

2017-2020

LOKALIZACJA

UL. STĘŚLICKIEGO

STATUS PROJEKTU

REALIZACJA

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla całej inwestycji w zakresie:

- budowy drogi klasy G 2/2 stanowiącej przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego oraz ul. Konduktorskiej z włączeniem w istniejący układ drogowy i dalej do granicy Miasta z Siemianowicami Śląskimi.

- przebudowy ul. Słonecznej na odcinku od nowobudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z ulicami Energetyków (nowa nazwa Józefowska) i Józefowską wraz z przebudową tego skrzyżowania,

- przebudowy odcinka istniejącej ul. Stęślickiego o przekroju 1/3 w celu dostosowania do przyjętego przekroju drogi 2/2.

2. Realizację etapu I w zakresie:

- budowy jednej jezdni (samodzielnie funkcjonująca droga, chodnik i ścieżka rowerowa) na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej,

- przebudowy ul. Słonecznej na odcinku od nowobudowanego skrzyżowania do skrzyżowania z ulicami Energetyków (nowa nazwa Józefowska) i Józefowską wraz z przebudową tego skrzyżowania.



WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2017

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.

DANE FINANSOWE

	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017	Plan na 01.01 (2017)	Plan na 31.12 (2017)	Wykonanie (2017)
OGÓŁEM	27 340 000,00 zł	60 000	60 000	0
WYKONANIE ŁĄCZNIE				0

Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębnie (w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach).

PODMIOT REALIZUJĄCY	LATA REALIZACJI	OBSZAR ZDEGRADOWANY	STATUS PROJEKTU
MIASTO KATOWICE + NGO	2015-2017	WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC, DĄB	ZAKOŃCZONY

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na pracy ze społecznością lokalną w celu aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wspieraniu procesu reintegracji zawodowej uczestników projektu.

Projekt zakłada organizację spotkań i szkoleń animacyjnych, treningów umiejętności społecznych, lokalnych imprez integracyjnych oraz warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych, skorzystać ze wsparcia animatora lokalnego, zaplanować i realizować w grupie różne inicjatywy.

Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

WYKONANY ZAKRES RZECZOWY

2016

W 2016 roku uczestnictwo w PAL-W rozpoczęło 41 osób. W ramach Programu zorganizowano m.in.: wyjazdowy trening kompetencji społecznych, w którym udział wzięło 12 uczestników; szkolenia i spotkania animacyjne - odbyło się 149 spotkań z animatorami (spotkania z mieszkańcami, spotkania z młodzieżą, spotkania indywidualne, Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich), a także zorganizowano 6 spotkań z przedstawicielami instytucji lokalnych; Lokalną Strefę Kobiet – zajęcia animacyjno – integracyjne dla mieszkanki dzielnicy. Odbyło się 31 spotkań (w tym spotkania z animatorem, spotkania edukacyjno-integracyjne, zajęcia fitness, wyjścia integracyjne dla mam z dziećmi, a także zatrudniono opiekunkę do dzieci). Lokalna Strefa Kobiet skupiła 13 uczestniczek, wydarzenia lokalne – Program wsparł organizację biegu przełajowego organizowanego przez Gimnazjum nr 9, w którym uczestniczyło 40 osób, a także Objazdowego Kina Dzielnicowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa, w którym wzięło udział ok. 100 mieszkańców, Dni Wełnowca-Józefowca, w których udział wzięło ok. 250 mieszkańców, a także Andrzejki dla mieszkańców, w których uczestniczyło 17 osób, warsztaty genealogiczne, przeprowadzone przez mieszkańca dzielnicy dla 6 osób, 3 wyjścia integracyjne dla uczestników i ich otoczenia. W wyjściach wzięło udział 10 osób. W 2016 r. Program pozyskał 8 wolontariuszy (2K/6M), którzy pomagali w organizacji wydarzeń lokalnych.

2017

W 2017 roku w Programie rozpoczęły udział 24 osoby (18K i 6M). Łącznie w 2017 roku w warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Program wzięło udział 344 osoby (239 K i 105 M), w tym 49 uczestników Programu (41 K i 8 M). Prowadzono działania związane z organizowaniem społeczności lokalnej, w tym spotkania z mieszkańcami (spotkania z animatorem lokalnym, zajęcia rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia Lokalnej Strefy Kobiet, w ramach której zapewniono opiekę nad dziećmi). Realizowano również działania z zakresu integracji: podczas ferii zimowych (m.in. Muzeum Śląskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej UNIKAT, Jump World), podczas wakacji letnich (m.in. sąsiedzki grill, wyjście integracyjne do kręgielni, PAL-FEST), wyjścia integracyjne z grupą mam z dziećmi do bawilandii oraz zorganizowano wyjście integracyjne do teatru. Odbyło się kilka wydarzeń lokalnych, m.in. gra terenowa dla rodzin „Polowanie na PALoWe pisanki”, „Szafing – wymiana odzieży”, czy Dni Wełnowca-Józefowca. Podpisano 7 porozumień o wolontariacie. Wolontariuszka - mieszkanka prowadziła otwarte zajęcia fitness dla mieszkanki ww. dzielnic. Pracownicy PAL-W wspierali mieszkańców w realizacji 2 projektów w ramach inicjatyw lokalnych. Zorganizowano wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych.



Rysunek 50 Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.



**Program Aktywności Lokalnej
Wełnowiec - Józefowiec - Dąb**



Rysunek 49 Dzień otwarty - październik 2015 r.

DANE FINANSOWE

	Wydatki poniesione przed 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2016	Planowana całkowita wartość projektu stan na XII 2017
OGÓŁEM	71 171,15	319 107,89	321 806,04
Fundusze strukturalne	71 171,15	319 107,89	321 806,04
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki krajowe	0,00	0,00	0,00

	Plan na 01.01	Plan na 31.12	Wykonanie
2016	125 083,00	124 646,00	123 454,74
Fundusze strukturalne	125 083,00	124 646,00	123 454,74
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki krajowe	0,00	0,00	0,00
2017	151 814,00	151 814,00	149 936,72
Fundusze strukturalne	151 814,00	151 814,00	149 936,72
Dotacje stanowiące wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki krajowe	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE ŁĄCZNIE	344 562,61

DODATKOWE INFORMACJE

<https://www.mops.katowice.pl/node/1499>

5. Podsumowanie

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie **100 projektów**. W liczbie tej zawierają się projekty miejskie, w zakres których wchodzi zadania przeznaczone do realizacji w kilku podobszarach jednocześnie tj.:

1. Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (komponent twardy) - realizowany w dwóch lokalizacjach: ul. Uniwersytecka 15 (podobszar Śródmieście), ul. Marcinkowskiego 13 (podobszar Zawodzie) – poz. 4,
2. Modernizacja budynków komunalnych - realizowany w podobszarach: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice i Szopienice – Burowiec (poz. 14),
3. Budownictwo mieszkaniowe-komunalne (ul. Kordeckiego 3, 4, ul. Obr. Westerplatte 42-50) - realizowany w podobszarach: Śródmieście i Szopienice – Burowiec (poz. 16),
4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Ludwika Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b - realizowany w podobszarach: Załęże (ul. Wolnego 8) i Szopienice – Burowiec (ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b) – poz. 46,

(oznaczone w Zał. 1 do LPR: uchwała nr XLV/856/17 z dnia 27.07.2017 - jako jedna pozycja) oraz projekty realizowane w ramach obszaru zdegradowanego, na terenie jednostek pomocniczych, dla których w LPR wyznaczono jedynie podobszary występowania problemów przestrzennych (Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie, w ramach projektu pn. Włącz się! Program aktywizacji zawodowej). W sprawozdaniu przedstawiono projekty w podziale na poszczególne podobszary, a w konsekwencji zadania wielo-lokalizacyjne figurują równocześnie w kilku z nich. Stąd, zliczając projekty w podobszarach, ich łączna suma w sprawozdaniu wyniosła 107 pozycji. Pozyskanie pełnej informacji sprawozdawczej jest utrudnione z uwagi na fakt nie odesłania kart monitoringowych przez podmioty zewnętrzne.

Pod względem finansowym wykonanie zadań miejskich z zakresu szerokopojętej rewitalizacji ujętych w LPR jako projekty podstawowe wyniosło łącznie: **w 2016 roku ponad 41,4 mln zł, a w 2017 roku 25,9 mln zł.**

Analizując liczbę wszystkich projektów (zakończone, planowane, realizowane) w relacji do liczby mieszkańców największą liczbą projektów charakteryzują się **Szopienice – Burowiec, kolejno Śródmieście, następnie Zawodzie**. Świadczy to zarówno o wysokiej aktywności miasta jak i podmiotów zewnętrznych w przekształcaniu obszarów zdegradowanych. Najmniejszą ogólną liczbą projektów na 1000 mieszkańców cechuje się obszar Janów – Nikiszowiec, który był przedmiotem interwencji miasta w latach ubiegłych, charakteryzuje się ponadprzeciętną aktywnością lidera lokalnego (Fundacja, którą tworzą osoby pracujące wcześniej w ramach prowadzonego przez MOPS Centrum Aktywności Lokalnej); jest przykładem dobrej praktyki w dziedzinie rewitalizacji. Analizując wyłącznie grupę projektów zakończonych oraz w trakcie realizacji w relacji do liczby mieszkańców największą wartością charakteryzują się **Szopienice – Burowiec, Załęże, Bogucice i Zawodzie**, co świadczy o tym, że w podobszarze Śródmieście jest relatywnie duża liczba projektów planowanych do realizacji w okresie sprawozdawczym. Poziom aktywności w wymienionych obszarach świadczy o dużych potrzebach rewitalizacyjnych tych obszarów oraz znaczącej dynamice pozytywnych zmian w nich zachodzących.

Dominującym typem działań w całym obszarze rewitalizacji są **działania o charakterze infrastrukturalno - środowiskowym**. Spośród podobszarów miejskich, najbardziej znacząca ich przewaga widoczna jest w Śródmieściu i Szopienicach – Burowcu. Stosunkowa równowaga w udziale przedsięwzięć o charakterze miękkim i twardym zachowana jest w: Zawodziu, Załężu, Bogucicach oraz

Janowie – Nikiszowcu (tu lekka przewaga projektów o charakterze społeczno – kulturowym). Warty podkreślenia jest fakt systemowego działania na rzecz integracji społecznej oraz podniesienia poziomu aktywności mieszkańców poprzez realizowane przez MOPS działania **w każdym z miejskich podobszarów** (w okresie sprawozdawczym w Śródmieściu – planowane) w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej. Działania o charakterze gospodarczo – technologicznym zaplanowano jedynie w podobszarach występowania problemów przestrzennych: Dąb – Baildona i Wełnowiec – Konduktorska. Wymiar gospodarczo-technologiczny zdecydowanie wymaga dalszego zaangażowania miasta i aktywności podmiotów zewnętrznych.

Na zmianę w kolejno charakteryzowanych podobszarach rewitalizacji duży wpływ posiadają projekty „oddolne”, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

Tabela 12 Podsumowanie

Podobszar	Liczba projektów			Stan realizacji projektów			
	Suma	miejskich	pozamiejskich	Zakończone	W trakcie realizacji	Planowane	Inne
Śródmieście	37	20	17	5	15	11	6 – brak danych,
Zawodzie	7	6	1	3	2	1	1 - faza przygotow. do realizacji
Załęże	10	7	3	2	8	0	0
Bogucice	6	4	2	1	4	1	0
Szopienice - Burowiec	24	15	9	5	11	8	0
Janów - Nikiszowiec	7	3	4	1	2	0	4 - brak danych
Zawodzie - Porcelanowa	1	0	1	0	0	1	0
Dąb –Baildona	3	1	2	1	1	1	0
Kolonia Alfred	2	0	2	0	1	1	0
Wełnowiec - Konduktorska	7	1	6	0	5	1	1 – brak danych
Szopienice - Woźniaka	0	0	0	0	0	0	0
Horyzontalne	3	2	1	0	1	1	1 - brak danych
SUMA	107	59	48	18	49	27	13

Spis tabel:

Tabela 1. Projekty podstawowe w podobszarze Śródmieście - wykonany zakres rzeczowy	5
Tabela 2. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - wykonany zakres rzeczowy	17
Tabela 3. Projekty podstawowe w podobszarze Załęże - wykonany zakres rzeczowy	22
Tabela 4. Projekty podstawowe w podobszarze Bogucice - wykonany zakres rzeczowy	27
Tabela 5. Projekty podstawowe w podobszarze Szopienice - Burowiec - wykonany zakres rzeczowy	32
Tabela 6. Projekty podstawowe w podobszarze Janów - Nikiszowiec - wykonany zakres rzeczowy.....	39
Tabela 7. Projekty podstawowe w podobszarze Zawodzie - Porcelanowa - wykonany zakres rzeczowy	43
Tabela 8. Projekty podstawowe w podobszarze Dąb - Baildona - wykonany zakres rzeczowy	44
Tabela 9. Projekty podstawowe w podobszarze Kolonia Alfred - wykonany zakres rzeczowy.....	46
Tabela 10. Projekty podstawowe w podobszarze Wełnowiec – Konduktorska - wykonany zakres rzeczowy	47
Tabela 11. Projekty podstawowe horyzontalne - wykonany zakres rzeczowy	51
Tabela 12 Podsumowanie	117

Spis rysunków:

Rysunek 1. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście.....	5
Rysunek 2. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie	17
Rysunek 3. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże	22
Rysunek 4. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice	27
Rysunek 5. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Szopienice-Burowiec.....	32
Rysunek 6. Projekty podstawowe realizowane w miejskim podobszarze rewitalizacji Janów - Nikiszowiec	39
Rysunek 7. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa	42
Rysunek 8. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Dąb- Baildona	43
Rysunek 9. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred.....	45
Rysunek 10. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska	47
Rysunek 11. Projekty podstawowe realizowane w podobszarze występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka	50
Rysunek 12 Wizualizacja – węzeł Sądowa.....	69
Rysunek 13. Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – po zrealizowaniu projektu źródło: KZGM.....	71
Rysunek 14. Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – po zrealizowaniu projektu źródło: KZGM	71
Rysunek 15. Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego – stan przed.	71
Rysunek 16 Modernizacja budynków komunalnych - Morawa 119a (źródło: KZGM)	78
Rysunek 17 Obszar pomiędzy ul. Koszarową i Adamskiego	79
Rysunek 18 Plac zabaw ze strefą fitness – Koszarowa, Adamskiego	79
Rysunek 19. ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46	81
Rysunek 20. ul. Kordeckiego 3b, 4b - nowe budynki (źródło: KZGM)	81
Rysunek 21. ul. Kordeckiego 3,4 - stare budynki (źródło: KZGM)	81
Rysunek 22. ul. Kordeckiego 3b, 4b – nowe budynki (źródło: KZGM).....	81
Rysunek 23. ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46 (źródło: KZGM)	81
Rysunek 24 Budowa hali sportowej - przewidywana lokalizacja	82
Rysunek 25 Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek - Wizualizacja 2.....	83
Rysunek 26 Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto	83
Rysunek 27 Spotkanie świąteczne 2017	87
Rysunek 28 Śniadanie na trawie 2016	87

Rysunek 29 Węzeł Zawodzie – wizualizacja 2	88
Rysunek 30 Węzeł Zawodzie – wizualizacja 1	88
Rysunek 31 ul. 1 Maja	89
Rysunek 32 ul. Wolnego 8.....	92
Rysunek 33 ul. Zamenhofska 36a-38a	92
Rysunek 34 Lokalizacja Placu Londzina	94
Rysunek 35. Wizualizacja - Krąg taneczny.....	96
Rysunek 36. Wizualizacja - Plac pod sceną mobilną	96
Rysunek 37 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte - 2	101
Rysunek 38 Układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania z ul. Lwowską, Bednorza, Obrońców Westerplatte - 1	101
Rysunek 40. Kompleks Stawów Szopienice-Burowiec- widok z góry	102
Rysunek 39. Kompleks stawów Szopienice-Burowiec.....	102
Rysunek 41 Wizualizacja 2	103
Rysunek 42 Wizualizacja 1	103
Rysunek 43 Budynek przy ul. Ciesielskiej 1 - wejście	105
Rysunek 44 Budynek przy ul. Ciesielskiej 1 – od strony placu zabaw	105
Rysunek 45 Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 10.....	106
Rysunek 46 Skwer Janusza Sidły - 2.....	107
Rysunek 47 Skwer Janusza Sidły – 1.....	107
Rysunek 48 Budynek przy ul. Bednorza 14	108
Rysunek 49 Dzień otwarty - październik 2015 r.	115
Rysunek 50 Grill sąsiedzki - lipiec 2017 r.....	115
